



LXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y REVISIÓN FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA, REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

INFORMACIÓN DE OBRA PÚBLICA  
AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES PARAMUNICIPALES  
OPERADORAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA

Con fundamento en los Artículos 61 Fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; Artículos 37, párrafo primero y cuarto, y 39, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Artículos 73 Bis y 73 Ter, de la Ley Orgánica del Municipio Libre; Artículos 14, 15, 17 y 18, de la Ley de Obras Públicas del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demás disposiciones legales aplicables, se otorga este documento con reserva de ley, no implica la validación de la información.

ESTADO DE OBRA PÚBLICA MENSUAL  
CORRESPONDIENTE A:

28 JUL 2016

Municipio:  
2016  
Mes de Emisión:

CERRO AZUL  
MAYO 16

Acta N° 44

Fecha en que se presentó el Cabildo para su remisión a

Congreso: 23/JUN/16

Acta de sesión de Cabildo aprobando su remisión:



Voto de Calidad NO Certificada NO

	SI	RECURSOS FISCALES		RECURSOS FEDERALES						
		Entrega	Obras	FISM		FORTAMUN		Otras Fuentes de Financiamiento*		
Oficio de Remisión	SI									
Anexo Relación y Total de Obras	NO									
Informe de Obra de Administración Directa		NO	0	NO	0	NO	0	NO	0	
Informe de Obra por Contrato		NO	0	SI	13	SI	3	NO	0	
Reporte Fotográfico		NO	0	SI	5	SI	0	NO	0	

Para la identificación de las obras consultar el Clasificador por Fuente de Financiamiento emitido por el CONAC

	NO	RECURSOS FISCALES		RECURSOS FEDERALES		
				FISM	FORTAMUN	Otras Fuentes de Financiamiento (Describir cuales)
Propuesta General de Inversión		NO		NO	NO	NO
Modificaciones Presupuestales		NO		NO	NO	NO
Reporte Trimestral de avances físico-financieros		NO		NO	NO	NO
Correspondiente al:		NO		NO	NO	NO
Cierre de Obras y Acciones del Ejercicio		NO		NO	NO	NO

Observaciones:

Revisa: LIC. ERIKA MENDOZA PLACIER, Analista Administrativo

Recibe: RARDO ANTONIO MONTE SANCHEZ, AUX. ADMINISTRATIVO

L.E. Jorge Perichet Villegas, Jefe del Departamento de Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios



# Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2016/CERRO AZUL/10807

C. Ludyvina Ramírez Ahumada  
CERRO AZUL  
P R E S E N T E.

## ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	26/06/2016
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/06/2016
Reporte:	Reporte Mensual de Estados de Obra
Periodo:	MAYO
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Gustavo Castillo García
Observaciones:	ENTREGA EXTEMPORÁNEA

### Cadena original:

d7BajsXpMK5+b9XoQx8I78p1lyYZGC5+N5SGZsPScMjg0DoQyLeBa+46TJDndZV9/  
pSaZKEGfKJnDPPr7LAPYum/59G8jm/  
4mgpu+zUL+Wb5RznClg6pawTqt6BAe0KWbtWACEQpDv0jCWsbrhrCZpe0ois32t320vuLcU9T90I=

*"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exige de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."*



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA  
SECCION: SECRETARIA  
OFICIO N°. 196/2016  
EXPEDIENTE:  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

C.P.C. LORENZO ANTONIO PORTILLA VAZQUEZ  
AUDITOR GENERAL DEL ORFIS.  
XALAPA, VER.

PRESENTE:

EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CERRO AZUL, VERACRUZ, QUE ME HONRO EN PRESIDIR, ASISTIDO DE SECRETARIO, QUE ACTUA EN LEGAL FORMA, POR ÉSTE MEDIO TIENE A BIEN DIRIGIRSE A USTED, CON EL PROPOSITO DE HACERLE LLEGAR AL ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ QUE DIGNAMENTE PRESIDE, EL ACTA DE CABILDO No. 45 DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2016, CORRESPONDIENTE AL SIGUIENTE ACUERDO:

- ACUERDO Y APROBACIÓN DE LOS FORMATOS 09 Y 11 DEL REPORTE MENSUAL DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE MAYO DEL 2016 (FAFM)

SIN OTRO PARTICULAR, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.

ATENTAMENTE  
CERRO AZUL, VER, 23 DE MAYO DEL 2016

LIC. LUDYVINA RAMIREZ AHUMADA  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA  
2014-2017

LIC. GONZALO JAVIER BLANCO MIRELES  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO







H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CERRO AZUL, VER  
2014 - 2017



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA  
SECCION: SECRETARIA  
OFICIO N°. 197/2016  
EXPEDIENTE:  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

DIP. OCTAVIA ORTEGA ARTEAGA  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA LXIII LEGISLATURA DEL EDO. VERACRUZ  
XALAPA, VER.

P R E S E N T E:

EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CERRO AZUL, VERACRUZ, QUE ME HONRO EN PRESIDIR, ASISTIDO DE SECRETARIO, QUE ACTUA EN LEGAL FORMA, POR ÉSTE MEDIO TIENE A BIEN DIRIGIRSE A USTED, CON EL PROPOSITO DE HACERLE LLEGAR A ESA LEGISLATURA DEL ESTADO QUE DIGNAMENTE PRESIDE, EL ACTA DE CABILDO No. 45 DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2016, CORRESPONDIENTE AL SIGUIENTE ACUERDO:

- ACUERDO Y APROBACIÓN DE LOS FORMATOS 09 Y 11 DEL REPORTE MENSUAL DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE MAYO DEL 2016 (FAFM)

SIN OTRO PARTICULAR, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.

ATENTAMENTE

CERRO AZUL, VER., 23 DE JUNIO DEL 2016

LIC. LUDYVINA RAMIREZ AHUMADA  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA  
2014-2017

LIC. GONZALO JAVIER BLANCO MIRELES  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO





**ACTA NÚMERO 45**

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CERRO AZUL, VER.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, 28, 29, 30, 32 y 36 FRACCIÓN I, III, XIV, XV, XVIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE, VIGENTE EN EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, QUE NOS RIGE SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO BAJO EL SIGUIENTE TEXTO

EN LA CIUDAD DE CERRO AZUL, VERACRUZ; SIENDO LAS 15:00 PM HORAS DEL DÍA 23 DE JUNIO DEL 2016, PREVIAMENTE CITADOS LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO QUE SE MENCIONAN MÁS ADELANTE, SE REÚNEN PARA LLEVAR A CABO **SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO**, LA CUAL ES PRESIDIDA POR LA CIUDADANA LIC. LUDYVINA RAMÍREZ AHUMADA, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; POR LO QUE EN USO DE LA PALABRA DECLARA: **SE ABRE LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO BAJO EL SIGUIENTE:**

**ORDEN DEL DÍA:**

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA
- 2.- DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DE QUÓRUM.
- 3.- ACUERDO Y APROBACIÓN DE LOS FORMATOS 09 Y 11 DEL REPORTE MENSUAL DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE MAYO DEL 2016 (FAFM)
- 4.- ASUNTOS GENERALES
- 5.- CLAUSURA

UNA VEZ ESCUCHADO EL ORDEN DEL DÍA SE SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DEL CABILDO Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTACIÓN. A CONTINUACIÓN SE PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE ASISTENCIA, ESTANDO "PRESENTE" LOS CIUDADANOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

- C. LIC. LUDYVINA RAMÍREZ AHUMADA, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.
- C. HÉCTOR BAUTISTA VILLEGAS. SÍNDICO ÚNICO.
- C. PROFR. JESÚS AGUILERA HERNÁNDEZ, REGIDOR PRIMERO.
- C. GUILLERMO GUADALUPE SEGURA DEL ANGEL. REGIDOR SEGUNDO.
- C. LIC. RICARDO ROBLES RÍOS. REGIDOR TERCERO
- C. TOMÁS MELO SANTIAGO, REGIDOR CUARTO.
- C. PROFR. ROGELIO HERNANDEZ ANDRADE. REGIDOR QUINTO



UNA VEZ PUESTA A CONSIDERACIÓN LA PROPUESTA DE LA ORDEN DEL DÍA Y APROBADA POR UNANIMIDAD SE PROCEDIÓ EL DESAHOGO DE LA MISMA, Y AGOTADOS LOS PUNTOS 1 Y 2, SE PASA AL PUNTO No. 3.

**3.- ACUERDO Y APROBACIÓN DE LOS FORMATOS 09 Y 11 DEL REPORTE MENSUAL DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE MAYO DEL 2016 (FAFM).**

EN USO DE LA VOZ EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. MANUEL ARTURO MARES ORDOÑEZ, INFORMA LO SIGUIENTE: QUE EN ESTE MES SE REPORTA LA OBRA DE LOS FORMATOS 09 Y 011 DEL MES DE MAYO DE LAS OBRAS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL MUNICIPIO, LA CUAL SE MENCIONA A CONTINUACION.

RELACION DE AVANCE DE OBRA DEL MES DE MAYO DEL FAFM 2016		
2016300341019	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARIA DIVINA EN LA COL. FAJA DE ORO, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	TRABAJOS EN PROCESO
2016300341021	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AMADO NERVO DE LA COL. LAZARO CARDENAS, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
2016300341022	REHABILITACION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	TRABAJOS EN PROCESO

LOS C. EDILES PLANTEAN A LA C. ING. MANUEL ARTURO MARES ORDOÑEZ DIVERSAS PREGUNTAS Y COMENTARIOS, OBTENIENDO RESPUESTA SATISFACTORIA.

PUESTA A CONSIDERACIÓN DEL CABILDO Y APROBADA SE ACUERDA: ÚNICO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL REPORTE PRESENTADO POR EL ING. MANUEL ARTURO MARES ORDOÑEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RELATIVO A LOS FORMATOS 09 Y 11 DEL REPORTE MENSUAL DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 (FAFM), DONDE REPORTA LAS OBRAS YA MENCIONADAS QUE SE ESTAN REALIZANDO DEL 2016; ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN PARA REMITIR AL ORFIS Y AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ.- APROBADO POR UNANIMIDAD.-CÚMPLASE.-

EN USO DE LA VOZ EL C. GONZALO JAVIER BLANCO MIRELES SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, MANIFIESTA QUE NO EXISTIENDO ASUNTO A TRATAR Y AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA. SIENDO PROCEDENTE PASAR AL PUNTO No. 4.-RELATIVO A LA CLAUSURA.- ENSEGUIDA LA C. LIC. LUDYVINA RAMÍREZ AHUMADA, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, EN USO DE LA VOZ DECLARA: NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS DIECISÉIS HORAS, DEL DÍA DE SU FECHA.-LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA QUE FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS CIUDADANOS FUNCIONARIOS QUE EN ELLA INTERVINIERON ANTE EL C. SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FÉ.-





LIC. LUDVINA RÍMÍREZ AHUMADA  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. HÉCTOR BAUTISTA VILLEGAS  
SINDICO UNICO

REGIDURIA 1ª  
2014-2017  
PROFR. JESÚS AGUILERA HERNÁNDEZ  
REGIDOR PRIMERO



C. GUILLERMO GUADALUPE SEGURA DEL ANGEL  
REGIDOR SEGUNDO  
REGIDURIA 2ª  
2014-2017

LIC. RICARDO NOBLES RÍOS  
REGIDOR TERCERO  
REGIDURIA 3ª  
2014-2017

C. TOMÁS MELO SANTIAGO  
REGIDOR CUARTO  
REGIDURIA 4ª  
2014-2017

PROFR. ROGELIO HERNÁNDEZ ANDRADE  
REGIDOR QUINTO  
REGIDURIA 5ª  
2014-2017

LIC. GONZALO JAVIER BLANCO MIRELES  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA  
2014-2017



# Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2016/CERRO AZUL/10808

C. Ludyvina Ramírez Ahumada  
CERRO AZUL  
P R E S E N T E.



## ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	26/06/2016
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/06/2016
Reporte:	Reporte Mensual de Estados de Obra
Periodo:	MAYO
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Gustavo Castillo García
Observaciones:	ENTREGA EXTEMPORÁNEA

### Cadena original:

qUtlbxTe22uQN6a8Uwx/Lwg6cptXXI8/C5hjKVbM6PGLaMWYN9MymTYDVV5rRj15Pc7YOI6GNMA2/  
xdM+kAuSGgqL34a6XEELvDZdzkGR1rPkjbnvFMt+BqnsSfl1SBss0p5gJ8pL4IQEOI8UJULtr9swcAfGiGnqJ  
0KAARXR/0=

*"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."*





H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CERRO AZUL, VER  
2014 - 2017



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA  
SECCION: SECRETARIA  
OFICIO N°. 194/2016  
EXPEDIENTE:  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

DIP. OCTAVIA ORTEGA ARTEAGA  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA LXIII LEGISLATURA DEL EDO. VERACRUZ  
XALAPA, VER.

PRESENTE:

EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CERRO AZUL, VERACRUZ, QUE ME HONRO EN PRESIDIR, ASISTIDO DE SECRETARIO, QUE ACTUA EN LEGAL FORMA, POR ESTE MEDIO TIENE A BIEN DIRIGIRSE A USTED, CON EL PROPOSITO DE HACERLE LLEGAR A LA LEGISLATURA DEL ESTADO QUE DIGNAMENTE PRESIDE, EL ACTA DE CABILDO No. 44 DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2016, CORRESPONDIENTE AL SIGUIENTE ACUERDO:



- ACUERDO Y APROBACIÓN DE LOS FORMATOS 09 Y 11 DEL REPORTE MENSUAL DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE MAYO DEL 2016 (FISM)

SIN OTRO PARTICULAR, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.

ATENTAMENTE

CERRO AZUL, VER., 23 DE JUNIO DEL 2016

LIC. LUDYVINA RAMIREZ AHUMADA  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA  
2014-2017

LIC. GONZALO JAVIER BLANCO MIRELES  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO





DEPENDENCIA: PRESIDENCIA  
SECCION: SECRETARIA  
OFICIO N°. 194/2016  
EXPEDIENTE:  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

DIP. OCTAVIA ORTEGA ARTEAGA  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA LXIII LEGISLATURA DEL EDO. VERACRUZ  
XALAPA, VER.

PRESENTE:

EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CERRO AZUL, VERACRUZ, QUE ME HONRO EN PRESIDIR, ASISTIDO DE SECRETARIO, QUE ACTUA EN LEGAL FORMA, POR ÉSTE MEDIO TIENE A BIEN DIRIGIRSE A USTED, CON EL PROPOSITO DE HACERLE LLEGAR A ESA LEGISLATURA DEL ESTADO QUE DIGNAMENTE PRESIDE, EL ACTA DE CABILDO No. 44 DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2016, CORRESPONDIENTE AL SIGUIENTE ACUERDO:

- ACUERDO Y APROBACIÓN DE LOS FORMATOS 09 Y 11 DEL REPORTE MENSUAL DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE MAYO DEL 2016 (FISM)

SIN OTRO PARTICULAR, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.

ATENTAMENTE  
CERRO AZUL, VER., 23 DE JUNIO DEL 2016

LIC. LUDYVINA RAMIREZ AHUMADA  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA  
2014-2017

LIC. GONZALO JAVIER BLANCO MIRELES  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARIA  
2014-2017




**ACTA NÚMERO 44**


DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CERRO AZUL, VER.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, 28, 29, 30, 32 y 36 FRACCIÓN I, III, XIV, XV, XVIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE, VIGENTE EN EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, QUE NOS RIGE SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO BAJO EL SIGUIENTE TEXTO





EN LA CIUDAD DE CERRO AZUL, VERACRUZ; SIENDO LAS TRECE HORAS DEL DÍA 23 DE JUNIO DEL 2016, PREVIAMENTE CITADOS LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO QUE SE MENCIONAN MÁS ADELANTE, SE REÚNEN PARA LLEVAR A CABO **SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO**, LA CUAL ES PRESIDIDA POR LA CIUDADANA LIC. LUDYVINA RAMÍREZ AHUMADA, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; POR LO QUE EN USO DE LA PALABRA DECLARA: **SE ABRE LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO BAJO EL SIGUIENTE:**

**ORDEN DEL DÍA:**

- 
- 1.- LISTA DE ASISTENCIA
  - 2.- DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DE QUÓRUM.
  - 3.- ACUERDO Y APROBACIÓN DE LOS FORMATOS 09 Y 11 DEL REPORTE MENSUAL DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE MAYO DEL 2016 (FISM)
  - 4.- ASUNTOS GENERALES
  - 5.- CLAUSURA



UNA VEZ ESCUCHADO EL ORDEN DEL DÍA SE SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DEL CABILDO Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTACIÓN. A CONTINUACIÓN SE PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE ASISTENCIA, ESTANDO "PRESENTE" LOS CIUDADANOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

- C. LIC. LUDYVINA RAMÍREZ AHUMADA, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.
  - C. HÉCTOR BAUTISTA VILLEGAS. SÍNDICO ÚNICO.
  - C. PROFR. JESÚS AGUILERA HERNÁNDEZ, REGIDOR PRIMERO.
  - C. GUILLERMO GUADALUPE SEGURA DEL ANGEL. REGIDOR SEGUNDO.
  - C. LIC. RICARDO ROBLES RÍOS. REGIDOR TERCERO
  - C. TOMÁS MELO SANTIAGO, REGIDOR CUARTO.
  - C. PROFR. ROGELIO HERNANDEZ ANDRADE. REGIDOR QUINTO.
- 
- 
- 
- 





UNA VEZ PUESTA A CONSIDERACIÓN LA PROPUESTA DE LA ORDEN DEL DÍA Y APROBADA POR UNANIMIDAD SE PROCEDIÓ EL DESAHOGO DE LA MISMA, Y AGOTADOS LOS PUNTOS 1 Y 2, SE PASA AL PUNTO No. 3.

**3.- ACUERDO Y APROBACIÓN DE LOS FORMATOS 09 Y 11 DEL REPORTE MENSUAL DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE MAYO DEL 2016 (FISM).**

EN USO DE LA VOZ EL C. ING. MANUEL ARTURO MARES ORDOÑEZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL, INFORMA LO SIGUIENTE: QUE EN ESTE MES SE REPORTA LA OBRA DE LOS FORMATOS 09 Y 011 DEL FISM, QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

RELACIÓN DE AVANCE DE OBRA DEL MES DE MAYO DEL FISM 2016		
2016300341001	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS COLONIAS: LA CURVA, LA CEIBA, 17 DE MAYO Y LOMAS VERDES EN EL MUNICIPIO ED CERRO AZUL, VER	TRABAJO EN PROCESO
2016300341002	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS: MIRADOR, VICENTE GUERRERO, LA CURVA, Y MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	TRABAJO EN PROCESO
2016300341004	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LAS COLONIAS: LA CEIBA, LOMAS VERDES, TERESA MORALES Y EX BRECHA EL AGUILA EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	TRABAJO EN PROCESO
2016300341006	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LAS COLONIAS: 7 DE OCTUBRE, VICENTE GUERRERO, CERRO AZUL VIEJO, CARDENAS, BENITO JUAREZ Y LA CEIBA, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER	TRABAJO EN PROCESO
2016300341007	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS COLONIAS: VICENTE GUERRERO, AGUILERA, FAJA DE ORO, CARDENAS Y TERESA MORALES, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	TRABAJO EN PROCESO
2016300341009	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS DE LA COLONIA AGUILERA, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	TRABAJO EN PROCESO
2016300341010	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA HENRY FORD, DE LA COLONIA LA CEIBA, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	TRABAJO EN PROCESO
2016300341011	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA, DE LA COLONIA MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	TRABAJO EN PROCESO
2016300341013	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE JUAN FELIPE, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	TRABAJO EN PROCESO
2016300341014	SUPERVISION DE OBRA	TRABAJO EN PROCESO
2016300341015	REHABILITADO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA	TRABAJO EN PROCESO



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



	LAZARO CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER	
2016300341017	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE HERIBERTO BERRONES DE LA COLONIA VALLE VERDE, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	TRABAJOS EN PROCESO
2016300341018	AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ	TRABAJOS EN PROCESO

LOS C. EDILES PLANTEAN AL C. DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DIVERSAS PREGUNTAS Y COMENTARIOS, OBTENIENDO RESPUESTA SATISFACTORIA.

PUESTA A CONSIDERACIÓN DEL CABILDO Y APROBADA SE ACUERDA: ÚNICO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL REPORTE PRESENTADO POR EL C. TITULAR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL, RELATIVO A LOS FORMATOS 09 Y 11 DEL REPORTE MENSUAL DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 (FISM), DONDE SE REPORTA LA OBRA YA MENCIONADA QUE SE ESTA REALIZANDO EN ESTE MUNICIPIO; ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN PARA REMITIR AL ORFIS Y AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ.- APROBADO POR UNANIMIDAD.- CÚMPLASE.-

UNA VEZ DESAHOGADO EL PUNTO ANTERIOR SE PROCEDE A PASAR AL RUBRO DE ASUNTOS GENERALES, CONTEMPLADO EN EL PUNTO No. 4 DEL ORDEN DEL DIA. EN USO DE LA VOZ EL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC. GONZALO JAVIER BLANCO MIRELES, MANIFIESTA QUE NO EXISTIENDO ASUNTO A TRATAR EN EL PUNTO No. 4 DE ASUNTOS GENERALES Y AGOTADO EL ORDEN DEL DIA SIENDO PROCEDENTE PASAR AL PUNTO No. 5.- RELATIVO A LA CLAUSURA.- ENSEGUIDA LA C. LIC. LUDYVINA RAMÍREZ AHUMADA, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, EN USO DE LA VOZ DECLARA: NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS CATORCE HORAS, DEL DÍA DE SU FECHA.-LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA QUE FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS CIUDADANOS FUNCIONARIOS QUE EN ELLA INTERVINIERON ANTE EL C. SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FÉ.-

LIC. LUDYVINA RAMÍREZ AHUMADA  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

7



*[Signature]*  
REGIDURIA  
2014-2017  
C. HÉCTOR BAUTISTA VILLEGAS  
SINDICO UNICO



*[Signature]*  
REGIDURIA  
2014-2017  
PROFR. JESÚS AGUILERA FERNANDEZ  
REGIDOR PRIMERO



*[Signature]*  
C. GUILLERMO GUADALUPE SEGURA DEL ANGEL  
REGIDOR SEGUNDO

REGIDURIA 2ª  
2014-2017



*[Signature]*  
LIC. RICARDO ROBLES RIOS  
REGIDOR TERCERO

REGIDURIA 3ª  
2014-2017



*[Signature]*  
C. TOMÁS MELO SANTIAGO  
REGIDOR CUARTO

REGIDURIA 4ª  
2014-2017



*[Signature]*  
PROFR. ROGELIO HERNÁNDEZ ANDRADE  
REGIDOR QUINTO

REGIDURIA 5ª  
2014-2017



*[Signature]*  
LIC. GONZALO JAVIER BLANCO MIRELES  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

SECRETARIA  
2014-2017



# H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.



REPORTE MENSUAL DEL  
FORMATO 09 Y 011

MAYO 2016



H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN: 23/06/2016
MES QUE SE REPORTA MAYO

DATOS GENERALES													
MUNICIPIO: CERRO AZUL		LOCALIDAD: CERRO AZUL		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LAS COLONIAS: LA CURVA, LA CEIBA, 17 DE MAYO Y LOMAS VERDES, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEB		No. DE OBRA: 2016300341001											
ANTECEDENTES:			CROQUES DE PROYECTO:										
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>													
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:													
GRADO DE REZAGO SOCIAL:													
MUY ALTO	ALTO	MEDIO								BAJO	MUY BAJO	0103	
TIPO DE ZONA: RURAL		URBANA								CLAVE AGEB:			
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI								X	NO		
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL PAIS:		SI								X	NO		
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:													
DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA											
PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE									SI	NO	X	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA													
LATITUD	0.00000000									LONGITUD		0.00000000	
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO													
PARTIDA	MONTO									%			
LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA CERA	4,277.00									0			
PISO DE 3 CM. DE ESPESOR, DE CONO	211,442.00			1									
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PL	5,092.00			0									
TOTAL			220,811.00										
MONTO AUTORIZADO:		256,141.15		C/TVA									
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		256,141.15		C/TVA									
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X									
DEPENDENCIA QUE VALIDA:			FECHA:										
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X									
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:			FECHA:										
META PROGRAMADA:	30.00	UNIDAD:	pro	REAL:	30.00								
AVANCE FISICO:	PROGRAMADO:	10.00	REAL:	10.00									
TIPO DE LICITACIÓN:		ADRIDICACIÓN DIRECTA		EXISTE									
		INVITACION A MENOS 3 PERSONAS		X	29/03/2016								
		LICITACIÓN PÚBLICA											
NO. DE CONTRATO:		2016300341001											
MONTO CONTRATADO:		220,811.34		C/TVA									
PERIODO DE EJECUCIÓN:		PROGRAMADA		REAL									
		INICIO	02/05/2016		02/05/2016								
		TERMINO	31/10/2016										
		DÍAS	180.00	8.00									
CONTRATISTA:		BALDOMERO HERNANDEZ EDGARDO											
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:		PRECIOS UNITARIOS		X									
		PRECIO ALZADO											
		MEXTO											
		LLAVE EN MANO											
ANTICIPO:		APLICA		NO APLICA									
		MONTO:		PORCENTAJE									
		FECHA DE PAGO:		ANTICIPC									
TIPO DE FIANZA:		CUMPLIMIENTO		VICIOS OCULTOS									
MONTO AFIANZADO:		22,081.13		0.00									
AFIANZADORA:		INSURGENTES											
No. DE FIANZA:		6215-65379-2											
FECHA:		02/05/2016											
CONVENIO MODIFICATORIO:		EXISTE		IMPORTE/PERIODO									
		MONTO		FECHA									
		PLAZO											
		NO APLICA											
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		256,141.15		C/TVA									
GUSTAVO CASTILLO GARCIA SUPERVISOR		MAYOR L. MARES ORDOÑEZ DIRECTOR DE OBRAS											

FORMATO 11





H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

**DATOS GENERALES**

<b>Municipio:</b> CERRO AZUL	<b>Localidad:</b> CERRO AZUL	<b>Ejercicio fiscal:</b> EJERCICIO 2016
<b>No. de obra:</b> 2016300341001	<b>Periodo:</b> MAYO	<b>Número de estimación:</b>
<b>Descripción:</b> CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LAS COLONIAS: LA CURVA, LA CEIBA, 17 DE MAYO Y LOMAS VERDES, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
		<b>Fecha de revisión:</b> 25/06/2016

**Fuente de Financiamiento:**

**Fecha de revisión:** 25/06/2016



**FOTO (12)**

Concepto de obra ejecutado:

CONSTRUCCION DE PISO FIRME

(11)

**FOTO (13)**

Concepto de obra ejecutado:

**Observaciones:**

TRABAJOS EN PROCESO

GUSTAVO CASTILLO GARCIA  
 CAMO 33  
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis


H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:
23/06/2016
MES QUE SE REPORTA
MAYO

DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DE	No. DE OBRA:	2016300341002
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:		REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS-MIRADOR, VICENTE GUERRERO, LA CURVA Y MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	

ANTECEDENTES:				
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	NO		
		X		
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:				
GRADO DE REZAGO SOCIAL:				
MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO
TIPO DE ZONA:		CLAVE AGE:		
RURAL		URBANA		
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI	X	NO
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL FAIS:		SI	X	NO
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:				
DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA		
X				
PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	SI	NO	X
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA				
LATITUD	0.00000000	LONGITUD	0.00000000	
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO				
PARTIDA	MONTO	%		
LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MANO	19,661.00	0		
BASE HIDRAULICA 70-30% (GRAVA C	273,148.00	0		
REGISTRO DE 0.40X0.50X1.00 N MED	50,872.00	0		
RELLENO COMPACTADO CON PIZON DI	11,291.00	0		
SUMINISTRO Y ACOSTILLADO DECON	15,008.00	0		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO	29,593.00	0		
AFINE DE TALLIDES Y FONDO A MANO	13,479.00	0		
ACARREO EN CAMION KILOMETRO SU	2,580.00	0		
ACARREO EN CAMION 1ER. KILOMETR	1,082.00	0		
CARGA CON MAQUINARIA (CARGADOR	1,336.00	0		
EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL	3,182.00	0		
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PI	809.75	0		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCA	12,288.00	0		
PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN	623.02	0		
DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO	97.50	0		
POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQU	63,537.00	0		
RELLENO COMPACTADO CON PIZON D	44,722.00	0		
SUMINISTRO Y ACOSTILLADO CON AI	44,573.00	0		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CCD	10,458.00	0		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLO	10,501.00	0		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO	854,029.68	0		
AFINE DE TALLIDES Y FONDO A MANO	46,252.00	0		
ACARREO EN CAMION KILOMETRO SU	5,242.00	0		
ACARREO EN CAMION 1ER. KILOMETR	2,200.00	0		

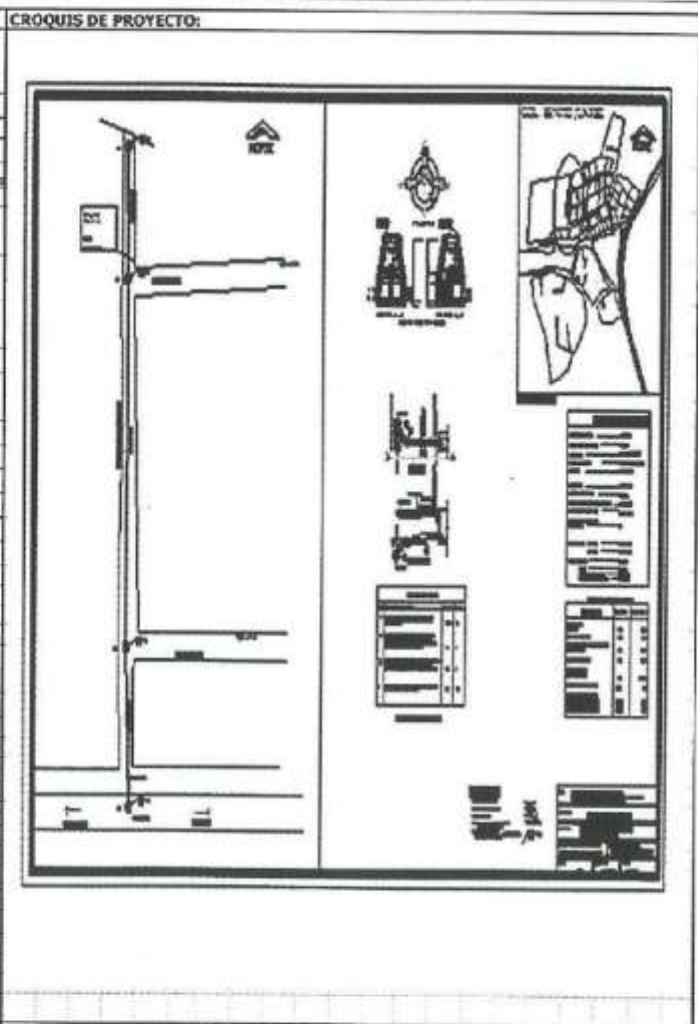

MONTO AUTORIZADO:	990,586.00	C/IVA			
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	990,586.00	C/IVA			
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				FECHA	
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				FECHA	
META PROGRAMADA:	280.00	UNIDAD:	ML	REAL:	280.00
AVANCE FISICO:	PROGRAMADO:	15.00	REAL:	15.00	
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA		EXISTE	FECHAS	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		X	18/04/2016	
	LICITACIÓN PÚBLICA				
NO. DE CONTRATO:	2016300341002				
MONTO CONTRATADO:	854,039.66	C/IVA			
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	PROGRAMADA	REAL		
		02/05/2016	02/05/2016		
	TERMINO	31/10/2016			
	DÍAS	180.00	0.00		
CONTRATISTA:	GRUPO CONSTRUCTOR BAYMAR, S.A. DE C.V.				
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIOS UNITARIOS	X			
	PRECIO ALZADO				
	MIXTO				
	LLAVE EN MANO				
ANTECIPO:	APLICA	X	NO APLICA		
	MCNTO:	297,205.80	PORCENTAJE	30.00	
TIPO DE FIANZA:	FECHA DE PAGO:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:	297,205.80	85,403.97			
AFIANZADORA:	ASERTA	ASERTA			
No. DE FIANZA:	3718-05340-5	3718-05342-7			
FECHA:	28/04/2016	28/04/2016			
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA		
	MONTO				
	PLAZO				
	NO APLICA				
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	990,636.00	C/IVA			

GUSTAVO CASTILLO GARCIA  
SUPERVISOR

MARCELA MARES ORDOÑEZ  
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11





H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL Localidad: CERRO AZUL  
 No. de obra: 2016300341002 Periodo: MAYO  
 Descripción: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS: MIRADOR, VICENTE GUERRERO, LA CURVA Y MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2016  
 Número de estimación:  
 Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 Fecha de revisión: 25/06/2016



FOTO (12)  
 Concepto de obra ejecutado:  
 EXCAVACION

(11)

FOTO (13)  
 Concepto de obra ejecutado:  
 POZO DE VISITAS

Observaciones:  
 TRABAJOS EN PROCESO

  
 GUSTAVO CASTILLO GARCIA  
 RAMO 33  
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis


H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:	23/06/2016
MES QUE SE REPORTA	MAYO

DATOS GENERALES					
MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LAS COLONIAS: LA CEIBA, LOMAS VERDES, TERESA MORALES Y EX BRECHA EL AGUILA, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DE	No. DE OBRA:	2016300341004		

ANTECEDENTES:					
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	NO		
			X		
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:					
GRADO DE REZAGO SOCIAL:					
MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	0175
TIPO DE ZONA:		RURAL	CLAVE		
		URBANA	AGER:		
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI	X	NO	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL FAIS:		SI	X	NO	
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:					
DIRECTA	X	INDIRECTA		COMPLEMENTARIA	
PROYECTO ESPECIAL		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE		SI	NO
				X	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA					
LATITUD	0.80000000	LONGITUD	0.00000000		
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO					
PARTIDA	MONTO	%			
LIMPIEZA DE TERRENO A PLANO A	9,427.00	0			
TUBO DE 13 MM POLIDUCTO NARA	3,950.00	0			
VENTANA DE 1.10X1.35 INCLUYE S	85,904.00	0			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PL	47,097.00	0			
EMBOQUILLADO APLANADO UNA A	25,758.00	0			
APLANADO FINO EN MUROS A PLO	29,918.00	0			
CADERNA DE CERRAMIENTO DE SEC	106,730.00	0			
CASTILLO DE SECCION 15 X 20 CM	136,136.00	0			
MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40	249,239.00	0			
FIRME DE SCM DE ESPESOR DE CC	123,722.00	0			
RELLENO Y COMPACTACION DE CE	13,756.00	0			
CADERNA DE DESPLANTE DE SECCO	122,673.00	0			
SUMINISTRO Y ELABORACION DE	87,160.00	0			
ZAPATA DE 1.00X1.00X0.15 M CON	138,314.00	0			
EXCAVACION A MANO EN CEPAS,	34,771.00	0			
PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR	21,329.00	0			
DESAMANTEAMIENTO DE MUROS C	28,429.00	0			
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO	3,366.00	0			
TOTAL	1,259,079.00				

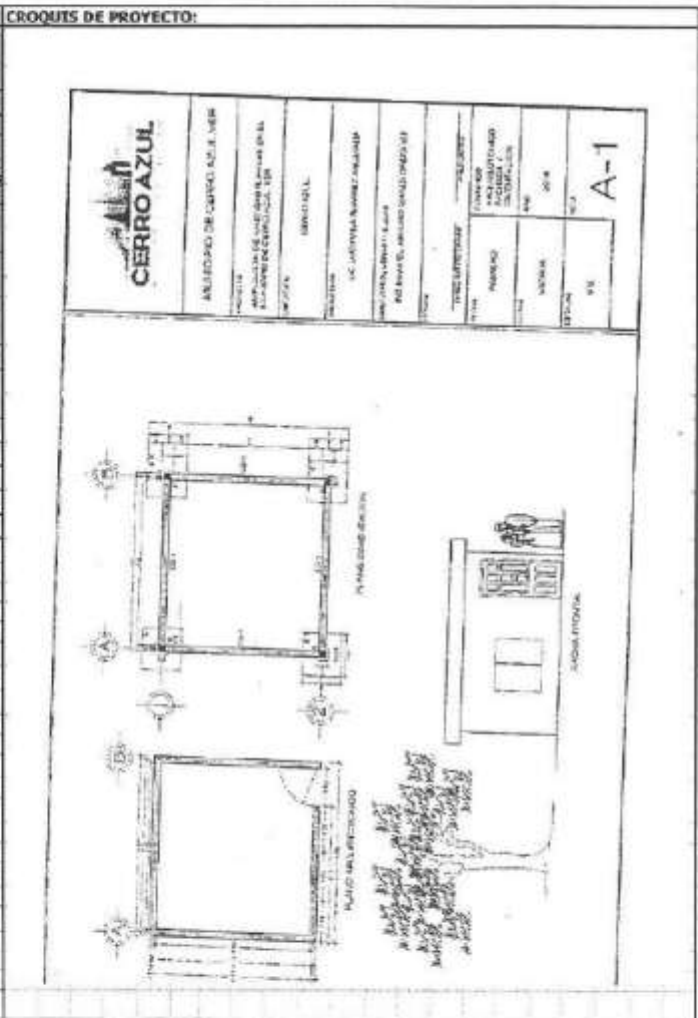

MONTO AUTORIZADO:	1,502,107.20	CIVA			
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	1,502,107.20	CIVA			
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	FECHA				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	FECHA				
META PROGRAMADA:	22.00	UNIDAD:	PZA	REAL:	22.00
AVANCE FISICO:	PROGRAMADO:	10.00	REAL:	10.00	
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE			FECHAS
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X	28/03/2016		
	LICITACIÓN PÚBLICA				
NO. DE CONTRATO:	2016300341004				
MONTO CONTRATADO:	1,294,920.00	CIVA			
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL			
	INICIO	02/05/2016	02/05/2016		
	TERMINO	31/10/2016			
	DÍAS	180.00	0.00		
CONTRATISTA:	ANGEL ENRIQUE MAYA SANCHEZ				
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIOS UNITARIOS	X			
	PRECIO ALZADO				
	MIXTO				
	LLAVE EN MANO				
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA		
	MONTO:	450,532.16	PORCENTAJE:	30.00	
TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS		
MONTO AFIANZADO:	450,532.16				
AFIANZADORA:	ASERTA				
No. DE FIANZA:	4094-03161-5				
FECHA:	27/04/2016				
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA		
	MONTO				
	PLAZO				
	NO APLICA				
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	1,502,107.20	CIVA			

GUSTAVO CASTILLO GARCIA  
SUPERVISOR

MARCELA MARES ORDOÑEZ  
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11





H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

**DATOS GENERALES**

Municipio: CERRO AZUL  
 No. de obra: 2016300341004

Localidad: CERRO AZUL  
 Periodo: MAYO

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2016  
 Número de estimación: \_\_\_\_\_

Descripción: CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LAS COLONIAS: LA CEIBA, LOMAS VERDES, TERESA MORALES Y EX BRECHA EL AGUILA, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Fuente de Financiamiento: \_\_\_\_\_  
 Fecha de revisión: 25/06/2016



FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado: TRAZO POR MEDIOS MANUALES

(11)

FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado: EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES

**Observaciones:**

TRABAJOS EN PROCESO

GUSTAVO CASTILLO  
 RAMO 33  
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:
23/06/2016
MES QUE SE REPORTA
MAYO

DATOS GENERALES																			
MUNICIPIO:	CERRO AZUL			LOCALIDAD:	CERRO AZUL			DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LAS COLONIAS: 7 DE OCTUBRE, VICENTE GUERRERO, CERRO AZUL VIEJO, CARDENAS, BENITO JUAREZ Y LA CEIBA, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS CD			No. DE OBRA:	2016300341006														
ANTECEDENTES:					CROQUIS DE PROYECTO:														
<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:</td> <td>SI</td> <td></td> <td>NO</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI		NO				X							
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI		NO																
		X																	
OBRAS REALIZADAS CON FISH-DF:																			
GRADO DE REZAGO SOCIAL:																			
MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	0156														
TIPO DE ZONA:		RURAL	CLAVE AGE:																
		URBANA																	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI	X	NO															
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL PAIS:		SI	X	NO															
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:																			
DIRECTA	X	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA																
PROYECTO ESPECIAL		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	SI	NO	X														
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA																			
LATITUD	0.000000000		LONGITUD		0.000000000														
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO																			
PARTIDA	MONTO	%																	
SUMINISTRO E INSTALACION DE C	0.00	0																	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE P	0.00	0																	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE R	0.00	0																	
ALIMENTACION HIDRAULICA CON	0.00	0																	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE T	0.00	0																	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE C	0.00	0																	
SUMINISTRO E INSTALACION DE R	0.00	0																	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE L	0.00	0																	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE D	0.00	0																	
SALIDA SANITARIA PARA LAVABO	0.00	0																	
SALIDA SANITARIA PARA COLADEF	0.00	0																	
SALIDA SANITARIA PARA WC CON	0.00	0																	
SALIDA HIDRAULICA PARA REGADI	0.00	0																	
SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO	0.00	0																	
SALIDA HIDRAULICA PARA WC CON	0.00	0																	
EMBOSQUILLADO APLANADO UNA A	0.00	0																	
APLANADO FINO INTERIOR Y EXTE	0.00	0																	
LOSA DE CONCRETO ARMADO F* C	0.00	0																	
CADENA DE CERRAMIENTO DE COI	0.00	0																	
CASTILLO DE CONCRETO ARMADO	0.00	0																	
MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM	0.00	0																	
FIRME DE 10CM DE ESPESOR DE C	0.00	0																	
RELLENO COMPACTADO CON PESO	0.00	0																	
CADENA DE DESPLANTE DE 0.15X0	0.00	0																	

MONTO AUTORIZADO:	1,999,999.73		C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	1,999,999.73		C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	FECHA		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	FECHA		
META PROGRAMADA:	50.00	UNIDAD:	PZA
AVANCE FISICO:	PROGRAMADO:	8.00	REAL:
		EXISTE	FECHAS
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		
	LICITACIÓN PÚBLICA		
NO. DE CONTRATO:	2016300341006		
MONTO CONTRATADO:	1,724,137.70		C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	02/05/2016	02/05/2016
	TÉRMINO	31/10/2016	
	DÍAS	180.00	0.00
CONTRATISTA:	ERIK PEREZ ALVAREZ		
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIOS UNITARIOS	X	
	PRECIO ALZADO MIXTO LLAVE EN MANO		
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	599,999.92	PORCENTAJE: 30.00
	FECHA DE PAGO:	27/05/2016	
TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	COMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	599,999.92	172,413.77	
AFIANZADORA:	ICE FIANZAS MONTERRECE FIANZAS MONTERRE		
No. DE FIANZA:	1705815	1705816	
FECHA:	28/04/2016	28/04/2016	
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO		
	PLAZO		
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	1,999,999.73		C/IVA

GUSTAVO CASTRO GARCIA  
SUPERVISOR

JUAN DE DIOS MARES ORDOÑEZ  
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11





H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL  
 No. de obra: 2016300341006

Localidad: CERRO AZUL  
 Periodo: JUNIO

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2016  
 Número de estimación:

Descripción: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LAS COLONIAS: 7 DE OCTUBRE, VICENTE GUERRERO, CERRO AZUL VIEJO, CARDENAS, BENITO JUAREZ Y LA CEIBA, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.

Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL



FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:  
 FABRICACION DE MURCS DE BLOCK Y COLOCACION DE ROTOPLAS



FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:  
 RANURADO Y COLOCACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE CPVC



Observaciones:

TRABAJOS EN PROCESO

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

SUPERVISOR

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL  
 No. de obra: 2016300341006

Localidad: CERRO AZUL  
 Periodo: MAYO

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2016  
 Número de estimación:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA  
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y  
 DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES  
 DEL DISTRITO FEDERAL

Descripción: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LAS COLONIAS: 7 DE OCTUBRE, VICENTE GUERRERO, CERRO AZUL VIEJO, CARDENAS, BENITO JUAREZ Y LA CEIBA, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.

Fuente de Financiamiento:  
 Fecha de revisión: 25/06/2016

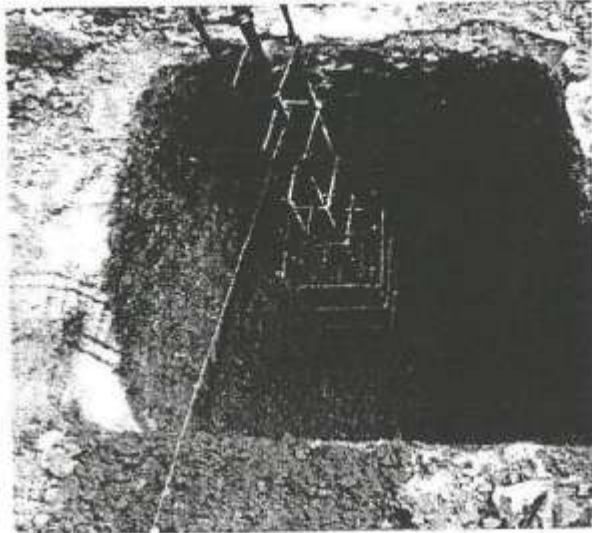


FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:  
 ELABORACION DE EXCAVACION Y ZAPATAS AISLADAS



FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:  
 CADENA DE DESPLANTE

Observaciones:

TRABAJOS EN PROCESO

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

RAMO 13

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis





H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:	23/06/2016
MES QUE SE REPORTA	MAYO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LAS COLONIAS: VICENTE GUERRERO, AGUILERA, FAJA DE ORO, CARDENAS Y TERESA MORALES, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	A SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DE	No. DE OBRA:	2016300341007		

ANTECEDENTES:		CROQUIS DE PROYECTO:			
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI NO				
OBRAS REALIZADAS CON FISH-DF:					
GRADO DE REZAGO SOCIAL:					
MUY ALTO	ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO 0123				
TIPO DE ZONA:	RURAL URBANA CLAYE AGEB:				
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI X NO				
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL PAÍS:	SI X NO				
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:					
DIRECTA	INDIRECTA COMPLEMENTARIA				
PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO X				
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA					
LATITUD	0.000000000			LONGITUD	0.000000000
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO					
PARTIDA	MONTO			%	
Limpieza de terreno plano a mano, incl	0.00			0	
Aplanado fino en plataformas a regla y ni	0.00	0			
Losa plana en super estructura de 10 c	0.00	0			
Construcción de enrase de block de 12	0.00	0			
Demolicion a mano de muros de tabiqua	0.00	0			
Desmantelamiento de Estructura y lama	0.00	0			
TOTAL	0.00				

MONTO AUTORIZADO:	998,999.86	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	998,999.86	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		FECHA
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		FECHA
META PROGRAMADA:	50.00 UNIDAD: PZA REAL: 50.00	
AVANCE FISICO:	PROGRAMADO: 10.00 REAL: 10.00	
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA	EXISTE FECHAS
		X 22/03/2016
NO. DE CONTRATO:	2016300341007	
MONTO CONTRATADO:	861,206.78	C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL
	INICIO	02/05/2016 02/05/2016
	TERMINO	31/10/2016
	DÍAS	180.00 0.00
CONTRATISTA:	JUAN JOSE CANO VALDEZ	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIOS UNITARIOS PRECIO ALZADO MEXTO LLAVE EN MANO	X
ANTICIPO:	APLICA X NO APLICA	
	MONTO: 299,659.96	PORCENTAJE 30.00
TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:	299,699.96	86,120.68
AFIANZADORA:	ASERTA	ASERTA
No. DE FIANZA:	4094-03156-5	4094-03157-5
FECHA:	29/04/2016	29/04/2016
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO PAGO NO APLICA	EXISTE IMPORTE/PERIODO FECHA
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	998,999.86	C/IVA

GUSTAVO CASTILLO GARCIA  
SUPERVISOR

MANUEL RAMIREZ ORDOÑEZ  
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11





H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL  
 No. de obra: 2016300341.007

Localidad: CERRO AZUL  
 Periodo: MAYO

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2016  
 Número de estimación:

Descripción: CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LAS COLONIAS: VICENTE GUERRERO, AGUILERA, FAJA DE ORO, CARDENAS Y TERESA MORALES, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Fuente de Financiamiento:  
 Fecha de revisión: 25/06/2016



FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:  
 ARMADO DE LOSA

(11)

FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:  
 COLADO DE LOSA

Observaciones:

TRABAJOS EN PROCESO



GUILLERMO CASTILLO GARCIA  
 ENCARGADO DEL RAMO 33  
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2016

<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>
23/06/2016
<b>MES QUE SE REPORTA</b>
MAYO

**DATOS GENERALES**

<b>MUNICIPIO:</b>	CERRO AZUL	<b>LOCALIDAD:</b>	CERRO AZUL	<b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:</b>	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS DE LA COLONIA AGUILERA, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	A SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DI	<b>No. DE OBRA:</b>	2016300341009		

<b>ANTECEDENTES:</b>		<b>CROQUIS DE PROYECTO:</b>					
<b>CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:</b>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>						
<b>OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:</b>							
<b>GRADO DE REZAGO SOCIAL:</b>							
MUY ALTO	ALTO			MEDIO	BAJO	MUY BAJO	012
<b>TIPO DE ZONA:</b>				RURAL	CLAVE URBANA	AGER:	
<b>SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:</b>				SI <input type="checkbox"/>	X <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
<b>SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL PAIS:</b>				SI <input type="checkbox"/>	X <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
<b>TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:</b>							
DIRECTA	INDIRECTA			COMPLEMENTARIA		X <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>PROYECTO ESPECIAL:</b>	<b>CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE:</b>			SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>COORDENADAS DE GEORREFERENCIA</b>							
<b>LATITUD</b>	9.880000000	<b>LONGITUD</b>	0.300000000				
<b>PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO</b>							
<b>PARTIDA</b>	<b>MONTO</b>	<b>%</b>					
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA	0.00	0					
SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE TUBERIA	0.00	0					
SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA COND.	0.00	0					
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTO	0.00	0					
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR	0.00	0					
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTO	0.00	0					
SUMIN. Y COL. DE TINACO ROTOPLAS	0.00	0					
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA	0.00	0					
IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA CON	0.00	0					
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	0.00	0					
ZOCLO DE VITROPISO DE 10 CM PEGAJ	0.00	0					
VITROPISO 30CM CHS. DE 1/8" DE ES	0.00	0					
PERFILADO DE MUROS PARA RECIBIR	0.00	0					
APLANADO FINO EN MUROS Y PLAFON	0.00	0					
FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA	0.00	0					
TRABAJO CUMBRERA, INCLUYE CIMERA Y	0.00	0					
LOSA EN ESTRUCTURA, PERALTE = 3I	0.00	0					
DALA O CADENA DE CERRAMIENTO DE	0.00	0					
CADENA O CASTILLO DE CONCRETO P	0.00	0					
DALA O CADENA DE DESPLANTE DE CO	0.00	0					
ZAPATA AISLADA CUADRADA, EN TERR	0.00	0					
RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIA	0.00	0					
EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIA	0.00	0					
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PI	0.00	0					

<b>MONTO AUTORIZADO:</b>	369,973.33	C/IVA	
<b>MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:</b>	369,973.33	C/IVA	
<b>VALIDACIÓN DEL PROYECTO:</b>	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	FECHA	
<b>DEPENDENCIA QUE VALIDA:</b>			
<b>FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:</b>	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	FECHA	
<b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:</b>			
<b>META PROGRAMADA:</b>	L.00	UNIDAD: pza	REAL: 1.00
<b>AVANCE FISICO:</b>	PROGRAMADO: 10.00	REAL: 10.00	
<b>TIPO DE LICITACIÓN:</b>	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X	25/03/2016
	LICITACIÓN PÚBLICA		
<b>NO. DE CONTRATO:</b>	2016300341009		
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	318,942.53	C/IVA	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO</b>	PROGRAMADA	REAL
	<b>TÉRMINO</b>	02/05/2016	02/05/2016
	<b>DÍAS</b>	31/09/2016	
		180.00	0.00
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSTRUMADA S.A DE C.V.		
<b>MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:</b>	PRECIOS UNITARIOS		X
	PRECIO ALZADO		
	MIXTO		
	LLAVE EN MANO		
<b>ANTECIPO:</b>	APLICA <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>		
	MONTO: %	PORCENTAJE	
<b>TIPO DE FIANZA:</b>	FECHA DE PAGO:		
<b>MONTO AFIANZADO:</b>	ANTECIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
		31,894.25	
<b>AFIANZADORA:</b>		ASERTA	
<b>Rc. DE FIANZA:</b>		3900-02066-2	
<b>FECHA:</b>		29/04/2016	
<b>CONVENIO MODIFICATORIO:</b>	EXISTE <input type="checkbox"/> IMPORTE/PERIODO		FECHA
	MONTO		
	NO APLICA		
<b>MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:</b>	369,973.33		C/IVA

GUSTAVO CASILLA GARCIA  
SUPERVISOR

MANUEL M. MARES ORDOÑEZ  
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11





H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:	23/06/2016
MES QUE SE REPORTA	MAYO

DATOS GENERALES																																			
MUNICIPIO:	CERRO AZUL			LOCALIDAD:	CERRO AZUL			DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA "HENRY FORD", DE LA COLONIA LA CEIBA, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DE			No. DE OBRA:	2016300341010																														
ANTECEDENTES:				CROQUIS DE PROYECTO:						MONTOS Y FECHAS:																									
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:				SI		NO		MONTO AUTORIZADO:		370,000.00 C/IVA																									
						X		MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		370,000.00 C/IVA																									
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:										VALIDACIÓN DEL PROYECTO:		EXISTE		NO EXISTE		X		NO APLICA		FECHA															
GRADO DE REZAGO SOCIAL:										MUY ALTO		ALTO		MEDIO		BAJO		MUY BAJO		0226		DEPENDENCIA QUE VALIDA:													
TIPO DE ZONA:										RURAL		URBANA		CLAVE AGR:								FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:		EXISTE		NO EXISTE		X		NO APLICA		FECHA			
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:										SI		X		NO		META PROGRAMADA:		1.00		UNIDAD:		FZA		REAL:		1.00									
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL FAIS:										SI		X		NO		AVANCE FÍSICO:		PROGRAMADO:		8.00		REAL:		8.00		TIPO DE LICITACIÓN:		ADJUDICACIÓN DIRECTA		INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		X		21/03/2016	
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:										DIRECTA		INDIRECTA		COMPLEMENTARIA		X		NO. DE CONTRATO:		2016300341010		MONTO CONTRATADO:		318,965.52 C/IVA		PERIODO DE EJECUCIÓN:		INICIO		PROGRAMADA		REAL			
PROYECTO ESPECIAL:										CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE		SI		NO		X		MONTO CONTRATADO:		PROGRAMADA		REAL		INICIO		02/05/2016		02/05/2016							
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA										LATITUD		0.00000000		LONGITUD		0.00000000		MONTO CONTRATADO:		PROGRAMADA		REAL		TERMINO		31/10/2016		DÍAS		180.00		0.00			
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO										PARTIDA		MONTO		%		CONTRATISTA:		DE LA CRUZ MARQUEZ ADOLFO		PRECIOS UNITARIOS		X		MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:		PRECIO ALZADO		MIXTO		LLAVE EN MANO					
TOTAL												6.00				ANTICIPO:		APLICA		X		NO APLICA		MONTO:		111,000.00		PORCENTAJE		30.00					
										FECHA DE PAGO:		ANTICIPO		CUMPLIMIENTO		VICIOS OCULTOS		MONTO AFIANZADO:		111,000.00		31,896.55													
										AFIANZADORA:		DORAMA		DORAMA				No. DE FIANZA:		634185		633652													
										FECHA:		29/04/2016		29/04/2016				CONVENIO MODIFICATORIO:		MONTO		RAZO		NO APLICA											
										MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		370,000.00		C/IVA		GUSTAVO CASTILLO GARCIA SUPERVISOR		MARQUEZ MARES ORDOÑEZ DIRECTOR DE OBRAS		FORMATO 11															





H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO


EJERCICIO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:
23/06/2016
MES QUE SE REPORTA
MAYO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA TELSECUNDARIA "EMILIANO ZAPATA" DE LA COLONIA MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	A SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DE	No. DE OBRA:	2016300341011		

ARTECEDENTES:					
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	NO		
		X			
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:					
GRADO DE REZAGO SOCIAL:					
MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	0245
TIPO DE ZONA:		RURAL	CLAVE AGER:		
		URBANA			
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI	X	NO	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL PAIS:		SI	X	NO	
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:					
DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	X		
PROYECTO ESPECIAL		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	SI	NO	X
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA					
LATITUD	0.00000000	LONGITUD	0.00000000		
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO					
PARTIDA	MONTO	%			
FABRICACION Y COLOCACION DE BASE	4,120.00	0			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANA	14,670.00	0			
SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA Z	82,900.00	0			
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCAC	3,991.00	0			
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCAC	21,604.00	0			
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCAC	77,336.00	0			
COLUMNA CIRCULAR DE ESTRUCTURA	28,546.00	0			
SUMINISTRO Y ELABORACION DE DAD	6,883.00	0			
ZAPATA DE CIMENTACION, SECCION 1	10,825.00	0			
PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE C	2,064.00	0			
EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATE	2,498.00	0			
RELLENO Y COMPACTADO CON PIZON	1,605.00	0			
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PL	2,165.00	0			
TOTAL	258,515.00				

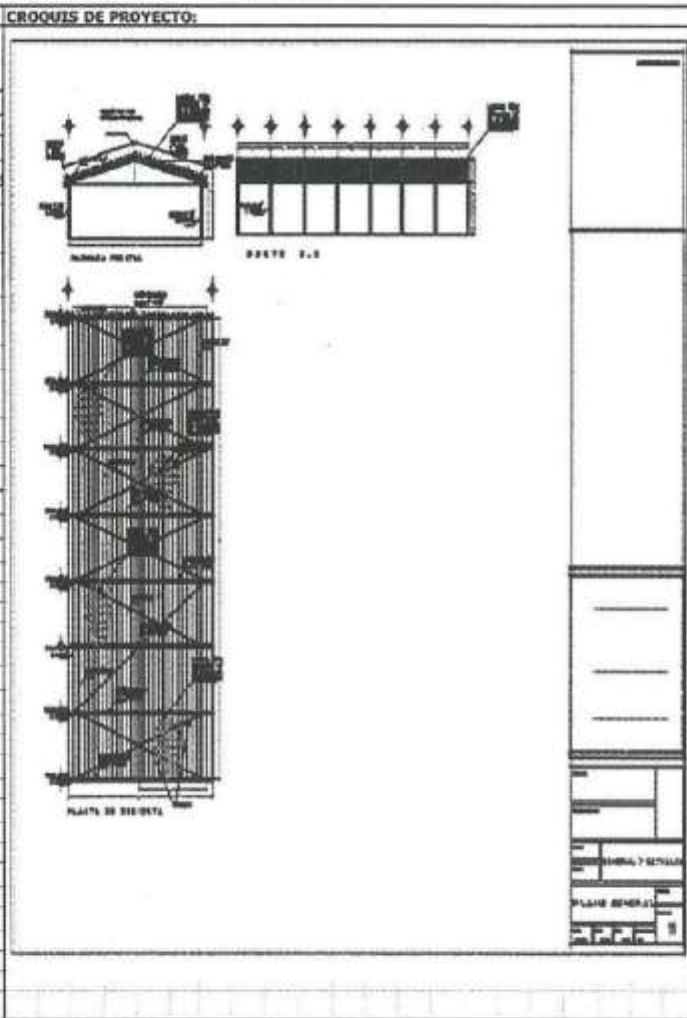

MONTO AUTORIZADO:	300,000.00	C/IVA			
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	300,000.00	C/IVA			
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	X	NO APLICA	FECHA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:					FECHA
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	X	NO APLICA	FECHA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:					FECHA
META PROGRAMADA:	1.00	UNIDAD:	PZA	REAL:	1.00
AVANCE FISICO:	PROGRAMADO:	10.00	REAL:	10.00	
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE	FECHAS		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X	22/03/2016		
	LICITACIÓN PÚBLICA				
NO. DE CONTRATO:	2016300341011				
MONTO CONTRATADO:	258,620.69	C/IVA			
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	PROGRAMADA	REAL		
		02/05/2016	02/05/2016		
	TÉRMINO	31/10/2016			
	DÍAS	0.00	0.00		
CONTRATISTA:	DE LA CRUZ MARQUEZ ADOLFO				
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIOS UNITARIOS	X			
	PRECIO ALZADO				
	PEXTO				
	LLAVE EN MANO				
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA		
	MONTO:	90,000.00	PORCENTAJE	30.00	
FECHA DE PAGO:					
TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VECIOS OCULTOS		
MONTO AFIANZADO:	90,000.00	25,862.07			
AFIANZADORA:	DORAMA	DORAMA			
No. DE FIANZA:	16A13052	16A13053			
FECHA:	29/04/2016	29/04/2016			
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	IMPORTE/PERICDO	FECHA		
	PLAZO				
	NO APLICA				
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	300,000.00	C/IVA			
GUSTAVO CASTILLO GARCIA	MARIANA MARES ORDOÑEZ				
SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRAS				



FORMATO 11





H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:	23/06/2016
MES QUE SE REPORTA	MAYO

DATOS GENERALES										
MUNICIPIO: CERRO AZUL			LOCALIDAD: CERRO AZUL			DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DE			No. DE OBRA: 2016300341015							
ANTECEDENTES:					CROQUIS DE PROYECTO:					
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>										
OBRAS REALIZADAS CON FISH-DF:										
GRADO DE REZAGO SOCIAL:										
MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO						0103
TIPO DE ZONA:		RURAL	CLAVE AGES:							
		URBANA								
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI	X	NO						
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL FAIS:		SI	X	NO						
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:										
DIRECTA		INDIRECTA		COMPLEMENTARIA						X
PROYECTO ESPECIAL		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE		SI						NO
				X						
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA										
LATITUD 9.900000000		LONGITUD 0.000000000								
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO										
PARTIDA	MONTO	%								
Limpieza de terreno plano a mano	12,212.00	0								
Suministro y aplicación de pinturas	7,022.00	0								
Relevo compactado con pisón de r	338.80	0								
ELABORACION DE GUARNICION TR	57,618.00	0								
EXCAVACION A MANO EN CERAS,	5,830.00	0								
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO	434.28	0								
Suministro y aplicación de concret	7,394.00	0								
Suministro y colocación de varillas	6,042.00	0								
Suministro y colocación de p	4,509.00	0								
Suministro y colocación de concret	365,757.00	0								
Suministro y colocación de mala de	30,030.00	0								
Acarreo en camión 10ómetro subse	29,014.00	0								
Acarreo en camión 1er kilometro, d	17,353.00	0								
Carga con maquina (cargador front	14,166.00	0								
Base hidráulica 70-30% (grava 1 1/	58,042.00	0								
Compactación del terreno natural c	2,084.00	0								
Excavación por medios mecánicos	11,993.00	0								
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO	5,066.00	0								
TOTAL		684,995.08								
MONTOS Y VALIDACIONES:										
MONTA AUTORIZADO:		794,486.00		C/IVA						
MONTA DEL PRESUPUESTO BASE:		794,796.00		C/IVA						
VALIDACION DEL PROYECTO: EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>										
DEPENDENCIA QUE VALIDA: FECHA										
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>										
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: FECHA										
META PROGRAMADA:		770.00	UNIDAD: m2	REAL: 770.00						
AVANCE FISICO:		PROGRAMADO: 10.00	REAL: 10.00							
TIPO DE LICITACION: ADJUDICACION DIRECTA EXISTE <input type="checkbox"/> FECHAS										
INVITACION A MENOS 3 PERSONAS X 29/03/2016										
LICITACION PUBLICA										
NO. DE CONTRATO: 2016300341015										
MONTA CONTRATADO:		584,901.72	C/IVA							
PERIODO DE EJECUCION:										
INICIO		02/05/2016		REAL						
TERMINO		31/10/2016								
DÍAS		180.00	0.00							
CONTRATISTA: JAHIR DE JESUS MORENO LECONA										
MODALIDAD DE CONTRATACION: PRECIOS UNITARIOS X										
PRECIO ALZADO										
MEIXTO										
LLAVE EN MANO										
ANTICIPO: APLICA <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>										
MONTO:		PORCENTAJE								
FECHA DE PAGO: ANTIPO										
TIPO DE FIANZA:		CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS							
MONTA AFIANZADO:		68,490.17								
AFIANZADORA: PRIMERO FIANZAS										
No. DE FIANZA: 165583-000										
FECHA: 22/04/2016										
CONVENIO MODIFICATORIO: EXISTE <input type="checkbox"/> IMPORTE/PERIODO: FECHA										
MONTA TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: 794,486.00 C/IVA										

GUSTAVO CASTILLO GARCIA  
SUPERVISOR

MARCELO A. PIARES ORDOÑEZ  
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

ERODIO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:

23/06/2016

MES QUE SE REPORTA


JUNIO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	LA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DBM	No. DE OBRA:	2016300341015		

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	NO			
	X				
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:					
GRADO DE REZAGO SOCIAL:					
MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	0103
TIPO DE ZONA:			CLAVES AGES:		
	RURAL				
	URBANA				
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:			SI	X	NO
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL FAIS:			SI	X	NO
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:					
DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	X		
PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	SI	NO	X	
		NO			

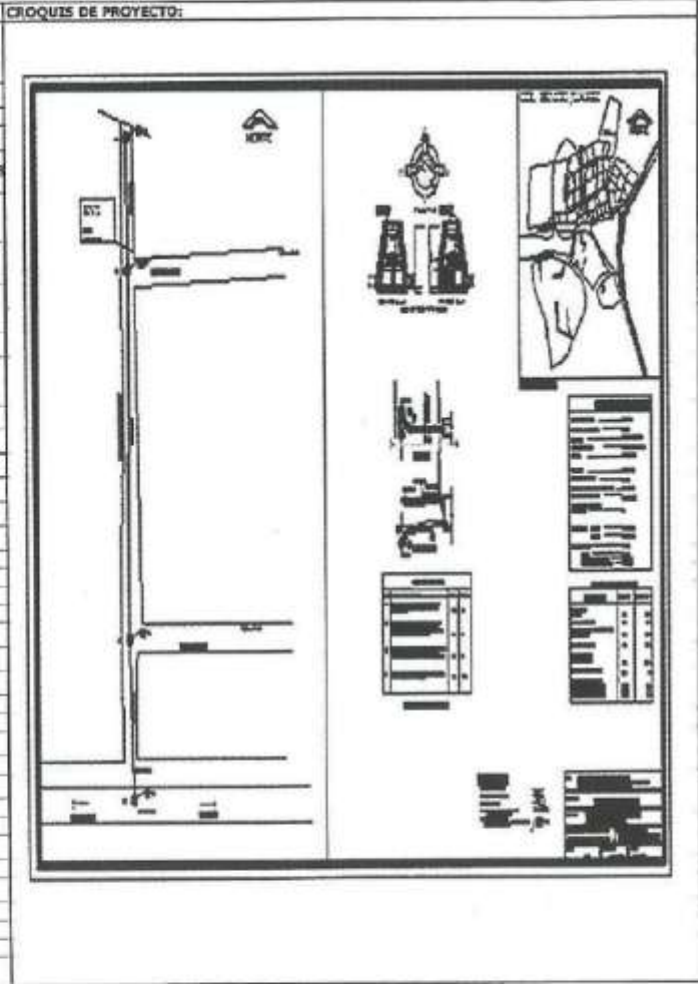

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA

LATITUD	0.00000000	LONGITUD	0.00000000
---------	------------	----------	------------

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO

PARTIDA	MONTO	%
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO	5,066.00	0
Excavación por medios mecánicos pas	11,993.00	0
Compactación del terreno natural con	2,084.00	0
Base hidráulica 70-30% (grava 1 1/2")	58,042.00	0
Carga con máquina (carpenter frontal	14,166.00	0
Acarreo en camión 1er kilómetro, de r	17,351.00	0
Acarreo en camión kilómetro subsecue	79,014.00	0
Suministro y colocación de malla de ac	30,036.00	0
Suministro y colocación de concreto y	365,257.00	0
Suministro y colocación de pasarelas	4,509.00	0
Suministro y colocación de varillas pas	6,042.00	0
Suministro y aplicación de curacreto	7,384.00	0
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO	434.28	0
EXCAVACION A MANO EN OBRAS MA	5,830.00	0
ELABORACION DE GUARNICION TRAP	57,613.00	0
Refrero compactado con grán de ma	338.80	0
Suministro y aplicación de pintura de	7,322.00	0
Limpieza de terreno plano a mano, in	12,212.00	0
TOTAL	684,895.08	

MONTO AUTORIZADO:	794,486.00	C/IVA			
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	794,786.00	C/IVA			
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				FECHA	
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				FECHA	
META PROGRAMADA:	770.00	UNIDAD:	m2	REAL:	770.00
AVANCE FISICO:	PROGRAMADO:	10.00	REAL:	10.00	
			EXISTE	FECHAS	
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X		29/03/2016	
	LICITACIÓN PÚBLICA				
NO. DE CONTRATO:	2016300341015				
MONTO CONTRATADO:	684,901.72	C/IVA			
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL			
	INICIO	02/05/2016	02/05/2016		
	TÉRMINO	31/10/2016			
	DÍAS	180.00	0.00		
CONTRATISTA:	JAHIR DE JESUS MORENO LECONA				
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIOS UNITARIOS		X		
	PRECIO ALZADO				
	MIXTO				
ANTICIPO:	LLAVE EN MANO				
	APLICA	NO APLICA	X		
FECHA DE PAGO:	MONTO:	PORCENTAJE			
TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS		
MONTO AFIANZADO:		68,490.17			
AFIANZADORA:	PRIMERA FIANZAS				
No. DE FIANZA:	1565883-000				
FECHA:	22/04/2016				
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA		
	MONTO				
	PLAZO				
	NO APLICA				
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) OBRA:	794,486.00	C/IVA			

GUSTAVO CASTILLO GUICHA  
SUPERVISOR

OSIEL A. JIMES OROZCO  
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11







H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:	23/05/2016
MES QUE SE REPORTA	MAYO

DATOS GENERALES											
MUNICIPIO:	CERRO AZUL			LOCALIDAD:	CERRO AZUL			DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA RURAL DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL VERACRUZ		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DE			No. DE OBRA:	2016300341018						
<b>ANTECEDENTES:</b>				<b>CROQUIS DE PROYECTO:</b>						MONTO AUTORIZADO: 2,683,950.00 C/IVA MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: 2,683,950.00 C/IVA	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:				SI		NO		VALIDACIÓN DEL PROYECTO:		EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/> X	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:				GRADO DE REZAGO SOCIAL:		MUY ALTO		DEPENDENCIA QUE VALIDA:		FECHA	
MUY ALTO				ALTO		MEDIO		DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		FECHA	
BAJO				MUY BAJO		O/15		META PROGRAMADA:		87.00 UNIDAD: VIVIENDA REAL: 87.00	
TEPO DE ZONA:				RURAL		URBANA		AVANCE FÍSICO:		PROGRAMADO: 45.00 REAL: 45.00	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:				SI		X		TIPO DE LICITACIÓN:		ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL PAÍS:				SI		X		NO EXISTE		FECHAS	
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:				DIRECTA		INDIRECTA		PROGRAMADA		REAL	
COMPLEMENTARIA				PROYECTO ESPECIAL		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE		DÍAS		0.00	
SI				NO		X		CONTRATISTA:		LARATHOM S.A. DE C.V	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA				LATITUD		21.198153000		MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:		PRECIOS UNITARIOS <input type="checkbox"/> X PRECIO ALZADO MÍNIMO LLAVE EN MANO	
LONGITUD				197.745497000		PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO		ANTICIPO:		MONTO: 536,790.00 PORCENTAJE: 30.00 FECHA DE PAGO: 05/05/2016	
PARTIDA				MONTO		%		TIPO DE FIANZA:		ANTECIPADO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS MONTA AFIANZADO: 536,790.00 231,375.00 AFIANZADORA: ASERTA ASERTA	
LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TI				9,844.75		0		No. DE FIANZA:		3136-08130-5 3136-08131-8 FECHA: 04/04/2016 04/04/2016	
EXCAVACIÓN PARA CADENAS DE CONC				54,295.40		0		CONVENIO MODIFICATORIO:		MONTO IMPORTE/PERIODO NO APLICA	
ZAPATA DE 1.00X1.00 DE CONCRETO #				142,680.00		0		MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO DE OBRA):		2,683,950.00 C/IVA	
CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM				58,832.00		0		GUSTAVO OSORIO GARCIA SUPERVISOR		GUANAJUATO MARES ORDOÑEZ DIRECTOR DE OBRAS	
SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE DM				153,634.00		0		FORMATO 11			
CASTILLO DE SECCIÓN 15X15 CM, CD				78,495.23		0					
MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM EN				351,843.67		0					
CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN				157,302.26		0					
LOSA DE CONCRETO FC=250 KG/CM2				543,252.42		0					
BIRRIE DE 10 CM. DE ESPESOR ACABAR				195,673.44		0					
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENT				78,909.00		0					
SALIDA DE CONTACTO Y APAGADOR C				23,557.00		0					
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUER				77,855.00		0					
APLANADO EN MUROS A PLOMO Y REG				201,796.93		0					
PREFIL DE 30 CM DE ALTURA A BASE				92,981.25		0					
IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA A B				66,273.12		0					
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTU				6,494.53		0					
TOTAL				2,313,730.00							



# H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.



REPORTE MENSUAL DEL  
FORMATO 09 Y 011

MAYO 2016






H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:	23/05/2016
MES QUE SE REPORTA	MAYO

DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DE	No. DE OBRA:	2016300340022
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:		REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA COLONIA MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	

ANTECEDENTES:					
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>				
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:					
GRADO DE REZAGO SOCIAL:					
MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	0245
TIPO DE ZONA:		CLAVE AGEB:			
RURAL		URBANA			
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI	X	NO	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL FAIS:		SI	X	NO	
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:					
DIRECTA		INDIRECTA		COMPLEMENTARIA	
PROYECTO ESPECIAL		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE		SI	NO
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA					
LATITUD	0.00000000	LONGITUD	0.00000000		
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO					
PARTIDA	MONTO	%			
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENI	7,452.64	0			
DEMOLICION DE GRADAS DE CONCRET	3,417.17	0			
RETIRO DE GRADAS DE ESTRUCTA TUI	2,085.31	0			
RETIRO DE POSTE DE CONCRETO POR CARGA EN FORMA MANUAL Y ACAI	10,226.10	0			
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE	80.22	0			
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO D	1,188.24	0			
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO D	148.73	0			
DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLO	1,167.61	0			
DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE CEI	1,111.80	0			
ELABORACION DE PLACA DE 10CM ESP	155,595.63	4			
REHABILITACION DE PORTERIAS A BA	3,237.42	0			
REHABILITACION DE POSTES CON TAB	23,130.00	1			
INSTALACION DE MALLA CICLON FORR	15,550.53	0			
FABRICACION DE GRADAS DE CONCRE	91,739.10	2			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTI	15,604.68	0			
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTU	27,014.40	1			
EXCAVACION POR MEDIOS MAUALEL E	713.85	0			
FABRICACION DE ZAPATAS AISLADAS I	3,902.90	0			
CADENA DE DESPLANTE DE SECCION I	4,603.00	0			
MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM.	7,571.85	0			
ASTILLO DE SECCION 15 X 20 CM., COI	396,355.81	0			
CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCIO	4,603.00	0			
APLANADO COMUN EN MUROS A PLOM	8,344.00	0			
LIMPIEZA FINAL DE OBRA PARA EN	6,425.89	0			

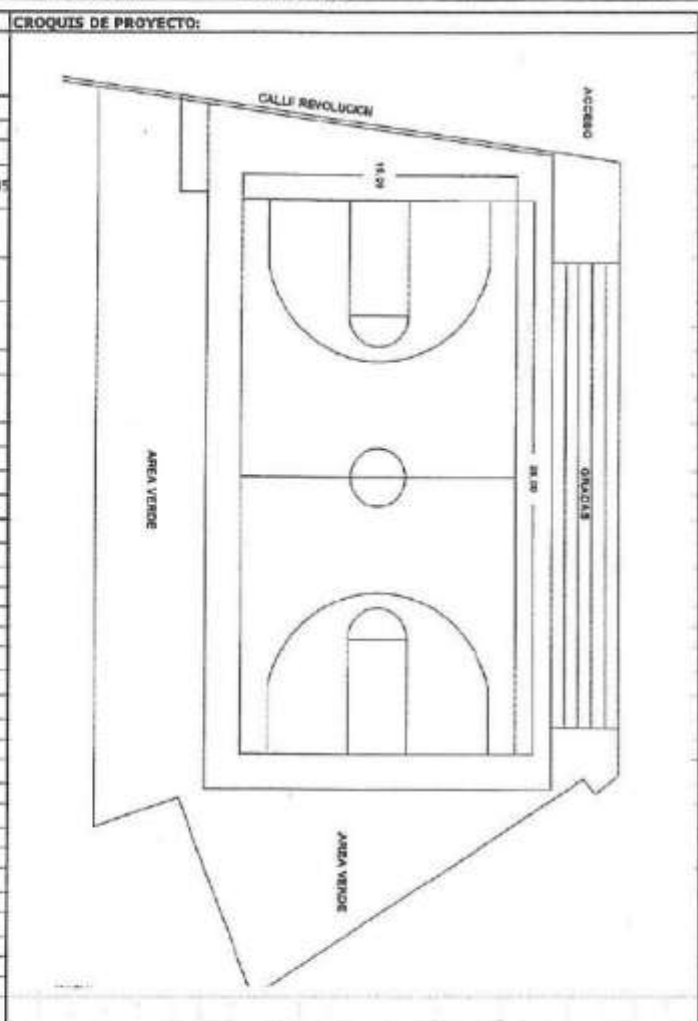

MONTO AUTORIZADO:	459,772.72	C/IVA	
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	459,772.72	C/IVA	
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/>	FECHA	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:			
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/>	FECHA	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:			
META PROGRAMADA:	1,150.00	UNIDAD: M2 REAL: 1,150.00	
AVANCE FISICO:	PROGRAMADO: 40.00	REAL: 40.00	
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA IMITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA	EXISTE <input type="checkbox"/> FECHAS: 15/03/2016	
NO. DE CONTRATO:	2016300340022		
MONTO CONTRATADO:	396,355.79	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/04/2016	04/04/2016
	TERMINO	31/05/2016	
	DÍAS	118.00	0.00
CONTRATISTA:	ENRIQUE MAYA SANCHEZ		
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIOS UNITARIOS	X	
	PRECIO ALZADO		
ANTICIPO:	MIXTO		
	LLAVE EN MANO		
	APLICA <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>		
	MONTO:	PORCENTAJE	
TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		39,635.58	
AFIANZADORA:		ASERTA	
No. DE FIANZA:		4054-03139-3	
FECHA:		28/03/2016	
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE <input type="checkbox"/> IMPORTE/PELIGOO	FECHA	
	MONTO PLAZO NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	459,772.72	C/IVA	

GUSTAVO CASTILLO GARCIA  
SUPERVISOR

MURIL MARTURO MARES DADOEJ  
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11



N. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2016

FECHA DE ELABORACION:	23/05/2016
MES QUE SE REPORTA	MAYO

DATOS GENERALES														
MUNICIPIO:	CERRO AZUL			LOCALIDAD:	CERRO AZUL			DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AMADO NERVO DE LA COL. LAZARO CARDENAS, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DE			No. DE OBRA:	2016300340021									
ANTECEDENTES:					CROQUIS DE PROYECTO:									
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:														
SI										NO				
X														
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:														
GRADO DE REZAGO SOCIAL:														
MUY ALTO										ALTO				
MEDIO										BAJO				
MUY BAJO										OTRO				
TIPO DE ZONA:										RURAL				
URBANA										CLAVE AGER:				
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:					SI									
X					NO									
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL FAIS:					SI									
X					NO									
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:														
DIRECTA					INDIRECTA									
					COMPLEMENTARIA									
X														
PROYECTO ESPECIAL					CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE									
SI					NO									
X														
COORDENADAS DE GEDREFERENCIA														
LATITUD					0.00000008									
LONGITUD					0.00000000									
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO														
PARTIDA					MONTO									
%														
LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION POR I					2,317.45									
0														
DEMOLICION DE PAVIMENTO, BANQUE					1,975.49									
0														
EXCAVACION CON HERRAMIENTA MANI					25,909.82									
0														
AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO					6,323.53									
0														
GLORIFICACION DE CONCRETO HIDRAULI					58,201.99									
0														
RELLENO COMPACTADO CON HERRAMI					2,132.19									
0														
RELLENO COMPACTADO CON HERRAMI					9,009.31									
0														
CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRO					8,956.39									
0														
BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE FC-					47,315.15									
0														
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTUR					7,031.89									
0														
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRALIMPIEZA					1,339.31									
0														
LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION POR I					4,977.92									
0														
APERTURA DE CAJA CON MAQUINARI					26,729.41									
0														
CONFORMACION Y COMPACTACION DE					5,541.42									
0														
CONSTRUCCION DE BASE COMPACTAD					57,276.48									
0														
CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRO					31,919.24									
0														
CUBRA EN REGLAS Y FLONTERAS DE I					1,954.75									
0														
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALL					30,778.14									
0														
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULIC					315,286.27									
0														
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARIL					3,928.12									
0														
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARR					674,603.42									
0														
FORMACION DE TABLEROS CON CORTI					2,053.37									
0														
SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTI					4,658.07									
0														
SUMINISTRO Y APLICACION DE CLIRAC					7,360.65									
0														

MONTO AUTORIZADO:	782,548.46			CIVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	782,548.46			CIVA
VALIDACION DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	X	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				FECHA
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	X	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				FECHA
META PROGRAMADA:	760.00	UNIDAD:	M2	REAL:
AVANCE FISICO:	PROGRAMADO:	30.00	REAL:	30.00
TIPO DE LICITACION:	ADJUDICACION DIRECTA			EXISTE
	INVITACION A MENOS 3 PERSONAS			X
	LICITACION PUBLICA			FECHAS
NO. DE CONTRATO:	2016300340021			
MONTO CONTRATADO:	674,610.74			CIVA
PERIODO DE EJECUCION:	PROGRAMADA	REAL		
	INICIO	04/04/2016	04/04/2016	
	TERMINO	30/06/2016		
	DIAS	118.00	0.00	
CONTRATISTA:	ERIK PEREZ ALVAREZ			
MODALIDAD DE CONTRATACION:	PRECIOS UNITARIOS			X
	PRECIO ALZADO			
	MIXTO			
	LLAVE EN MANO			
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X	
	MONTO:	PORCENTAJE		
	FECHA DE PAGO:	ANTICIPO		
TIPO DE FIANZA:	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS		
MONTO AFIANZADO:	67,461.07			
AFIANZADORA:	ICE FIANZAS MONTERRE			
No. DE FIANZA:	1701054			
FECHA:	31/03/2016			
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	PROZO			
	NO APLICA			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	782,548.46			CIVA

GUSTAVO CASTILLO GARCIA  
SUPERVISOR

MANUEL ARTURO MARES ORDOÑEZ  
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11





H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:	13/05/2016
MES QUE SE REPORTA	MAYO

DATOS GENERALES										
MUNICIPIO:	CERRO AZUL			LOCALIDAD:	CERRO AZUL			DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARÍA DIVINA EN LA COL. FAJA DE ORO, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DE			No. DE OBRA:	2016300340019					
ANTECEDENTES:		CROQUIS DE PROYECTO:								
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	NO	X							
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:										
GRADO DE REZAGO SOCIAL:										
MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	0/100					
TIPO DE ZONA:	RURAL	URBANA	CLAVE AGE:							
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	NO	X							
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL FAES:	SI	NO	X							
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:										
DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	X							
PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	SI	NO	X						
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA										
LATITUD	0.000000000			LONGITUD	0.000000000					
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO										
PARTIDA	MONTO	%								
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA	126,521.00	0								
SUMINISTRO Y FABRICACION DE TUBERIA	18,245.00	0								
CONSTRUCCION DE TRABAJO DE CIMENTACION	13,257.00	0								
RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE TIERRA	1,535.00	0								
EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS	3,596.00	0								
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO	120.00	0								
SUMINISTRO Y APLICACION DE CEMENTO	14,375.00	0								
MANEJO DE CONCRETO HECHO	77,829.00	0								
ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILÓMETRO	573.00	0								
CARGA CON MAQUINA (CARGADOR FRONTAL)	141.00	0								
RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE TIERRA	2,567.00	0								
ELABORACION DE GUARNICION TRAZO	125,208.00	0								
AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO	12,897.00	0								
EXCAVACION CON HERRAMIENTAS MANUALES	9,139.00	0								
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO	2,595.72	0								
ANUNCIO ESPECTACULAR	1,833.00	0								
LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MANO	7,230.00	0								
RENTABILIDAD DE POZO DE VISITA CON CIMENTACION	4,474.00	0								
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CEMENTO	4,453.00	0								
CORTE CON DISCO DE 3.18 CM. DE ESPESOR	1,841.00	0								
JUNTA DE DILATACION A BASE DE VASCO	813,281.72	0								
PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO	275,200.00	0								
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA	29,694.00	0								
ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILÓMETRO	2,753.00	0								

MONTO AUTORIZADO:	943,419.93			CIVA	
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	943,419.93			CIVA	
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				FECHA	
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				FECHA	
META PROGRAMADA:	588.00	UNIDAD:	M2	REAL:	688.00
AVANCE FÍSICO:	PROGRAMADO:	10.00	REAL:	16.00	
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INVITACIÓN A MENOS DE 3 PERSONAS	X	FECHAS	28/03/2016
	LICITACIÓN PÚBLICA				
NO. DE CONTRATO:	2016300340019				
MONTO CONTRATADO:	813,293.04	CIVA			
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL			
	INICIO	02/05/2016	02/05/2016		
	TERMINO	31/10/2016			
	DÍAS	180.00	0.00		
CONTRATISTA:	INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE OBRA S.A DE C.V.				
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIOS UNITARIOS	X			
	PRECIO ALZADO				
	MIXTO				
	LLAVE EN MANO				
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA		
	MONTO:	283,025.97	PORCENTAJE:	30.00	
TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS		
MONTO AFIANZADO:	283,025.97	81,329.30			
AFIANZADORA:	ICE FIANZAS MONTERREIFE FIANZAS MONTERREIFE				
No. DE FIANZA:	1704574	1704284			
FECHA:	29/04/2016	29/04/2016			
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA	
	PLAZO				
	NO APLICA				
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	943,419.93			CIVA	

GUSTAVO CASTILLO GARCIA  
SUPERVISOR

HANUEL MARES ORDOÑEZ  
DIRECTOR DE OBRAS

943,419.93 CIVA

FORMATO 11







# H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.



REPORTE MENSUAL DEL  
FORMATO 09 Y 011

MAYO 2016




H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:	23/05/2016
MES QUE SE REPORTA	MAYO

DATOS GENERALES																	
MUNICIPIO:	CERRO AZUL			LOCALIDAD:	CERRO AZUL			DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA COLONIA MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DE			No. DE OBRA:	2016300340022												
ANTECEDENTES:				CROQUIS DE PROYECTO:						MONTO AUTORIZADO:		459,772.72	C/VA				
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:				SI		NO		MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		459,772.72	C/VA						
					X			VALIDACIÓN DEL PROYECTO:		EXISTE	NO EXISTE	X	NO APLICA				
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:				CROQUIS DE PROYECTO:						DEPENDENCIA QUE VALIDA:		FECHA					
GRADO DE REZAGO SOCIAL:				CROQUIS DE PROYECTO:						DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACILIDAD:		FECHA					
MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	CROQUIS DE PROYECTO:						META PROGRAMADA:		1,150.00	UNIDAD:	M2	REAL:	1,150.00
				0249	CROQUIS DE PROYECTO:						AVANCE FÍSICO:		PROGRAMADO:	40.00	REAL:	40.00	
TIPO DE ZONA:				RURAL	CROQUIS DE PROYECTO:						TIPO DE LICITACIÓN:		ADJUDICACIÓN DIRECTA		EXISTE		FECHAS
URBANA				CLAVE AGEB:	CROQUIS DE PROYECTO:						INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		X	15/02/2016			
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:				SI	X	NO		CROQUIS DE PROYECTO:						LICITACIÓN PÚBLICA			
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL PAÍS:				SI	X	NO		CROQUIS DE PROYECTO:						RO. DE CONTRATO:		2016300340022	
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:				CROQUIS DE PROYECTO:						MONTO CONTRATADO:		396,355.79	C/VA				
DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA		CROQUIS DE PROYECTO:						PERIODO DE EJECUCIÓN:		PROGRAMADA	REAL				
PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	SI	NO	X	CROQUIS DE PROYECTO:						INICIO	01/04/2016	04/04/2016				
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA				CROQUIS DE PROYECTO:						TERMINO	31/05/2016						
LATTITUD	0.000000000	LONGITUD	0.000000000	CROQUIS DE PROYECTO:						DÍAS	118.00	0.00					
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO				CROQUIS DE PROYECTO:						CONTRATISTA:		ENRIQUE MAYA SANCHEZ					
PARTIDA	MONTO	%	CROQUIS DE PROYECTO:						MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:		PRECIOS UNITARIOS	X					
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO	7,452.64	0	CROQUIS DE PROYECTO:						PRECIO ALZADO								
DEMOLICION DE GRADAS DE CONCRETO	3,417.17	0	CROQUIS DE PROYECTO:						MEXTO								
RETIRO DE GRADAS DE ESTRUCTURA TUE	2,085.31	0	CROQUIS DE PROYECTO:						LLAVE EN MANO								
RETIRO DE POSTE DE CONCRETO POR:	10,226.10	0	CROQUIS DE PROYECTO:						APLICA		NO APLICA	X					
CARGA EN FORMA MANUAL Y ACAF	80.22	0	CROQUIS DE PROYECTO:						MONTO:		PORCENTAJE						
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE	1,108.24	0	CROQUIS DE PROYECTO:						FECHA DE PAGO:		ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VECIOS OCULTOS				
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO D	148.73	0	CROQUIS DE PROYECTO:						MONTA AFIANZADO:		39,635.58						
DESMANTELAMIENTO DE MALLA CÍCLO	1,167.61	0	CROQUIS DE PROYECTO:						AFIANZADORA:		ASERTA						
DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE CEB	1,111.80	0	CROQUIS DE PROYECTO:						No. DE FIANZA:		4094 03130 3						
ELABORACION DE PLACA DE 10CM ESP	155,595.63	4	CROQUIS DE PROYECTO:						FECHA:		28/03/2016						
REHABILITACION DE PORTERTIAS A BA	3,237.42	0	CROQUIS DE PROYECTO:						CONVENIO MODIFICATORIO:		EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA				
REHABILITACION DE POSTES CON TAB	23,130.00	1	CROQUIS DE PROYECTO:						MONTA TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		459,772.72	C/VA					
INSTALACION DE MALLA CÍCLO FORR	15,550.53	0	CROQUIS DE PROYECTO:						GUSTAVO CASTILLO GARCIA		MANUEL ARTURO MARES ORDOÑEZ						
FABRICACION DE GRADAS DE CONCRE	91,739.10	2	CROQUIS DE PROYECTO:						SUPERVISOR		DIRECTOR DE OBRAS						
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTI	15,604.68	0	CROQUIS DE PROYECTO:						FORMATO 11:								
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTU	27,014.40	1	CROQUIS DE PROYECTO:														
EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES	713.85	0	CROQUIS DE PROYECTO:														
FABRICACION DE ZAPATAS AISLADAS I	3,902.40	0	CROQUIS DE PROYECTO:														
CADENA DE DESPLANTE DE SECCION I	4,603.00	0	CROQUIS DE PROYECTO:														
MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM.	7,571.85	0	CROQUIS DE PROYECTO:														
ASTILLO DE SECCION 15 X 20 CM., CO	396,355.81	0	CROQUIS DE PROYECTO:														
CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCIO	4,603.00	0	CROQUIS DE PROYECTO:														
APLANADO COMLIN EN MUROS A PLOM	8,344.00	0	CROQUIS DE PROYECTO:														
LIMPIEZA FINAL DE OBRA PARA EP	6,425.89	0	CROQUIS DE PROYECTO:														

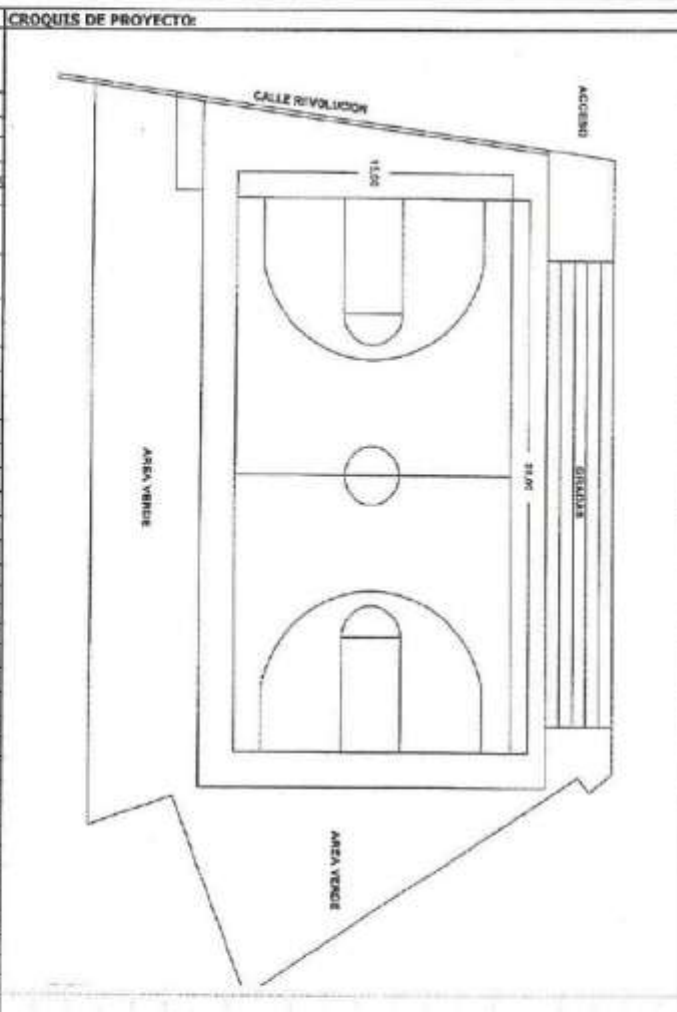

MONTO AUTORIZADO:	459,772.72	C/VA			
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	459,772.72	C/VA			
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	X	NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	FECHA				
FACILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	X	NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACILIDAD:	FECHA				
META PROGRAMADA:	1,150.00	UNIDAD:	M2	REAL:	1,150.00
AVANCE FÍSICO:	PROGRAMADO:	40.00	REAL:	40.00	
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA		EXISTE		FECHAS
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		X	15/02/2016	
	LICITACIÓN PÚBLICA				
RO. DE CONTRATO:	2016300340022				
MONTO CONTRATADO:	396,355.79	C/VA			
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL			
	INICIO	01/04/2016	04/04/2016		
	TERMINO	31/05/2016			
	DÍAS	118.00	0.00		
CONTRATISTA:	ENRIQUE MAYA SANCHEZ				
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIOS UNITARIOS	X			
	PRECIO ALZADO				
	MEXTO				
	LLAVE EN MANO				
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X		
	MONTO:	PORCENTAJE			
FECHA DE PAGO:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VECIOS OCULTOS		
MONTA AFIANZADO:		39,635.58			
AFIANZADORA:		ASERTA			
No. DE FIANZA:		4094 03130 3			
FECHA:		28/03/2016			
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA		
	MONTO				
	PLAZO				
	NO APLICA				
MONTA TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	459,772.72	C/VA			
GUSTAVO CASTILLO GARCIA	MANUEL ARTURO MARES ORDOÑEZ				
SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRAS				

FORMATO 11:





H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:
23/05/2016
MES QUE SE REPORTA
MAYO

DATOS GENERALES												
MUNICIPIO:	CERRO AZUL			LOCALIDAD:	CERRO AZUL			DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AMADO NERVO DE LA COL. LAZARO CARDENAS, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DE			No. DE OBRA:	2016300340021							
ANTECEDENTES:				CROQUIS DE PROYECTO:								
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:												
SI										NO		
OBRAS REALIZADAS CON FISH-DF:												
GRADO DE REZAGO SOCIAL:												
MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO							MUY BAJO	0103	
TIPO DE ZONA:		RURAL	URBANA							CLAVE AGE:		
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:										SI	X	NO
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL PAIS:										SI	X	NO
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:												
DIRECTA		INDIRECTA								COMPLEMENTARIA		X
PROYECTO ESPECIAL		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE		SI	NO	X						
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA												
LATITUD		0.00000000		LONGITUD		0.00000000						
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO												
PARTIDA	MONTO		%									
LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION POR I	2,317.45		0									
DEMOLICION DE PAVIMENTO, BANQUE	1,975.49		0									
EXCAVACION CON HERRAMIENTA MAN	25,909.62		0									
AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENI	6,323.53		0									
GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULI	58,201.99		0									
RELLENO COMPACTADO CON HERRAMI	2,132.19		0									
RELLENO COMPACTADO CON HERRAMI	9,009.31		0									
CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRO	8,956.39		0									
BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE PC-	47,315.15		0									
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTU	7,031.89		0									
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRALIMPIEZA	1,339.31		0									
LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION POR I	4,977.92		0									
APERTURA DE CAJA CON MAQUINARI	26,729.41		0									
CONFORMACION Y COMPACTACION DE	5,541.42		0									
CONSTRUCCION DE BASE COMPACTAD	57,276.48		0									
CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRO	31,919.24		0									
CIMBRA EN REGLAS Y FLONTERAS DE I	1,954.75		0									
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALL	30,776.14		0									
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULIC	315,286.27		0									
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARIL	3,928.12		0									
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARR	674,603.42		0									
FORMACION DE TABLEROS CON CORTI	2,053.37		0									
SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTI	4,658.07		0									
SUMINISTRO Y APLICACION DE CURAC	7,366.65		0									
MONTA AUTORIZADO:				782,548.46		C/IVA						
MONTA DEL PRESUPUESTO BASE:				782,548.46		C/IVA						
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:				EXISTE	NO EXISTE	X	NO APLICA	FECHA				
DEPENDENCIA QUE VALIDA:												
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:				EXISTE	NO EXISTE	X	NO APLICA	FECHA				
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:												
META PROGRAMADA:		760.00	UNIDAD:	M2	REAL:	760.00						
AVANCE FISICO:		PROGRAMADO:	30.00	REAL:	30.00							
TIPO DE LICITACION:				ADJUDICACION DIRECTA		EXISTE		FECHAS				
				INVITACION A MENOS 3 PERSONAS		X		15/02/2015				
				LICITACION PUBLICA								
NO. DE CONTRATO:				2016300340021								
MONTA CONTRATADO:				674,610.74		C/IVA						
PERIODO DE EJECUCIÓN:				PROGRAMADA		REAL						
				INICIO		04/04/2016		04/04/2016				
				TERMINO		30/06/2016						
				DIAS		118.00		0.30				
CONTRATISTA:				ERIK PEREZ ALVAREZ								
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:				PRECIOS UNITARIOS		X						
				PRECIO ALZADO								
				MIXTO								
				LLAVE EN MANO								
ANTICIPO:				APLICA		NO APLICA		X				
				MONTO:		PORCENTAJE						
FECHA DE PAGO:				ANTICIPO		CUMPLIMIENTO		VICIOS OCULTOS				
MONTA AFIANZADO:				67,461.07								
AFIANZADORA:				VE FIANZAS MONTERRE								
No. DE FIANZA:				1701054								
FECHA:				31/03/2016								
CONVENIO MODIFICATORIO:				EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA						
				MONTO								
				NO APLICA								
MONTA TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:				782,548.46		C/IVA						
GUSTAVO CASTILLO GARCIA				MANUEL ARTURO MARES ORDOÑEZ								
SUPERVISOR				DIRECTOR DE OBRAS								

FORMATO 11





H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO


EJERCICIO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:	23/05/2016
MES QUE SE REPORTA	MAYO

**DATOS GENERALES**

MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARÍA DEVEVA EN LA COL. FAJA DE ORO, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DE	No. DE OBRA:	2016300340019		

<b>ANTECEDENTES:</b>					
CUENTA CON PROYECTO EXECUTIVO:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>				
<b>OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:</b>					
<b>GRADO DE REZAGO SOCIAL:</b>					
MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	0160
<b>TIPO DE ZONA:</b>		RURAL	URBANA	CLAVE AGEB:	
<b>SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:</b>		SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	X	
<b>SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL FAIS:</b>		SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	X	
<b>TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:</b>		DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	X
<b>PROYECTO ESPECIAL</b>		<b>CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE</b>		SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COORDENADAS DE GEORREFERENCIA</b>					
LATITUD	0.00000000	LONGITUD	0.00000000		
<b>PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO</b>					
FARTIDA	MONTO	%			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TU	126,521.00	0			
SUMINISTRO Y FABRICACION DE	10,245.00	0			
CONSTRUCCION DE TRAGA TU	13,257.00	0			
RELLENO COMPACTADO CON PISON D	1,525.00	0			
EXCAVACION POR MEDIOS MECAN	3,596.00	0			
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO	120.00	0			
SUMINISTRO Y APLICACION DE	14,375.00	0			
"BANQUETA DE CONCRETO HECHO	77,829.00	0			
ACARREO EN CAMION IER. KI	573.00	0			
CARGA CON MAQUINA (CARGADOR FRI	141.00	0			
RELLENO COMPACTADO CON PISON D	2,587.00	0			
ELABORACION DE GUARNICION TI	125,708.00	0			
AFINE DE TALLUDES Y FONDO A MA	12,897.00	0			
EXCAVACION CON HERRAMIENTA E	9,129.00	0			
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO	2,595.72	0			
AVANCIOS ESPECTACULAR	1,833.00	0			
LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MA	7,230.00	0			
RENOVELACION DE POZO DE VISITA C	4,474.00	0			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE	4,453.00	0			
CORTE CON DISCO DE 3.18 CM. DE ES	1,841.00	0			
JUNTA DE DILATACION A BASE DE VAR	813,281.72	0			
PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO	275,200.00	0			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALL	25,694.00	0			
ACARREO EN CAMION IER. KI	2,753.00	0			

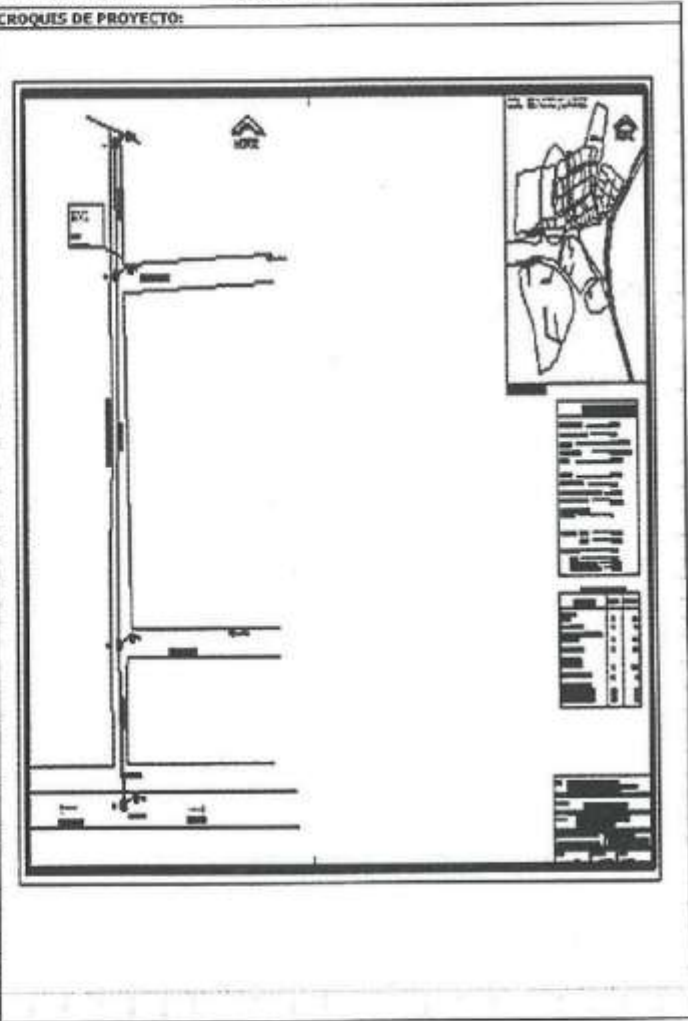

MONTO AUTORIZADO:	943,419.93	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	943,419.93	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	FECHA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	FECHA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		
META PROGRAMADA:	688.00	UNIDAD: M2 REAL: 688.00
AVANCE FISICO:	PROGRAMADO: 10.00	REAL: 10.00
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA	EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> FECHAS 28/03/2016
NO. DE CONTRATO:	2016300340019	
MONTO CONTRATADO:	813,293.04	C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	02/05/2016
	TERMINO	31/10/2016
	DÍAS	180.00
CONTRATISTA:	INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE OBRA S.A DE C.V.	
	PRECIOS UNITARIOS	X
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIO ALZADO	
	MIXTO	
ANTICIPO:	APLICA <input checked="" type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/>	
	MONTO: 283,025.97	PORCENTAJE 30.00
TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO
MONTO AFIANZADO:	283,025.97	81,329.30
AFIANZADORA:	ICE FIANZAS MONTERREY	
No. DE FRANZA:	1704574	1704284
FECHA:	29/04/2016	29/04/2016
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE <input type="checkbox"/> IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO	
	PLAZO	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	943,419.93	C/IVA

GUSTAVO CASTILLO GARCIA  
SUPERVISOR

MARILENA MARES ORDOÑEZ  
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11



