

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**

REUNIDOS EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA DIECISIETE DE MAYO DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER., SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DIA 19 DE JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO, REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DEL:

**H. AYUNTAMIENTO**

- C. L. E. F. CARLOS VICENTE REYES JUAREZ, - PRESIDENTE MUNICIPAL
- C. LIC. ZOHE GUERRERAZ VIVANCO, - SINDICO ÚNICO
- C. ING. ADALBERTO MARTINEZ JENKINS, - DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
- C. ALMA NELLY GRIMALDO GONZALEZ, - TESOERO MUNICIPAL
- C. LIC. DIONISIO PEREZ REYES, - CONTRALOR MUNICIPAL

**CONTRATISTA**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMERCIALIZADORA ECOLOGICA EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V.  
 CON DOMICILIO EN: CALLE REVOLUCION N°1 COLONIA CAMPO TRUDE MAYO MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.  
 R.F.C.: CEM170816720

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:

NO. DE OBRA:

**2018-30-034-1001**

**NOMBRE DE LA OBRA:**

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CON GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE FRONTERA Y 16 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER."

**DATOS DE LA OBRA**

NO. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO C/IVA:	FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:
FISM-DF / 2018 MCA2018-30034-1001.	\$2,515,734.82	01/MAYO/2018	31/JULIO/2018

**ESTIMACIONES:**


RELACION DE ESTIMACIONES	PERIODO DE ESTIMACION:	IMPORTE DE ESTIMACION C/IVA
ESTIMACION NO. 1 PARCIAL	01/05/2018 - 01/06/2018	\$ 649,589.55
ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO	02/06/2018 - 19/07/2018	\$ 1,858,614.20
TOTAL PAGADO:		\$ 2,508,203.75

Handwritten marks: 'C', 'X', and a signature.

Handwritten signature.

**TRABAJOS REALIZADOS**

1	1	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO CON GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE FRONTERA Y 16 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER."
1	<b>TRABAJOS PRELIMINARES.</b>	
2	M2	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLAO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ETRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.
2	<b>GUARNICIONES</b>	
CERRO-02	M3	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.000 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
CERRO-03	M3	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
CERRO-04	M3	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE: CARGA CON MAQUINA.
CERRO-05	M3/KM	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO.
CERRO-06	ML	ELABORACION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F.C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCION, INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CERRO-07	ML	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
CERRO-08	M2	ACARREO GENERAL DE LA OBRA CON AGOPIO Y LIMPIEZA GRUESA GENERAL.
3	<b>BANQUETAS</b>	
CERRO-09	M3	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II DEN 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
CERRO-10	M3	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
CERRO-11	M3	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE: CARGA CON MAQUINA.

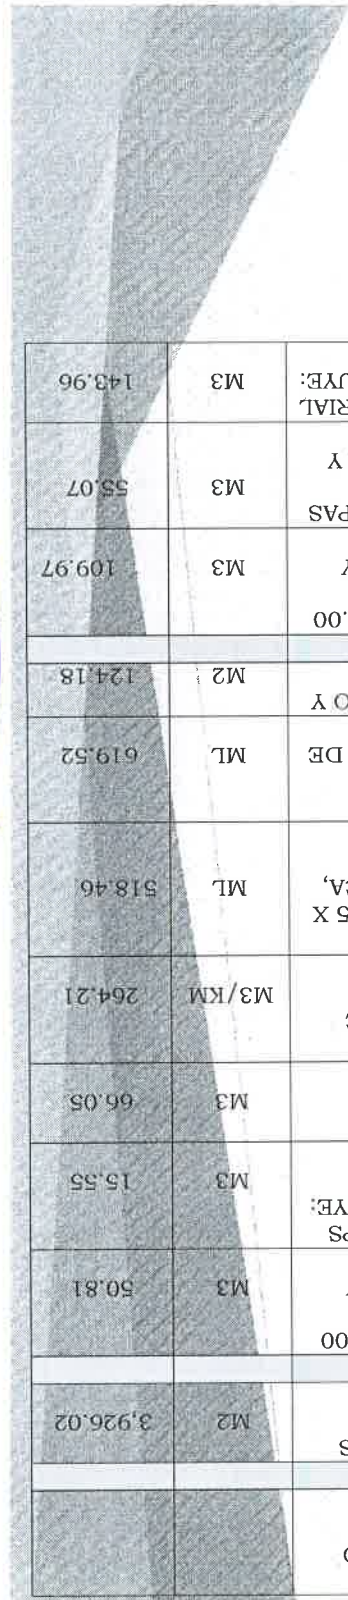

Handwritten signature and initials in blue ink at the top left of the page.

Handwritten marks and signatures in blue ink on the left side of the page, including an 'X' and a large signature.



**TRABAJOS REALIZADOS**

CERRO-12	M3/KM	571.84	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO
CERRO-13	M2	498.33	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F.C=150 KG/CM2, AGRAGADO MAXIMO DE ¼, DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO, ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESMBRADOMATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
CERRO-14	M2	508.90	LIMPIEZA GRUESA GENERAL DE LA OBRA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL.
4 TERRACERIA			
CERRO-15	M3	863.54	EXCAVACION EN CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE EN MATERIAL TIPO II, CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
CERRO-16	M2	2,878.47	NIVELACION CONFORMACION Y COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA PARA SU COMPACTACION.
CERRO-17	M2	2,878.47	BSE HIDRAULICA 70-30% (GRAVA 1 ½-CEMENTANTE) DE 20 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% DE SU PVS.M., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
CERRO-18	M3	1,122.60	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO, PRIMER KILOMETRO CARGA MANUL.
CERRO-19	M3/KM	4,490.41	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA.
5 PAVIMENTO			
CERRO-20	PZA	6.00	REINVELACION DE POZO DE VISITA TIPO 0.00 A 0.60 MTS. DE PZA, ALTURA A BASEW DE MUROS DE TABIQUE DE 30 CMS. UNTEADO CONORTERO, HERRAMIENTAS, MOORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: CEMENTO-ARENA 1:5 APLANADO CON MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, (P.U.O.T)
CERRO-21	M2	2,878.47	PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL DE 18 CM. DE ESPESOR VACIADO CON CARGA TILA Y BOTES, RESISTENCIA F.C=250 KG/CM2, AGRAGADO MAXIMO ¾.
CERRO-22	PZA	0.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA POLIETILENO (11GR0)

CV  
X  
X

*J. J. J.*

*J. J. J.*

*Handwritten signature in blue ink at the top left of the page.*

*Handwritten marks in blue ink, including a large 'X' and other scribbles.*

*Large handwritten signature in blue ink on the left side of the page.*

**COMERCIALIZADORA ECOLOGICA EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V.**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**C. CRESCENCIO VALDEZ TREJO**

**ENTREGA**  
**CONTRATISTA:**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE ASIENTA LO SIGUIENTE: SE ENTREGA POR PARTE DE LA EMPRESA **COMERCIALIZADORA ECOLOGICA EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V.** REPRESENTANTE LEGAL **C. CRESCENCIO VALDEZ TREJO** LA OBRA NO. **2018-30034-1001** RELATIVA A LA "CONTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CON GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE FRONTERA Y 16 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.", EN LA COLONIA DE DIECISIETE DE MAYO DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, AMPARADA CON EL CONTRATO NO.: **FISM-DE/2018MCA2018-30034-1001**, ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACION, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL H. AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS ONCE HORAS DEL DIA 19 DE JULIO DOS MIL DIECIOCHO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN DOS TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVIENEN EN ELA DAMOS FE.

CERRO-23	CORTE CON DISCO DE 6.35 CM. DE ESPESOR CON OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	1,240.80
CERRO-24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACION PARA CALAFATEO DE 10 MM. DE ANCHO Y 25 MM. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE JUNTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	1,240.80
CERRO-25	CONSTRUCCION DE TOPE VEHICULAR DE 9.00 X 1.50 X 0.06 METROS DE LARGO, ANCHO Y ALTO. RESPECTIVAMENTE, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE F.C=250 KG/CM2, INCLUYE: MANO DE OBRA, CIMBRA DE MADERA Y PINTURA PARA TRANSITO PESADO.	PZA	3.00
CERRO-26	LIMPIEZA GRUESA GENERAL DE LA OBRA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL	M2	2,895.74
CERRO-27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA POZO DE VISITA.	PZA	6.00
6	EXTRAORDINARIOS		



RECIBE

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

C. I. E. F. CARLOS VICENTERREYES  
JUAREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ADALBERTO MARTINEZ JENKINS  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
2018-2021



C. ZOHE GUTIERREZ VIVANCO  
SINDICO UNICO

C. P. ALMA NELLY GRIMALDO GONZALEZ  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA  
2018-2021



SINDICATURA  
2018-2021



CONTRALORIA MUNICIPAL  
2018-2021



CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. DIONISIO PEREZ REYES

*[Handwritten signature]*

X
