

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

REUNIDOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE: 30DPR2033W DE LA COLONIA LA PUERTA DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER., SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO, REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DEL:

H. AYUNTAMIENTO

- C. L.F.F. CARLOS VICENTE REYES JUAREZ, - PRESIDENTE MUNICIPAL
- C. LIC. ZOHE GUERRERZ VIVANCO, - SINDICO UNICO
- C. ING. ADALBERTO MARTINEZ JENKINS, - DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
- C. ALMA NELY GRIMALDO GONZALEZ, - TESOERO MUNICIPAL.
- C. LIC. DIONISIO PEREZ REYES, - CONTRATOR MUNICIPAL.

CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MARIA DE LOURDES ROA ROMERO
 CON DOMICILIO EN: CALLE MOCTEZUMA N°12 COLONIA BARRIO DE SANTA CRUZ
 MUNICIPIO DE PAPANTLA, VER.
 R.F.C.: RORL740503MY8

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:

NO. DE OBRA:

2018-30-034-1006

NOMBRE DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE: 30DPR2033W DE LA COLONIA LA PUERTA DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER."


DATOS DE LA OBRA

NO. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO C/IVA:	FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:
FISM-DF / 2018 MCA2018-30034-1006.	\$363,339.46	11/JULIO/2018	14/AGOSTO/2018

ESTIMACIONES:

RELACION DE ESTIMACIONES	PERIODO DE ESTIMACION:	IMPORTE DE ESTIMACION C/IVA
ESTIMACION NO. 1 PARCIAL	11/07/2018 - 03/08/2018	\$ 180,175.57
ESTIMACION NO. 2 PARCIAL	04/08/2018 - 09/08/2018	\$ 110,549.01
ESTIMACION NO. 3 FINQUITO	10/08/2018 - 14/08/2018	\$ 71,315.51
TOTAL PAGADO:		\$ 362,040.09

Carlos V. Reyes Reyes

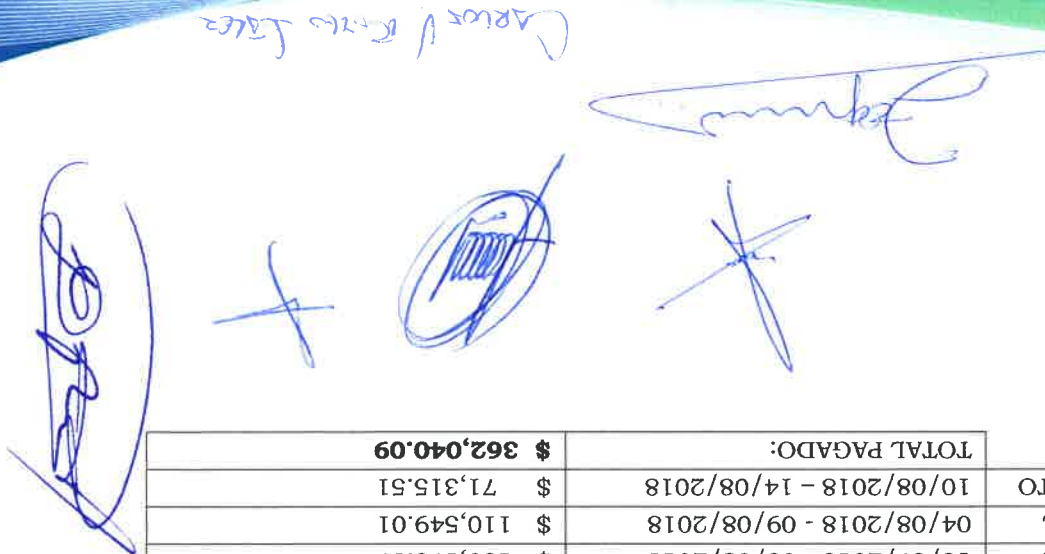

TRABAJOS REALIZADOS

		<p>"CONSTRUCCION DE BARRA PERMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE: 30DPR2033W DE LA COLONIA LA PUERTA DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER."</p>		
1	PRELIMINARES			
CERRO-01	M2	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.	74.40	
CERRO-02	M3	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	59.52	
CERRO-03	M3	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMION.	77.38	
CERRO-04	M3/KM	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO.	309.52	
CIMENTACION				
CERRO-05	ML	SUMINISTRO Y ELABORACION DE ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. DE 60 CM. DE ANCHO Y 20 CM. DE ALTURA, HABILITADO CON 65 KG. DE ACERO DE 1/2" X M3. DE CONCRETO, INCLUYE: PLANILLA DE 5 CM. DE ESPESOR CONCRETO F'C=100 KG/CM2., CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	93.00	
CERRO-06	ML	CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 15 X 60 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 8 VARILLAS DE 3/8" @ 30 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	93.00	
CERRO-07	PZA	ANCLAJE DE CASTILLO CON CONCRETO DE F'C= 150 KG/CM2 INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRADO, CON 4 VARILLAS DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 15 CM, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	40.00	
CERRO-08	M3	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA.	41.85	

Arriba el resto de la obra

Juan...

[Handwritten marks]




[Handwritten signature]

ALBANILERIA Y ACABADOS			
CERRO-09	ML	120	CASTILLO DE SECCION 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMUN 4 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
CERRO-10	M2	246.45	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 13 X 26 CM. DE 6 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, JUNTAS DE 1.5 CM. CON ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
CERRO-11	M	93	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 15 X 12 X 24 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMUN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
CERRO-12	M2	246.45	BARNAZ NATURAL (SUMINISTRO Y APLICACION A 2 MANOS) SOBRE SUPERFICIES LA PARED DE TABIQUE DE BARRO ACABADO APARENTE.
CERRO-13	M2	74.4	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE: ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE ASIENTA LO SIGUIENTE: SE ENTREGA POR PARTE DE LA EMPRESA **MARIA DE LOURDES ROA ROMERO** REPRESENTANTE LEGAL C. MARIA DE LOURDES ROA ROMERO LA OBRA NO. **2018-30034-1006** RELATIVA A LA "CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE: 30DPR2033W DE LA COLONIA LA PUERTA DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER", AMPARADA CON EL CONTRATO NO.: **FISM-DF/2018MCA2018-30034-1006**. ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACION, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL H. AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS TRECE HORAS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN DOS TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA DAMOS FE.

Cerro Azul







CONTRATISTA:

ENTREGA

MARIA DE LOURDES ROA ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL
C. MARIA DE LOURDES ROA ROMERO



RECIBE

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.:



PRESIDENCIA
2018-2021

Carlos L. F. Reyes
C. L.F.F. CARLOS VICENTE REYES
JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL




ING. ADALBERTO MARTINEZ JENKINS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2018-2021



C.P. ALMA NELY GRIMALDO GONZALEZ
TESORERIA
2018-2021



C. ZOHE GUTIERREZ VIVANCO
SINDICO UNICO



CONTRALOR MUNICIPAL.

LIC. DIONISIO PEREZ REYES.

