



LXIII LEGISLATURA

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

28 JUL 2016

2013
2016

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y REVISIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA, REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

INFORMACIÓN DE OBRA PÚBLICA
MUNICIPIOS Y ENTIDADES PARAMUNICIPALES
OPERADORAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA

Con fundamento en los Artículos 14, 15, 17 y 18, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; Artículos 37, párrafo primero y cuarto, y 39, párrafo segundo de la Ley de Procedimientos de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Artículos 73 Bis y 73 Ter, de la Ley Orgánica del Municipio Libre; Artículos 14, 15, 17 y 18, de la Ley de Obras Públicas del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demás disposiciones legales aplicables, se recibe este documento con reserva de ley, no implica la validación de la información.

ESTADO DE OBRA PÚBLICA MENSUAL
CORRESPONDIENTE A:

Municipio: **CERRO AZUL**
Mes de Ejercicio: **JUNIO 16**

Acta N° 53 Fecha en que se presenta al Cabildo para su remisión al Congreso: 22/JUL/16
Acta de sesión de Cabildo aprobando su remisión: Unanimidad SI Mayoría NO Voto de Calidad NO Certificada NO

Oficio de Remisión	RECURSOS FISCALES	RECURSOS FEDERALES					
		FISM		FORTAMUN		Otras Fuentes de Financiamiento*	
Anexo Relación y Total de Obras	Entrega Obras	Entrega Obras	Entrega Obras	Entrega Obras	Entrega Obras	Entrega Obras	
Informe de Obra de Administración Directa	NO 0	NO 0	NO 0	NO 0	NO 0	NO 0	
Informe de Obra por Contrato	NO 0	SI 10	SI 3	NO 0	NO 0	NO 0	
Reporte Fotográfico	NO 0	SI 10	SI 3	NO 0	NO 0	NO 0	

Para la identificación de las obras consultar el Clasificador por Fuente de Financiamiento emitido por el CONAC

Oficio de Remisión	RECURSOS FISCALES	RECURSOS FEDERALES		
		FISM	FORTAMUN	Otras Fuentes de Financiamiento (Describir cuales)
Propuesta General de Inversión		NO	NO	SI SUBSIDIO E.
Modificaciones Presupuestales	NO	NO	NO	NO
Reporte Trimestral de avances físico-financieros	NO	NO	NO	SI
Correspondiente al:	NO	NO	NO	1ER/2DO
Cierre de Obras y Acciones del Ejercicio	NO	NO	NO	NO

Observaciones:

Revisa
[Signature]
LIC. ERINA MENDOZA PLACIER
Analista Administrativo

Recibe
[Signature]
RODRIGO ANTONIO MARTA
SANCHEZ AUX. ADMINISTRATIVO

L.E. Jorge Penichet Villegas
Jefe del Departamento de Capacitación, Asesoría,
Revisión y Supervisión a Municipios



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2016/CERRO AZUL/11599

C. Ludyvina Ramírez Ahumada
CERRO AZUL
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/07/2016
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/07/2016
Reporte:	Reporte Mensual de Estados de Obra
Periodo:	JUNIO
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Gustavo Castillo García
Observaciones:	

Cadena original:

FV07Gf46nJ2ZObVyRFU4HRVnMKF1Lgq2wH4WI/usqiB7bUn5UYwq0LqwS54s9Pju7t+7IXGocudgEp7LEY/
Az9HhwMTWQd6irXNpluMWXpBYzfMUMVyn2w2FIMINSEofltqL1E2IBL0+Sz/
rKDesWU5Q+ogETWWczia7/clIZyU=

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CERRO AZUL, VER
2014 - 2017



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
SECCION: SECRETARIA
OFICIO N°. 241/2016
EXPEDIENTE:
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

DIP. OCTAVIA ORTEGA ARTEAGA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LXIII LEGISLATURA DEL EDO. VERACRUZ
XALAPA, VER.

PRESENTE:



EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CERRO AZUL, VERACRUZ, ME
HONRO EN PRESIDIR, ASISTIDO DE SECRETARIO, QUE ACTUA EN LEGAL FORMA POR ESTE
MEDIO TIENE A BIEN DIRIGIRSE A USTED, CON EL PROPOSITO DE HACERLE LLEGAR A ESA
LEGISLATURA DEL ESTADO QUE DIGNAMENTE PRESIDE, EL ACTA DE CABILDO No. 53 DE FECHA
22 DE JULIO DEL 2016, CORRESPONDIENTE AL SIGUIENTE ACUERDO:

- ACUERDO Y APROBACIÓN DE LOS FORMATOS 09 Y 11 DEL REPORTE MENSUAL DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE JUNIO DEL 2016 (FISM)

SIN OTRO PARTICULAR, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL
Y AFECTUOSO SALUDO.

ATENTAMENTE

CERRO AZUL, VER., 22 DE JULIO DEL 2016

LIC. LUDYVINA RAMIREZ AHUMADA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



LIC. GONZALO JAVIER BLANCO MIRELES
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARIA
2014-2017





ACTA NÚMERO 53

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CERRO AZUL, VER.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, 28, 29, 30, 32 y 36 FRACCIÓN I, III, XIV, XV, XVIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE, VIGENTE EN EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, QUE NOS RIGE SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO BAJO EL SIGUIENTE TEXTO

EN LA CIUDAD DE CERRO AZUL, VERACRUZ; SIENDO LAS DIECISEIS HORAS DEL DÍA 22 DE JULIO DEL 2016, PREVIAMENTE CITADOS LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO QUE SE MENCIONAN MÁS ADELANTE, SE REÚNEN PARA LLEVAR A CABO SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, LA CUAL ES PRESIDIDA POR LA CIUDADANA LIC. LUDYVINA RAMÍREZ AHUMADA, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; POR LO QUE EN USO DE LA PALABRA DECLARA: SE ABRE LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO EN EL SIGUIENTE:



ORDEN DEL DÍA:

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA
- 2.- DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DE QUÓRUM.
- 3.- ACUERDO Y APROBACIÓN DE LOS FORMATOS 09 Y 11 DEL REPORTE MENSUAL DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE JUNIO DEL 2016 (FISM)
- 4.- ASUNTOS GENERALES
- 5.- CLAUSURA

UNA VEZ ESCUCHADO EL ORDEN DEL DÍA SE SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DEL CABILDO Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTACIÓN. A CONTINUACIÓN SE PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE ASISTENCIA, ESTANDO "PRESENTE" LOS CIUDADANOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

- C. LIC. LUDYVINA RAMÍREZ AHUMADA, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.
- C. HÉCTOR BAUTISTA VILLEGAS. SÍNDICO ÚNICO.
- C. PROF. JESÚS AGUILERA HERNÁNDEZ, REGIDOR PRIMERO.
- C. GUILLERMO GUADALUPE SEGURA DEL ANGEL. REGIDOR SEGUNDO.
- C. LIC. RICARDO ROBLES RÍOS. REGIDOR TERCERO
- C. TOMÁS MELO SANTIAGO, REGIDOR CUARTO.
- C. PROF. ROGELIO HERNANDEZ ANDRADE. REGIDOR QUINTO.



PRESIDENCIA
2014-2017



REGIDURIA 3ª
2014-2017



REGIDURIA 4ª
2014-2017



SINDICATURA
2014-2017



SECRETARÍA
2014-2017



UNA VEZ PUESTA A CONSIDERACIÓN LA PROPUESTA DE LA ORDEN DEL DÍA Y APROBADA POR UNANIMIDAD SE PROCEDIÓ EL DESAHOGO DE LA MISMA, Y AGOTADOS LOS PUNTOS 1 Y 2, SE PASA AL PUNTO No. 3.

3.- ACUERDO Y APROBACIÓN DE LOS FORMATOS 09 Y 11 DEL REPORTE MENSUAL DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE JUNIO DEL 2016 (FISM).

EN USO DE LA VOZ EL C. ING. MANUEL ARTURO MARES ORDOÑEZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL, INFORMA LO SIGUIENTE: QUE EN ESTE MES SE REPORTA LA OBRA DE LOS FORMATOS 09 Y 011 DEL FISM, QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

RELACIÓN DE AVANCE DE OBRA DEL MES DE JUNIO DEL FISM		
2016300341001	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS COLONIAS: LA CURVA, LA CEIBA, 17 DE AMYO Y LOMAS VERDES EN EL MUNICIPIO ED CERRO AZUL, VER	TRABAJO EN PROCESO
2016300341002	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS: MIRADOR, VICENTE GUERRERO, LA CURVA, Y MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	TRABAJO EN PROCESO
2016300341004	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LAS COLONIAS: LA CEIBA, LOMAS VERDES, TERESA MORALES Y EX BRECHA EL AGUILA EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	TRABAJO EN PROCESO
2016300341006	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LAS COLONIAS: 7 DE OCTUBRE, VICENTE GUERRERO, CERRO AZUL VIEJO, CARDENAS, BENITO JUAREZ Y LA CEIBA, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER	TRABAJO EN PROCESO
2016300341007	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS COLONIAS: VICENTE GUERRERO, AGUILERA, FAJA DE ORO, CARDENAS Y TERESA MORALES, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	TRABAJO EN PROCESO
2016300341009	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS DE LA COLONIA AGUILERA, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	TRABAJO EN PROCESO
2016300341010	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA HENRY FORD, DE LA COLONIA LA CEIBA, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	TRABAJO EN PROCESO
2016300341011	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA, DE LA COLONIA MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	TRABAJO EN PROCESO
2016300341013	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE JUAN FGELIPE, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	TRABAJO EN PROCESO
2016300341014	SUPERVISON DE OBRA	TRABAJO EN PROCESO
2016300341015	REHABILITADO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA	TRABAJO EN PROCESO





	LAZARO CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER	
2016300341017	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE HERIBERTO BERRONES DE LA COLONIA VALLE VERDE, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	TRABAJOS EN PROCESO
2016300341018	AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ	TRABAJOS EN PROCESO

LOS C. EDILES PLANTEAN AL C. DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DIVERSAS PREGUNTAS Y COMENTARIOS, OBTENIENDO RESPUESTA SATISFACTORIA.

PUESTA A CONSIDERACIÓN DEL CABILDO Y APROBADA SE ACUERDA: ÚNICO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL REPORTE PRESENTADO POR EL C. TITULAR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL, RELATIVO A LOS FORMATOS 09 Y 11 DEL REPORTE MENSUAL DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 (FISM), DONDE SE REPORTA LA OBRA YA MENCIONADA QUE SE ESTA REALIZANDO EN ESTE MUNICIPIO; ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN PARA REMITIR AL ORFIS Y AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ.- APROBADO POR UNANIMIDAD.- CÚMPLASE.-

UNA VEZ DESAHOAGADO EL PUNTO ANTERIOR SE PROCEDE A PASAR AL RUBRO DE ASUNTOS GENERALES, CONTEMPLADO EN EL PUNTO No. 4 DEL ORDEN DEL DIA. EN USO DE LA VOZ EL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC. GONZALO JAVIER BLANCO MIRELES, MANIFIESTA QUE NO EXISTIENDO ASUNTO A TRATAR EN EL PUNTO No. 4 DE ASUNTOS GENERALES Y AGOTADO EL ORDEN DEL DIA SIENDO PROCEDENTE PASAR AL PUNTO No. 5.- RELATIVO A LA CLAUSURA.- ENSEGUIDA LA C. LIC. LUDYVINA RAMÍREZ AHUMADA, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, EN USO DE LA VOZ DECLARA: NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS DIECISIETE HORAS, DEL DÍA DE SU FECHA.-LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA QUE FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS CIUDADANOS FUNCIONARIOS QUE EN ELLA INTERVINIERON ANTE EL C. SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FÉ.-



LIC. LUDYVINA RAMÍREZ AHUMADA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL






SINDICATURA
2014-2017
C. HÉCTOR BAUTISTA VILLEGAS
SINDICO ENRICO


PROFR. JESÚS AGUILERA HERRANDEZ
REGIDOR PRIMERO
REGIDURIA 2ª
2014-2017

C. GUILLERMO GUADALUPE SEGURA DEL ANGEL
REGIDOR SEGUNDO


LIC. RICARDO ROBLES RIVERA
REGIDOR TERCERO
REGIDURIA 3ª
2014-2017


REGIDURIA 4ª
2014-2017
C. TOMÁS MELO SANTIAGO
REGIDOR CUARTO

PROFR. ROGELIO HERNÁNDEZ ANDRADE
REGIDOR QUINTO


LIC. GONZALO JAVIER BLANCO MIRELES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
2014-2017



**Sistema de Información Municipal de Veracruz
SIMVER**

Recibo No. EMO/2016/CERRO AZUL/11598

**C. Ludyvina Ramírez Ahumada
CERRO AZUL
PRESENTE.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN



Fecha de recepción de documentación:	25/07/2016
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/07/2016
Reporte:	Reporte Mensual de Estados de Obra
Periodo:	JUNIO
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Gustavo Castillo García
Observaciones:	

Cadena original:

NcgvrYGU7itWoFkk4e0Clo9xd5F02EFd2tBRrUmyuEi3aYOJxMqINqI1NbuoJNDv9qJBFcmo3vrChzoKPD4gW2bDVbL4B+1N8Z3ovw84+C5HDlBxDuWZgG8+UijuqTW01ub/KVs9Yge4ny+zwYzCqWn7DAEUqVS6gJgVwoLEcXU=

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



ACTA NÚMERO 52

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CERRO AZUL, VER.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, 28, 29, 30, 32 y 36 FRACCIÓN I, III, XIV, XV, XVIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE, VIGENTE EN EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, QUE NOS RIGE SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO BAJO EL SIGUIENTE TEXTO

EN LA CIUDAD DE CERRO AZUL, VERACRUZ; SIENDO LAS 14:00 PM HORAS DEL DÍA 22 DE JULIO DEL 2016, PREVIAMENTE CITADOS LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO QUE SE MENCIONAN MÁS ADELANTE, SE REÚNEN PARA LLEVAR A CABO SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, LA CUAL ES PRESIDIDA POR LA CIUDADANA LIC. LUDYVINA RAMÍREZ AHUMADA, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; POR LO QUE EN USO DE LA PALABRA DECLARA: SE ABRE LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA
- 2.- DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DE QUÓRUM.
- 3.- ACUERDO Y APROBACIÓN DE LOS FORMATOS 09 Y 11 DEL REPORTE MENSUAL DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE JUNIO DEL 2016 (FAFM)
- 4.- ASUNTOS GENERALES
- 5.- CLAUSURA

UNA VEZ ESCUCHADO EL ORDEN DEL DÍA SE SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DEL CABILDO Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTACIÓN. A CONTINUACIÓN SE PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE ASISTENCIA, ESTANDO "PRESENTE" LOS CIUDADANOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

LIC. LUDYVINA RAMÍREZ AHUMADA, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

HÉCTOR BAUTISTA VILLEGAS. SÍNDICO ÚNICO.

PROFR. JESÚS AGUILERA HERNÁNDEZ, REGIDOR PRIMERO.

C. GUILLERMO GUADALUPE SEGURA DEL ANGEL. REGIDOR SEGUNDO.

C. LIC. RICARDO ROBLES RÍOS. REGIDOR TERCERO

C. TOMÁS MELO SANTIAGO, REGIDOR CUARTO.

C. PROFR. ROGELIO HERNANDEZ ANDRADÉ. REGIDOR QUINTO.



REGIDURÍA
2014-2017



PRESIDENTA
2014-2017



SINDICATURA
2014-2017



UNA VEZ PUESTA A CONSIDERACIÓN LA PROPUESTA DE LA ORDEN DEL DÍA Y APROBADA POR UNANIMIDAD SE PROCEDIÓ EL DESAHOGO DE LA MISMA, Y AGOTADOS LOS PUNTOS 1 Y 2, SE PASA AL PUNTO No. 3.

3.- ACUERDO Y APROBACIÓN DE LOS FORMATOS 09 Y 11 DEL REPORTE MENSUAL DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE JUNIO DEL 2016 (FAFM).

EN USO DE LA VOZ EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. MANUEL ARTURO MARES ORDOÑEZ, INFORMA LO SIGUIENTE: QUE EN ESTE MES SE REPORTA LA OBRA DE LOS FORMATOS 09 Y 011 DEL MES DE JUNIO DE LAS OBRAS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL MUNICIPIO, LA CUAL SE MENCIONA A CONTINUACION.

RELACIÓN DE AVANCE DE OBRA DEL MES DE JUNIO DEL FAFM		
2016300341019	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARIA DIVINA EN LA COL. FAJA DE ORO, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	TRABAJOS EN PROCESO
2016300341022	REHABILITACION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	TRABAJOS TERMINADOS FISICAMENTE MAS NO FINANCIERAMENTE

LOS C. EDILES PLANTEAN A LA C. ING. MANUEL ARTURO MARES ORDOÑEZ DIVERSAS PREGUNTAS Y COMENTARIOS, OBTENIENDO RESPUESTA SATISFACTORIA.

PUESTA A CONSIDERACIÓN DEL CABILDO Y APROBADA SE ACUERDA: ÚNICO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL REPORTE PRESENTADO POR EL ING. MANUEL ARTURO MARES ORDOÑEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RELATIVO A LOS FORMATOS 09 Y 11 DEL REPORTE MENSUAL DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 (FAFM), DONDE REPORTA LAS OBRAS YA MENCIONADAS QUE SE ESTAN REALIZANDO DEL 2016; ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN PARA REMITIR AL ORFIS Y AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ.- APROBADO POR UNANIMIDAD.-CÚMPLASE.-

EN USO DE LA VOZ EL C. GONZALO JAVIER BLANCO MIRELES SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, MANIFIESTA QUE NO EXISTIENDO ASUNTO A TRATAR Y AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA. SIENDO PROCEDENTE PASAR AL PUNTO No. 4.-RELATIVO A LA CLAUSURA.- ENSEGUIDA LA C. LIC. LUDVINA RAMÍREZ AHUMADA, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, EN USO DE LA VOZ DECLARA: NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS QUINCE HORAS, DEL DÍA DE SU FECHA.-LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA QUE FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS CIUDADANOS FUNCIONARIOS QUE EN ELLA INTERVINIERON ANTE EL SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FÉ.-





LIC. LUDYVINA RAMÍREZ AHUMADA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA
2014-2017



SINDICATURA
2014-2017

C. HÉCTOR BACHISTA VILLEGAS
SINDICO UNICO



PROFR. JESÚS AGUILERA
REGIDURIA 1ª
REGIDOR PRIMERO 2014-2017

C. GUILLERMO GUADALUPE SEGURA DEL ANGEL
REGIDOR SEGUNDO

LIC. RICARDO ROBLES RIOS
REGIDOR TERCERO
REGIDURIA 3ª
2014-2017



C. TOMAS MELO SANTIAGO
REGIDURIA 4ª
REGIDOR CUARTO 2014-2017

PROFR. ROGELIO HERNÁNDEZ ANDRADE
REGIDOR QUINTO

LIC. GONZALO JAVIER BLANCO MIRELES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
2014-2017



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
SECCION: SECRETARIA
OFICIO N°. 239/2016
EXPEDIENTE:
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

DIP. OCTAVIA ORTEGA ARTEAGA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LXIII LEGISLATURA DEL EDO. VERACRUZ
XALAPA, VER.

PRESENTE:

EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CERRO AZUL, VERACRUZ, QUE ME HONRO EN PRESIDIR, ASISTIDO DE SECRETARIO, QUE ACTUA EN LEGAL FORMA, POR ÉSTE MEDIO TIENE A BIEN DIRIGIRSE A USTED, CON EL PROPOSITO DE HACERLE LLEGAR A ESA LEGISLATURA DEL ESTADO QUE DIGNAMENTE PRESIDE, EL ACTA DE CABILDO No. 52 DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2016, CORRESPONDIENTE AL SIGUIENTE ACUERDO:

- ACUERDO Y APROBACIÓN DE LOS FORMATOS 09 Y 11 DEL REPORTE MENSUAL DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE JUNIO DEL 2016 (FAFM)

SIN OTRO PARTICULAR, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.

ATENTAMENTE

CERRO AZUL, VER., 22 DE JULIO DEL 2016

LIC. LUDYVINA RAMIREZ AHUMADA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA
2014-2017

LIC. GONZALO JAVIER BLANCO MIRELES
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ
PERIODO 2014-2017



FISM

JUNIO 2016

FORMATOS 09 Y 011

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:	24/07/2016
MES QUE SE REPORTA	JUNIO

DATOS GENERALES																																																					
MUNICIPIO:	CERRO AZUL			LOCALIDAD:	CERRO AZUL			DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE HERBERTO BERRONES DE LA COLONIA VELLE BERDE, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.																																												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	LA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEM			No. DE OBRA:	2016300341017																																																
ANTECEDENTES:				CRÓQUIS DE PROYECTO:																																																	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>										MONTO AUTORIZADO: 293,626.87 C/VA																																											
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:										MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: 293,626.87 C/VA																																											
GRADO DE REZAGO SOCIAL:										VALIDACIÓN DEL PROYECTO: EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>																																											
TIPO DE ZONA: RURAL <input type="checkbox"/> URBANA <input type="checkbox"/> CLAVE AGEB:										DEPENDENCIA QUE VALIDA:																																											
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>										FECHA:																																											
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL PAIS: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>										FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>																																											
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: DIRECTA <input type="checkbox"/> INDIRECTA <input type="checkbox"/> COMPLEMENTARIA <input checked="" type="checkbox"/>										DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:																																											
PROYECTO ESPECIAL <input type="checkbox"/> CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>										META PROGRAMADA: 400.00 UNIDAD: ML REAL: 400.00																																											
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA:										AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 25.00 REAL: 25.00																																											
LATITUD: 0.09000000 LONGITUD: 0.00000000										TIPO DE LICITACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/> INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS <input checked="" type="checkbox"/> LICITACIÓN PÚBLICA <input type="checkbox"/>																																											
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO				NO. DE CONTRATO: 2016300341017																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARTIDA</th> <th>MONTO</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MANO</td><td>3,675.40</td><td>0</td></tr> <tr><td>SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA</td><td>12,192.00</td><td>0</td></tr> <tr><td>BANQUETA DE CONCRETO HECHO</td><td>91,840.00</td><td>0</td></tr> <tr><td>ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRA</td><td>93,428.00</td><td>0</td></tr> <tr><td>LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PER</td><td>5,588.12</td><td>0</td></tr> <tr><td>TRABE EN ESTRUCTURA INCLUYE</td><td>4,061.58</td><td>0</td></tr> <tr><td>TRABE EN ESTRUCTURA INCLUYE</td><td>11,265.25</td><td>0</td></tr> <tr><td>COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCION</td><td>7,374.05</td><td>0</td></tr> <tr><td>SUMINISTRO Y ELABORACIÓN C</td><td>4,423.36</td><td>0</td></tr> <tr><td>ZAPATA DE CIMENTACIÓN AISLADA INK</td><td>1,552.44</td><td>0</td></tr> <tr><td>PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CON</td><td>494.16</td><td>0</td></tr> <tr><td>RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PROC</td><td>10,636.81</td><td>0</td></tr> <tr><td>EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIA</td><td>3,489.87</td><td>0</td></tr> <tr><td>TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO F</td><td>3,100.40</td><td>0</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>253,121.44</td><td></td></tr> </tbody> </table>				PARTIDA	MONTO	%	LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MANO	3,675.40	0	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	12,192.00	0	BANQUETA DE CONCRETO HECHO	91,840.00	0	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRA	93,428.00	0	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PER	5,588.12	0	TRABE EN ESTRUCTURA INCLUYE	4,061.58	0	TRABE EN ESTRUCTURA INCLUYE	11,265.25	0	COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCION	7,374.05	0	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN C	4,423.36	0	ZAPATA DE CIMENTACIÓN AISLADA INK	1,552.44	0	PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CON	494.16	0	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PROC	10,636.81	0	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIA	3,489.87	0	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO F	3,100.40	0	TOTAL	253,121.44		MONTO CONTRATADO: 253,121.44 C/VA	
PARTIDA	MONTO	%																																																			
LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MANO	3,675.40	0																																																			
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	12,192.00	0																																																			
BANQUETA DE CONCRETO HECHO	91,840.00	0																																																			
ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRA	93,428.00	0																																																			
LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PER	5,588.12	0																																																			
TRABE EN ESTRUCTURA INCLUYE	4,061.58	0																																																			
TRABE EN ESTRUCTURA INCLUYE	11,265.25	0																																																			
COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCION	7,374.05	0																																																			
SUMINISTRO Y ELABORACIÓN C	4,423.36	0																																																			
ZAPATA DE CIMENTACIÓN AISLADA INK	1,552.44	0																																																			
PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CON	494.16	0																																																			
RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PROC	10,636.81	0																																																			
EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIA	3,489.87	0																																																			
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO F	3,100.40	0																																																			
TOTAL	253,121.44																																																				
				PERIODO DE EJECUCIÓN:																																																	
				INICIO: 02/05/2016 REAL: 02/05/2015																																																	
				TÉRMINO: 31/10/2016																																																	
				DÍAS: 180.00 0.00																																																	
				CONTRATISTA: DE LA CRUZ MARQUEZ ADOUFO																																																	
				MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:																																																	
				FRECIOS UNITARIOS <input checked="" type="checkbox"/>																																																	
				PRECIO ALZADO <input type="checkbox"/>																																																	
				RÉBITO <input type="checkbox"/>																																																	
				LLAVE EN MANO <input type="checkbox"/>																																																	
				APLICAR <input type="checkbox"/> NO APLICAR <input checked="" type="checkbox"/>																																																	
				ANTECIPO: MONTO: PORCENTAJE:																																																	
				TIPO DE FIANZA: ANTECIPO CUMPLIMIENTO VICIOS COLTOS																																																	
				MONTO AFIANZADO: 25,312.14																																																	
				AFIANZADORA: DORAMA																																																	
				No. DE FIANZA: 645149																																																	
				FECHA: 02/05/2016																																																	
				CONVENIO MODIFICATORIO: MONTO PLAZO APLICA																																																	
				EXISTE IMPORTE/PERIODO FECHA																																																	
				MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: 293,626.87 C/VA																																																	

GUSTAVO BARTOLÓMEZ
SUPERVISOR

MARIA NAYELI ORDÓÑEZ
DIRECTORA DE OBRAS
FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:
24/07/2016
MES QUE SE REPORTA
JUNIO

DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	LA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEM	No. DE OBRA:	201600341017
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE GUARRIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE HERIBERTO BERRONES DE LA COLONIA VELLE VERDE, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	

PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS POR ESTIMACIÓN										
No. EST.	PARTIDA	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
			No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR.	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE
01 PARCIA	"LIMPIEZA DE TERRENO PLAT	1,102.00								
	SUMINISTRO Y APLICACION DE	3,657.00								
	"BANQUETA DE CONCRETO	27,552.00								
	"ELABORACIÓN DE GUARINIS	28,028.00								
	RELLENO EN CEPAS CON MATE	3,098.00								
	EXCAVACION A MANO EN CEPAS	854.00								
	"TRAZO Y NIVELACIÓN DE T	930.00								
TOTAL		65,261.00	TOTAL		0.00	TOTAL		0.00	0.00	0.00

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO (EJERCIDO) EN EL MES:	0.00	
MONTO PAGADO (EJERCIDO) ACUMULADO:	0.00	
No. NOTA DE BITÁCORAS A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:		
PRUEBAS DE LABORATORIO:		
FINDUQUITO:	0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCION:		

AVANCE FISICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIAS DE ATRASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES:
TRABAJOS EN PROCESO

GUSTAVO CASTELAR GARCIA
SUPERVISOR

YANEX A. MARRERO OCHOA
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL
 No. de obra: 2016300341017

Localidad: CERRO AZUL
 Periodo: JUNIO

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2016
 Número de estimación:

Descripción: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE HERIBERTO BERRONES DE LA COLONIA VELLE BERDE, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Fuente de Financiamiento:
 Fecha de revisión: 25/07/2016



FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:

fabricacion de guarnicion y relleno por medios mecanicos para recibir banquetas

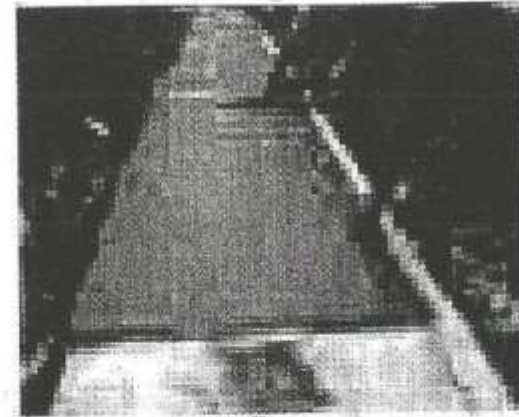


FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:

fabricacion de banquetas de concreto de 10 cms de espesor

Obervaciones:

trabajos en proceso

gustavo castillo garcia
 supervisor
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis


H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSIAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:	23/05/2016
MES QUE SE REPORTA	JUNO

DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	LA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEM	No. de OBRA:	2016300341018
		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL VERACRUZ

ANTECEDENTES:		
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI NO X	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		
GRADO DE REZAGO SOCIAL:		
MUY ALTO	ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO 0715	
TIPO DE ZONA:		
RURAL	URBANA	
CLAVE AGES:		
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI X NO	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL FAIS:	SI X NO	
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:		
DIRECTA	INDIRECTA COMPLEMENTARIA	
X		
PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	
	SI NO X	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		
LATITUD 21.198153000	LONGITUD 97.745497000	
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO		
PARTIDA	MONTO	%
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA	6,494.53	0
IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA A BASE	66,273.12	0
PIRETEL DE 30 CM DE ALTURA A BASE DE	92,981.25	0
APLANADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA	201,796.93	0
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA	77,865.00	0
SALIDA DE CONTACTO Y APAGADOR CON	23,557.00	0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIBITAN	78,909.00	0
FIRME DE 19 CM. DE ESPESOR ACABADO	195,673.44	0
LOSA DE CONCRETO PC-250 KG/CM ² , D	543,252.42	0
CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN	157,302.26	0
MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM EN 12	351,843.67	0
CASTILLO DE SECCIÓN 15X15 CM, CONC	78,495.23	0
SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE DADO	153,634.00	0
CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CMS	98,832.00	0
ZAPATA DE 1.00X1.00 DE CONCRETO ARM	142,600.00	0
EXCAVACIÓN PARA CADENAS DE CONCRE	34,295.40	0
LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERE	9,844.75	0
TOTAL	2,313,730.00	

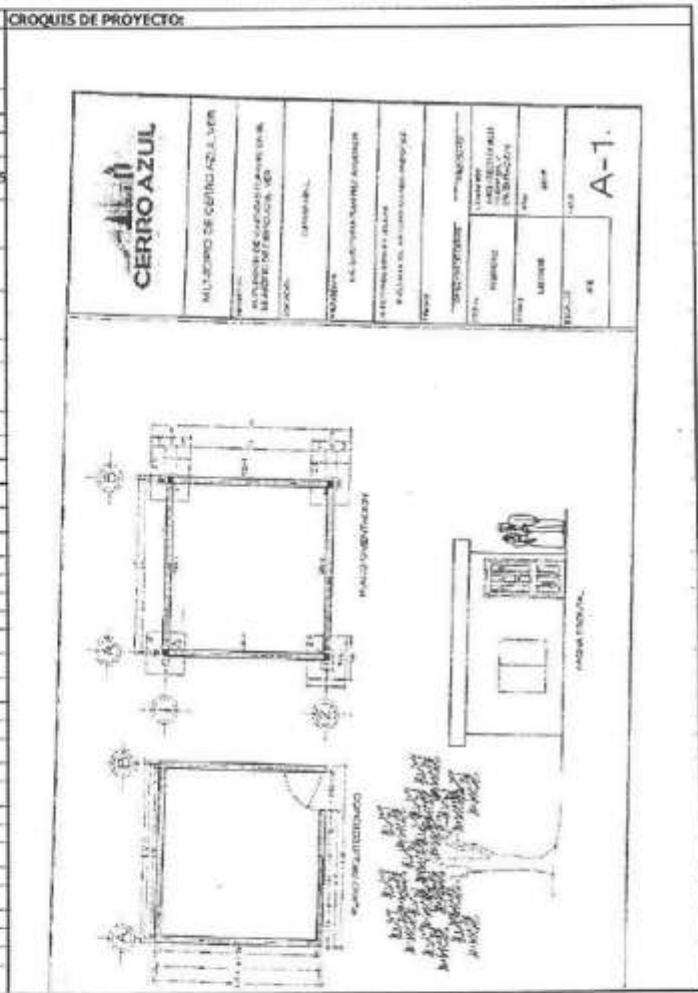

MONTA AUTORIZADO:	2,683,950.00	CIVA
MONTA DEL PRESUPUESTO BASE:	2,683,950.00	CIVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	FECHA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	FECHA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		
META PROGRAMADA:	87.00	UNIDAD: VIVIENDA REAL: 87.00
AVANCE FÍSICO:	PROGRAMADO: 45.00	REAL: 45.00
		EXISTE FECHA
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X 15/03/2016
	LICITACIÓN PÚBLICA	
NO. DE CONTRATO:	2016300341018	
MONTA CONTRATADO:	2,313,730.00	CIVA
	PROGRAMADA	REAL
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO 04/04/2016	04/04/2016
	TÉRMINO 31/05/2016	31/05/2016
	DÍAS 58.00	0.00
CONTRATISTA:	LARATHOM S.A. DE C.V.	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIOS UNITARIOS	X
	PRECIO ALZADO	
	MIXTO	
	LLAVE EN MANO	
ANTICIPO:	APLICA X NO APLICA	
	MONTO: 536,790.00	PORCENTAJE 30.00
	FECHA DE PAGO: 05/05/2016	
TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO
MONTA AFIANZADO:	536,790.00	231,375.00
AFIANZADORA:	ASERTA	ASERTA
No. DE FIANZA:	3136-08130-5	3136-08131-8
FECHA:	04/04/2016	04/04/2016
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
	MONTO	FECHA
	PLAZO	
	NO APLICA	
MONTA TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATADO) OBRA:	2,683,950.00	CIVA
GUSTAVO CASTILLO GARCIA SUPERVISOR	MANUEL ESTEBAN MARLES CREONTE DIRECTOR DE OBRAS	

FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:	23/05/2016
MES QUE SE REPORTA	JUNIO

DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	LA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEM	No. DE OBRA:	2016300341018
		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA RURAL DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ

PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS POR ESTIMACIÓN																				
No. EST.	PARTIDA	MONTO	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS															
			No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE										
1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN	2,263.18																		
	EXCAVACIÓN PARA CADENAS DE CERRAMIENTO	7,894.00																		
	PRETIL DE 30 CM DE ALTURA	32,800.00																		
	CADENA DE DESPLANTE DE 15 M	35,318.16																		
	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE CADENA DE CERRAMIENTO	22,720.00																		
	CASTILLO DE SECCIÓN 15X15 CM	18,044.88																		
	MURO DE BLOQUE DE 12X20X40 CM	80,883.60																		
	CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 M	36,161.44																		
	LOSA DE CONCRETO FC=250 KG/M3	124,885.61																		
		44,962.40																		
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE CERRAMIENTO	18,140.00																		
	SALEDA DE CONTACTO Y APAGADO DE CONTACTO	5,420.00																		
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE	17,900.00																		
	APLANADO EN MUROS A PLUMBOS	46,390.10																		
	PRETIL DE 30 CM DE ALTURA	21,375.00																		
	IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOLES	15,235.20																		
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MANTENIMIENTO	1,492.90																		
	TOTAL	531,896.47	TOTAL	0.00	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO (EJERCIDO) EN EL MES:	453,333.14	25/05/2016
MONTO PAGADO (EJERCIDO) ACUMULADO:	0.00	
NO. NOTA DE BETÓTORA A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:		
PRUEBAS DE LABORATORIO:		
PENALIZACIÓN:	0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	45.00	65.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REAL	0.00	0.00	0.00	45.00	65.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DÍAS DE ATRASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES:
TRABAJOS EN PROCESO

[Firma]
GUSTAVO CASTILLO GARCÍA
SUPERVISOR

[Firma]
FANIEL ARTURO MARES ORDOÑEZ
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL
 No. de obra: 2016300341018

Localidad: CERRO AZUL
 Periodo: JUNIO

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2016
 Número de estimación:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y
 DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
 DEL DISTRITO FEDERAL

Descripción: AMPLIACIÓN DE VIVIENDA RURAL DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL VERACRUZ

Fuente de Financiamiento:
 Fecha de revisión: 25/07/2016



FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:
 habilitado de acero y colocación de poliducto de
 1/2 para instalaciones eléctricas



FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:
 colado de losas de 10 cms de espesor

Observaciones:

trabajos en proceso

gustavo castillo garcia
 supervisor
 Supervisor responsable



- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:	23/06/2016
MES QUE SE REPORTA	JUNIO

DATOS GENERALES											
MUNICIPIO:	CERRO AZUL			LOCALIDAD:	CERRO AZUL			DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS OBM			No. DE OBRA:	2016300341015						
ANTECEDENTES:		CROQUIS DE PROYECTO:									
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI		NO								
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:											
GRADO DE REZAGO SOCIAL:											
MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO							MUY BAJO	OTRO
TIPO DE ZONA:			RURAL							CLAVE AGER:	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAF:			SI							X	NO
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL FAIS:			SI							X	NO
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:											
DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA								X	
PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	SI	NO							X	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA											
LATITUD	8.600800000		LONGITUD	0.000000000							
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO											
PARTIDA	MONTO	%									
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO	5,066.00	0									
Excavación por medios mecánicos para	11,993.00	0									
Compactación del terreno natural con	2,084.00	0									
Base hidráulica 70-30% (grava 1 1/2"	56,042.00	0									
Carga con máquina (cargador frontal C	14,166.00	0									
Acarreo en camión 1er kilómetro, de m	17,353.00	0									
Acarreo en camión kilómetro subsecue	79,614.00	0									
Suministro y colocación de malla de ace	30,030.00	0									
Suministro y colocación de concreto hid	365,757.00	0									
Suministro y colocación de pasajunta d	4,509.00	0									
Suministro y colocación de varillas pase	6,042.00	0									
Suministro y aplicación de curacreto	7,384.00	0									
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO	434.28	0									
EXCAVACION A MANO EN CEPAS, MAT	5,830.00	0									
ELABORACION DE GUARNICION TRAPE	57,618.00	0									
Refrero compactado con pisón de mano	338.80	0									
Suministro y aplicación de pintura de es	7,022.00	0									
Limpieza de terreno plano a mano, incl	12,212.00	0									
TOTAL	684,895.08										
MONTO AUTORIZADO:	794,485.00	OTVA									
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	794,786.00	OTVA									
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X							
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	FCOM										
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X							
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	FCOM										
META PROGRAMADA:	770.00	UNIDAD:	m2	REAL:	770.00						
AVANCE FISICO:	PROGRAMADO:	10.00	REAL:	10.00							
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACION DIRECTA		EXISTE	FECHAS							
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		X	29/03/2015							
	LICITACIÓN PÚBLICA										
NO. DE CONTRATO:	2016300341015										
MONTO CONTRATADO:	684,901.72	OTVA									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL									
	INICIO	02/05/2016	02/05/2016								
	TÉRMINO	31/10/2016	0.00								
	DÍAS	180.00	0.00								
CONTRATISTA:	JAHIR DE JESUS MORENO LEONIA										
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIOS UNITARIOS		X								
	PRECIO ALZADO										
	MEDIO										
	LLAVE EN MANO										
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X								
	MONTO:		PORCENTAJE								
TIPO DE FIANZA:	FECHA DE PAGO:	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS								
MONTO AFIANZADO:	ANTICIPO	58,490.17									
AFIANZADORA:	PRIMERO FIANZAS										
No. DE FIANZA:	1605183-000										
FECHA:	22/04/2016										
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA								
	MONTO										
	REZAGO										
NO APLICA											
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) OBRA:	794,485.00	OTVA									
GUSTAVO CASTILLO GARCIA SUPERVISOR			MANUEL A. MARES ORDOÑEZ DIRECTOR DE OBRAS								

FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL
No. de obra: 2016300341015

Localidad: CERRO AZUL
Periodo: JUNIO

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2016
Número de estimación:

Descripción: REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.

Fuente de Financiamiento:
Fecha de revisión: 25/07/2016
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL



FOTO (12)
Concepto de obra ejecutado:
trazo y excavacion por medios manuales y fabricacion de guarniciones



FOTO (13)
Concepto de obra ejecutado:
relleno y compactado con material suministrado, colado de concreto



Obervaciones:
trabajos en proceso


- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis

gustavo castillo garcia
supervisor
Supervisor responsable

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

PERIODO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:	24/07/2016
MES QUE SE REPORTA	JUNIO

DATOS GENERALES											
MUNICIPIO:	CERRO AZUL			LOCALIDAD:	CERRO AZUL			DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL "JUSTO SIERRA" DE LA COMUNIDAD DE JUAN FELIPE, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	LA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEM			Nº. DE OBRA:	2016300341013						
ANTECEDENTES:					CROQUIS DE PROYECTO:						
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI		NO							
			X								
OBRAS REALIZADAS CON FISH-DF:											
GRADO DE REZAGO SOCIAL:											
MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO						0211	
TIPO DE ZONA:		RURAL									
		URBANA								CLAVE AGEB:	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI	X	NO							
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL PAIS:		SI	X	NO							
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:											
DIRECTA		INDIRECTA		COMPLEMENTARIA	X						
PROYECTO ESPECIAL		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE		SI	NO						
					X						
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA											
LATITUD	9.600000000		LONGITUD	0.000000000							
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO											
PARTIDA	MONTO		%								
LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	3,155.00		0								
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLE	2,932.00		0								
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA	93,589.00		0								
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION	63,676.00		0								
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION	60,632.00		0								
COLUMNA DE 25 CM DE SECCION CIRCUL	28,501.00		0								
CIADO EN ZAPATA DE CIMENTACION DE 4	15,336.00		0								
ZAPATA DE CIMENTACION AISLADA DE 1	15,437.00		0								
PLANTILLA DE 5 CM PARA DESPLANTE DE	2,047.00		0								
EXCAVACION EN OBRA POR MEDSOS MANI	1,487.00		0								
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLAN	3,760.00		0								
TOTAL		290,505.00									
MONTOS AUTORIZADOS:					336,993.68		C/VA				
MONTOS DEL PRESUPUESTO BASE:					336,993.68		C/VA				
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:		EXISTE	NO EXISTE	X	NO APLICA	FECHA					
DEPENDENCIA QUE VALIDA:											
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:		EXISTE	NO EXISTE	X	NO APLICA	FECHA					
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:											
META PROGRAMADA:		1.00	UNIDAD:	000	REAL:	1.00					
AVANCE FISICO:		PROGRAMADO:	15.00	REAL:	15.00						
				EXISTE	FECHAS						
TIPO DE LICITACIÓN:		ADJUDICACIÓN DIRECTA									
		INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		X	28/03/2016						
		LICITACIÓN PÚBLICA									
NO. DE CONTRATO:		2016300341013									
MONTOS CONTRATADOS:		290,511.79		C/VA							
PERIODO DE EJECUCIÓN:		PROGRAMADA		REAL							
		INICIO	02/05/2015	02/05/2016							
		TERMINO	31/10/2015								
		DÍAS	180.00	0.00							
CONTRATISTA:		BALDOMERO HERNANDEZ EDGARDO									
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:		PRECIOS UNITARIOS		X							
		PRECIO ALZADO									
		MOTO LLAVE EN MANO									
ANTICIPO:		APLICA	NO APLICA	X							
		MONTO:	PORCENTAJE								
TIPO DE FRANZA:		ANTICIPO		CUPL. INIENTO	VICIOS OCULTOS						
MONTOS AFIANZADOS:		25,051.18									
AFIANZADORA:		INSURGENTES									
No. DE FRANZA:		6215-05381-7									
FECHA:		02/05/2016									
CONVENIO MODIFICATORIO:		EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA							
		MONTO									
		PLAZO									
		NO APLICA									
MONTOS TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		335,993.68		C/VA							
GUSTAVO ORTIZ ALONSO GARCIA SUPERVISOR		ABRAHAM A. MORALES ORDOÑEZ DIRECTOR DE OBRAS									

GUSTAVO ORTIZ ALONSO GARCIA SUPERVISOR

ABRAHAM A. MORALES ORDOÑEZ DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:

24/07/2016

MES QUE SE REPORTA

JUNIO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL "JUSTO SIERRA" DE LA COMUNIDAD DE JUAN FELIPE, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	LA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEM	No. DE OBRA:	2016J00341013		

No. EST.	PARTIDA	MONTO	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS						
			No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE	
TOTAL		0.00	TOTAL	0.00	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPORTE		EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO (EJERCIDO) EN EL MES:		0.00	
MONTO PAGADO (EJERCIDO) ACUMULADO:		0.00	
No. NOTA DE BITÁCORA A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:			
PRUEBAS DE LABORATORIO:			
FINIQUITO:		0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:			

AVANCE FISICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIAS DE ATRASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES:
TRABAJOS EN PROCESO

GUSTAVO CASTILLO GARCIA
SUPERVISOR

MANUEL A. MARES ORDOÑEZ
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 1.1

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL
No. de obra: 2016300341013

Localidad: CERRO AZUL
Periodo: JUNIO

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2016
Número de estimación:

Descripción: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL "JUSTO SIERRA" DE LA COMUNIDAD DE JUAN FELIPE, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL VER.

Fuente de Financiamiento:
Fecha de revisión: 25/07/2016

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

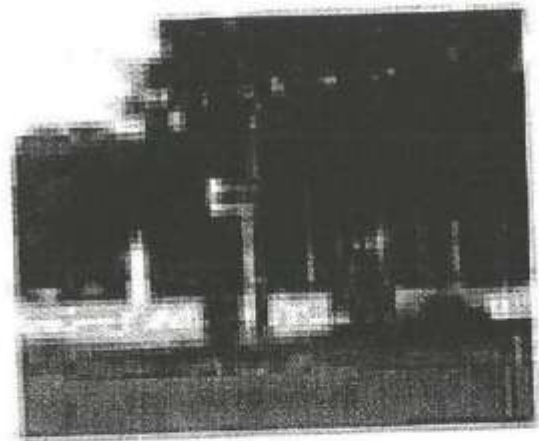


FOTO (12)
Concepto de obra ejecutado:
fabricacion de columnas de concreto

(11)

FOTO (13)
Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

trabajos en proceso


- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis

gustavo castillo garza
supervisor
Supervisor responsable



EL AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2016

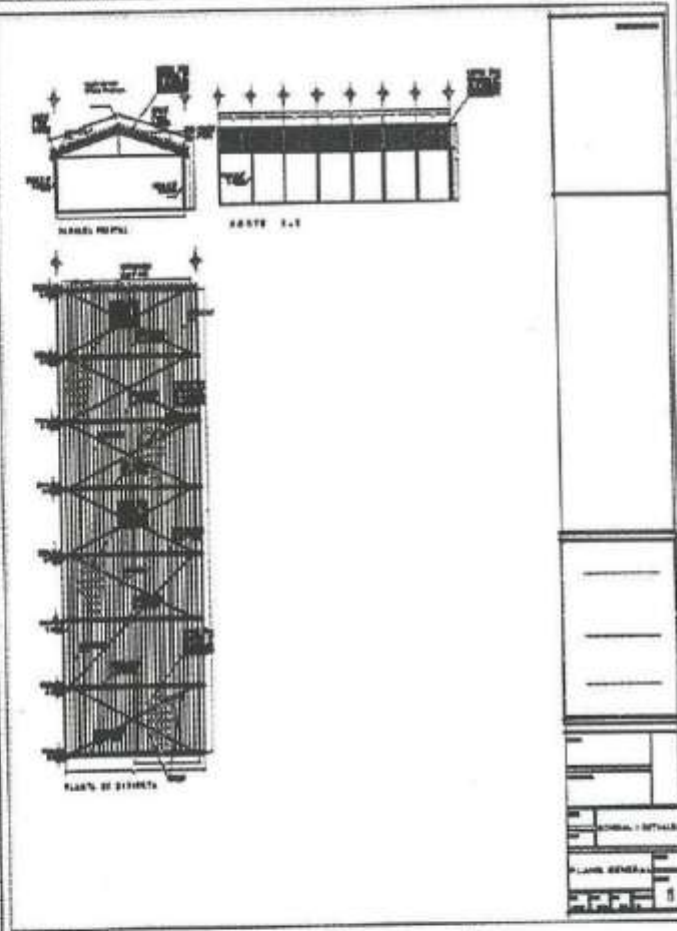FECHA DE ELABORACIÓN:	23/06/2016
MES QUE SE REPORTA	JUNIO

DATOS GENERALES														
MUNICIPIO:		CERRO AZUL		LOCALIDAD:		CERRO AZUL		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "EMILIANO ZAPATA" DE LA COLONIA MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		LA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEH		No. DE OBRA:		2016300341011								
ANTECEDENTES:			CROQUIS DE PROYECTO:											
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:			SI			NO								
OBRAS REALIZADAS CON FISH-DF:														
GRADO DE REZAGO SOCIAL:														
MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	COMO									
TIPO DE ZONA:			RURAL			URBANA						CLAVE AGEB:		
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:			SI			X						NO		
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL FAIS:			SI			X						NO		
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:														
DIRECTA			INDIRECTA			COMPLEMENTARIA						X		
PROYECTO ESPECIAL			CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE			SI						NO		
NO			X											
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA														
LATITUD			8.000000000			LONGITUD			0.000000000					
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO														
PARTIDA		MONTO		%										
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLAN		2,165.00		0										
RELLENO Y COMPACTADO CON FIZON DE		1,605.00		0										
EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIA		2,498.00		0										
PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CON		2,064.00		0										
ZAPATA DE CIMENTACION, SECCION 1.40		10,825.00		0										
SUMINISTRO Y ELABORACION DE DADO I		6,883.00		0										
COLUMNA CIRCULAR DE ESTRUCTURA DE		28,546.00		0										
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION		77,335.00		0										
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION		23,004.00		0										
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION		3,991.00		0										
SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA ZIN		82,900.00		0										
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALC		14,678.00		0										
FABRICACION Y COLOCACION DE BASE D		4,120.00		0										
TOTAL		258,615.00												

MONTO AUTORIZADO:		300,000.00		CIVA	
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		300,000.00		CIVA	
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:		EXISTE		NO EXISTE	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				FEOM	
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:		EXISTE		NO EXISTE	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				FEOM	
META PROGRAMADA:		1.00		UNIDAD:	
AVANCE FISICO:		PROGRAMADO:		30.00	
TIPO DE LICITACIÓN:		ADJUDICACION DIRECTA		X	
		INVITACION A MENOS 3 PERSONAS		22/03/2016	
		LICITACION PUBLICA			
NO. DE CONTRATO:		2016300341011		CIVA	
MONTO CONTRATADO:		258,626.69		REAL	
PERIODO DE EJECUCIÓN:		PROGRAMADA		REAL	
		INICIO		02/05/2016	
		TERMINO		31/10/2016	
		DÍAS		0.00	
CONTRATISTA:		DE LA CRUZ MARQUEZ ADOLFO			
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:		PRECIOS UNITARIOS		X	
		PRECIO ALZADO			
		MEDIO			
		LLAVE EN MANO			
ANTICIPO:		APLICA		X	
		NO APLICA			
		MONTO:		90,000.00	
		PORCENTAJE:		30.00	
TIPO DE FIANZA:		ANTICIPO		CUMPLIMIENTO	
MONTO AFIANZADO:		90,000.00		25,862.67	
AFIANZADORA:		DORAMA		DORAMA	
No. DE FIANZA:		16A13052		16A13053	
FECHA:		29/04/2016		29/04/2016	
CONVENIO MODIFICATORIO:		EXISTE		IMPORTE/PERIODO	
		MONTO		FEOM	
		PLAZO			
		NO APLICA			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		300,000.00		CIVA	

GUSTAVO LOPEZ GARCIA
SUPERVISOR

MANUEL A. PARES ORDOÑEZ
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:
23/06/2016
MES QUE SE REPORTA
JUNIO

DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	LA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEM	No. DE OBRA:	2016300341011
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "EMILIANO ZAPATA" DE LA COLONIA MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	

No. EST.	PARTIDA	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
			No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE
01 parcial	COLUMNA CIRCULAR EN ESTRU	28,546.00								
	SUMINISTRO Y ELABORACION	6,883.00								
	ZAPATA DE CIMENTACION, SEC	10,825.00								
	PLANTILLA DE 5 CM, DE ESPES	2,064.00								
	EXCAVACION A MANO EN CEPAL	2,498.00								
	RELLENO Y COMPACTACION CO	1,625.00								
	TRAZO Y NEVELACION DE TERR	2,165.00								
TOTAL		54,586.00	TOTAL	0.00	TOTAL	0.00	0.00	0.00		0.00

	REPORTE	
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO (EJERCIDO) EN EL MES:	0.00	
MONTO PAGADO (EJERCIDO) ACUMULADO:	0.00	
No. NOTA DE BITÁCORA A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:		
PRUEBAS DE LABORATORIO:		
FINQUITO:	0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCION:		

AVANCE FISICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIAS DE ATRASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES:
TRABAJOS EN PROCESO

GUSTAVO FACILIO GARCIA
SUPERVISOR

MARIEL A. JIMENEZ ORDOÑEZ
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL
No. de obra: 2016300341011

Localidad: CERRO AZUL
Período: JUNIO

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2016
Número de estimación:

Descripción: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "EMILIANO ZAPATA" DE LA COLONIA MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Fuente de Financiamiento:
Fecha de revisión: 25/07/2016

FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:
fabricacion de plantillas y zapatas aisladas de concreto armado



FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:
fabricacion de dados de concreto

Observaciones:

trabajos en proceso

gustavo castillo garcia
supervisor
Supervisor responsable



- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2016

FECHA DE ELABORACION:	23/06/2016
MES QUE SE REPORTA	JUNIO

DATOS GENERALES										
MUNICIPIO:	CERRO AZUL			LOCALIDAD:	CERRO AZUL			DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA "HENRY FORD", DE LA COLONIA LA CEIBA, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	LA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DOM			No. DE OBRA:	201630031010					
ANTECEDENTES:		CROQUIS DE PROYECTO:								
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	Y	NO						
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:										
GRADO DE REZAGO SOCIAL:										
MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO						0226
TIPO DE ZONA:		RURAL	URBANA							CLAVE AGER:
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI	X	NO						
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL PAIS:		SI	X	NO						
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:										
DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA		X						
PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE		SI	NO						X
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA										
LÁTTITUD	0.000000000		LONGITUD	0.000000000						
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO										
PARTIDA	MONTO	%								
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALIZACION	9,948.30	0								
SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA ZINCO	102,297.44	0								
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE	5,430.00	0								
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE	49,622.40	0								
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE	83,542.20	0								
COLUMNA CIRCULAR DE ESTRUCTURA DE	34,703.02	0								
SUMINISTRO Y ELABORACION DE DADO DE	8,250.55	0								
ZAPATA DE CIMENTACION, SECCION 1.40	11,640.00	0								
RELLENO Y COMPACTADO CON PIZON DE	6,397.23	0								
PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CON	2,149.49	0								
RELLENO Y COMPACTADO CON PIZON DE	2,492.67	0								
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLAN	2,482.20	0								
TOTAL	318,965.51									
MONTRO AUTORIZADO:		370,000.00		C/IVA						
MONTRO DEL PRESUPUESTO BASE:		370,000.00		C/IVA						
VALIDACION DEL PROYECTO:		EXISTE	NO EXISTE	X	NO APLICA					
DEPENDENCIA QUE VALIDA:										
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:		EXISTE	NO EXISTE	X	NO APLICA					
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:										
META PROGRAMADA:		1.00	UNIDAD:	PZA	REAL:	1.00				
AVANCE FISICO:		PROGRAMADO:	0.00	REAL:	0.00					
TIPO DE LICITACION:		ADJUDICACION DIRECTA		X		21/03/2016				
		INVITACION A MENOS DE 2 PERSONAS								
		LICITACION PUBLICA								
NO. DE CONTRATO:		201630031010								
MONTRO CONTRATADO:		318,965.52		C/IVA						
PERIODO DE EJECUCION:		PROGRAMADA		REAL						
		INICIO	02/05/2016	02/05/2016						
		TERMINO	31/12/2016							
		DÍAS	180.00	0.00						
CONTRATISTA:		DE LA CRUZ MARQUEZ ADOLFO								
MODALIDAD DE CONTRATACION:		PRECIOS UNITARIOS		X						
		PRECIO ALZADO								
		MIXTO								
		LLAVE EN MANO								
ANTICIPO:		APLICA	X	NO APLICA						
		MONTO:	111,000.00	PORCENTAJE:	30.00					
TIPO DE FIANZA:		FECHA DE PAGO:		VICIOS OCULTOS						
MONTRO AFIANZADO:		ANTICIPO	CUMPLIMIENTO							
		111,000.00	31,896.55							
AFIANZADORA:		DORAMA	DORAMA							
No. DE FIANZA:		634185	633652							
FECHA:		29/04/2016	29/04/2016							
CONVENIO MODIFICATORIO:		EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA						
		MONTO								
		PLAZO								
		NO APLICA								
MONTRO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		370,000.00		C/IVA						
GUSTAVO CASTELLANERIA SUPERVISOR		MABEL A. MARRAS ORDÓÑEZ DIRECTOR DE OBRAS								

FORMATO 1.1

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL
No. de obra: 2016300341010

Localidad: CERRO AZUL
Periodo: JUNIO

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2016
Número de estimación:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y
DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL

Descripción: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA "HENRY FORD", DE LA COLONIA LA CEIBA, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.

Fuente de Financiamiento:
Fecha de revisión: 24/07/2016

FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:
COLADO DE COLUMNAS DE CONCRETO


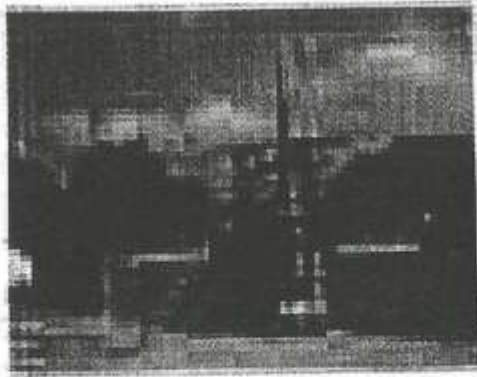


FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:
ARMADO DE ESTRUCTURAS A BASE DE MONTEN
DE 4"

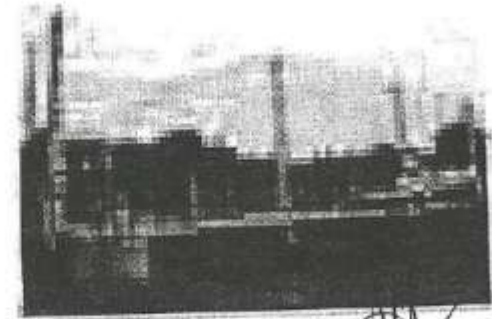

Observaciones:

TRABAJOS EN PROCESO

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

SUPERVISOR

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2016


FECHA DE ELABORACIÓN:	23/06/2016
MES QUE SE REPORTA	JUNIO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS DE LA COLONIA AGUIJERA, 9º EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	LA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEP	No. DE OBRA:	2016300341009		

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	X	NO		
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:					
GRADO DE REZAGO SOCIAL:					
MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	0122
TIPO DE ZONA:		CLAVE AGEB:			
RURAL		URBANA			
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI	X	NO	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL FAIS:		SI	X	NO	
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:					
DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	X		
PROYECTO ESPECIAL		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE		SI	NO
				X	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA					
LATITUD	0.000000000	LONGITUD	0.000000000		

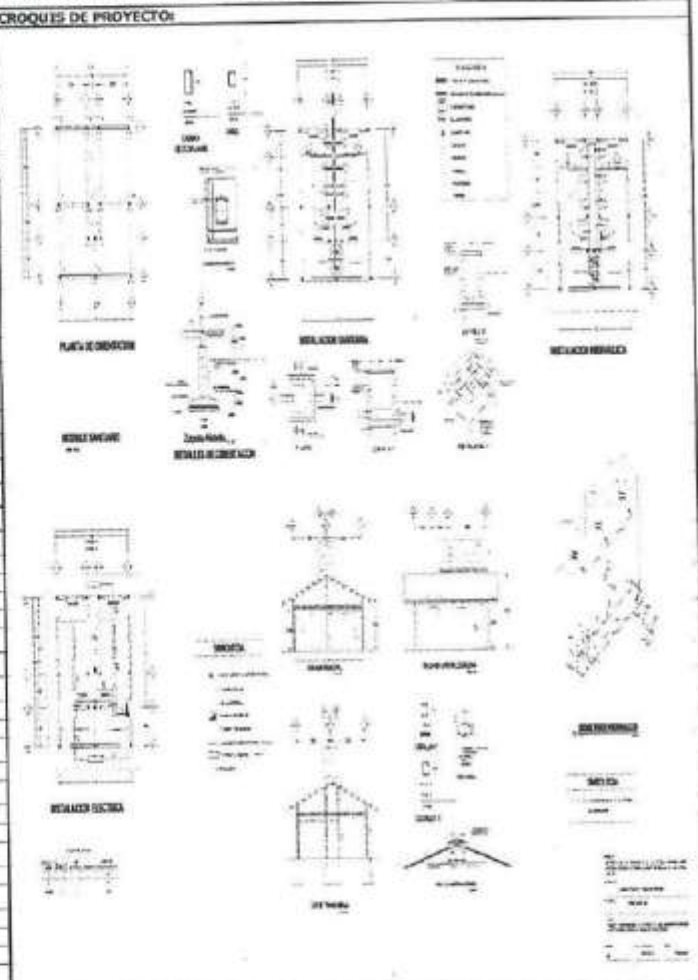

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO

PARTIDA	MONTO	%
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLAT	0.00	0
EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL T	0.00	0
RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL I	0.00	0
ZAPATA AISLADA CUADRADA, EN TERREN	0.00	0
DALA O CADENA DE DESPLANTE DE CONK	0.00	0
CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC=	0.00	0
DALA O CADENA DE CERRAMIENTO DE SI	0.00	0
LOSA EN ESTRUCTURA, PERALTE = 10	0.00	0
TRABE CUMBRESIA, INCLUYE CIMBRA Y DI	0.00	0
PIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA R	0.00	0
APLANADO FINO EN MUROS Y PLAFONES	0.00	0
PERFILADO DE MUROS PARA RECIBIR CA	0.00	0
VITROPISO 30X30 CMS. DE 1/2" DE ESPE	0.00	0
ZOCLO DE VITROPISO DE 16 CM PEGADO	0.00	0
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	0.00	0
IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA CON T	0.00	0
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTAL	0.00	0
SUM. Y COL. DE TINACO BOCORLAS VERI	0.00	0
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA	0.00	0
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTIL	0.00	0
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA	0.00	0
SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT	0.00	0
SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION	0.00	0
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINA	0.00	0

MONTO AUTORIZADO:	369 973.33	C/VA			
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	369 973.33	C/VA			
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA		
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				FECHA:	
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				FECHA:	
META PROGRAMADA:	1.00	UNIDAD:	PIA	REAL:	1.00
AVANCE FISICO:	PROGRAMADO:	10.00	REAL:	20.00	
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA		EXISTE	FECHAS	
	LIMITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		X	25/03/2016	
	LICITACIÓN PÚBLICA				
NO. DE CONTRATO:	2016300341009				
MONTO CONTRATADO:	318,942.53	CTVA			
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL			
	INICIO	02/05/2015	02/05/2016		
	TERMINO	31/10/2015			
	DÍAS	180.00	0.30		
CONTRATISTA:	CONSTRUMADA S.A DE CV.				
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIOS UNITARIOS		X		
	PRECIO ALZADO				
	MIXTO				
	LLAVE DE MANO				
ANTECIPO:	APLICA	NO APLICA	X		
	MONTO:	PORCENTAJE			
FECHA DE PAGO:					
TIPO DE FIANZA:	ANTECIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS		
MONTO AFIANZADO:		31,894.25			
AFIANZADORA:	ASERTA				
No. DE FIANZA:	3506-02066-2				
FECHA:	25/04/2016				
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	NO EXISTE	IMPORTES/PERDIDO	FECHA	
	MONTO				
	PLAZO				
NO APLICA					
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	369,973.33	CTVA			

GUSTAVO CASTAÑAS GARCIA
SUPERVISOR

MARCELO A. NARES ORDOÑEZ
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL
 No. de obra: 2016300341009

Localidad: CERRO AZUL
 Período: JUNIO

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2016
 Número de estimación:

Descripción: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS DE LA COLONIA AGUILERA, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.

Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Fecha de revisión: 24/07/2016

FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:
 FABRICACION DE CADENAS DE DESPLANTE Y ARMADO DE CASTILLOS A BASE DE VARILLA DE 1/2" Y 3/8"


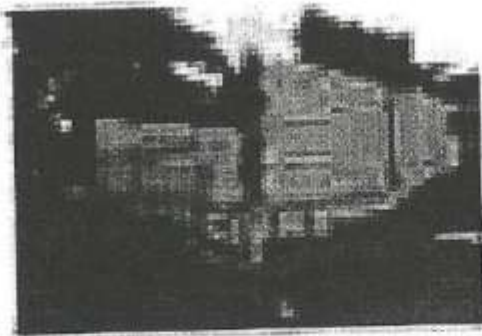


FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:
 FABRICACION DE MUROS DE BLOCK DE 12 CMS DE ESPESOR

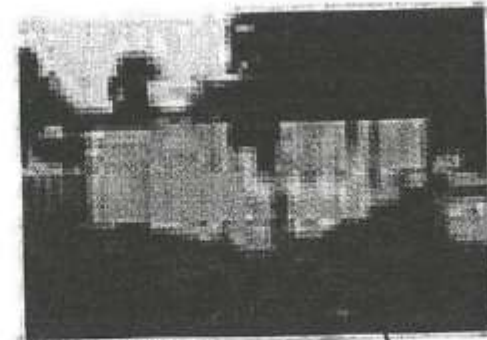

Observaciones:

TRABAJOS EN PROCESO

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

SUPERVISOR

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis


II. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:	23/06/2016
MES QUE SE REPORTA	JUNIO

DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	LA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEM	No. DE OBRA:	2016300341007
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LAS COLONIAS: VICENTE GUERRERO, AGUILERA, FAJA DE CRO, CARDENAS Y TERESA MORALES, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	

ANTECEDENTES:					
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	NO		
			X		
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:					
GRADO DE REZAGO SOCIAL:					
MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	0122
TIPO DE ZONA:		RURAL	URBANA	CLAVE AGEB:	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI	X	NO	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL FAIS:		SI	X	NO	
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:					
DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA			
X					
PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	SI	NO		
			X		
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA					
LATITUD	8.000000000	LONGITUD	0.000000000		
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO					
PARTIDA	MONTO	%			
Desmantelamiento de Estructura y	0.00	0			
Demolicion a mano de muros de cobique	0.00	0			
Construcción de enrase de block de 12 x	0.00	0			
Losa plana en super estructura de 10 cm.	0.00	0			
Apilado fino en plifones a regla y	0.00	0			
Limpieza de terreno plano a mano.	0.00	0			
TOTAL		0.00			

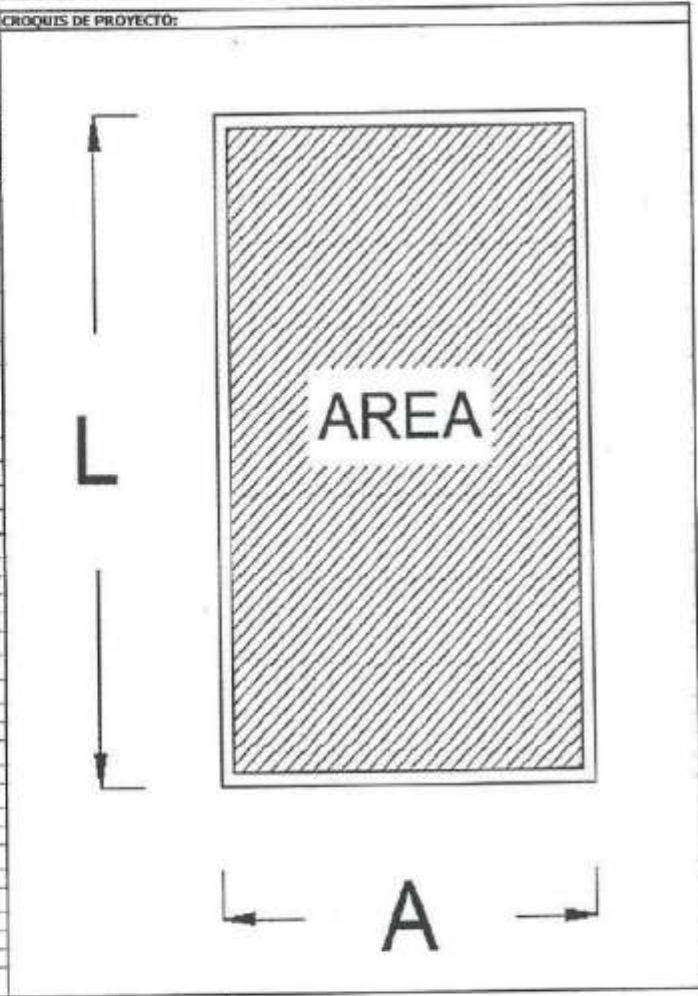

MONTO AUTORIZADO:	998,998.86	C/VA			
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	998,998.86	C/VA			
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	FECHA				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	FECHA				
META PROGRAMADA:	50.00	UNIDAD:	FZA	REAL:	50.00
AVANCE FISICO:	PROGRAMADO:	16.00	REAL:	10.00	
TIPO DE LICITACIÓN:		EXISTE		FECHAS	
ADJUDICACIÓN DIRECTA					
INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		X		22/05/2016	
LICITACIÓN PÚBLICA					
NO. DE CONTRATO:	2016300341007				
MONTO CONTRATADO:	861,206.78	C/VA			
PERIODO DE EJECUCIÓN:		PROGRAMADA	REAL		
INICIO		02/05/2016	02/05/2016		
TERMINO		31/10/2016			
DÍAS		180.00	0.00		
CONTRATISTA:	JUAN JOSE CAVO VALDEZ				
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIOS UNITARIOS		X		
PRECIO ALZADO					
MOTO					
LLAVE EN MANO					
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA		
MONTO:	299,699.96	PORCENTAJE:	33.00		
TIPO DE FIANZA:		ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:	299,699.96	86,120.68			
AFIANZADORA:	ASERTA	ASERTA			
No. DE FIANZA:	4094-03156-6	4094-03157-5			
FECHA:	29/04/2016	29/04/2016			
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE PERIODO	FECHA		
MONTO					
PLAZO					
NO APLICA					
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	998,998.86	C/VA			
GUSTAVO CASTELLANARCA SUPERVISOR		MANUEL A. MARIESTRADOZ DIRECTOR DE OBRAS			

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN: 23/05/2016
MES QUE SE REPORTA JUNIO

DATOS GENERALES										
MUNICIPIO: CERRO AZUL			LOCALIDAD: CERRO AZUL			DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS COLONIAS VICENTE GUERRERO, AGUILERA, FAJA DE ORO, CADEMAS Y TERESA MORALES, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: LA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEM			No. DE OBRA: 2016300341007							
PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS POR ESTIMACION			POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
No. EST.	PARTIDA	MONTO	No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	S MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE
TOTAL		0.00	TOTAL		0.00	TOTAL		0.00	0.00	0.00

REPORTE		EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO (EJERCIDO) EN EL MES:		0.00	
MONTO PAGADO (EJERCIDO) ACUMULADO:		0.00	
No. NOTA DE BITÁCORAS A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:			
PRUEBAS DE LABORATORIO:		0.00	
FINIQUITO:			
ACTA ENTREGA RECEPCION:			

AVANCE FISICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	10.0	35.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10.0	35.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIAS DE ATRASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES:

TRABAJOS EN PROCESO

GUSTAVO CASTILLO GARCIA
SUPERVISOR

JUAN A. MANES OCHOA
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL
No. de obra: 2016300341007

Localidad: CERRO AZUL
Periodo: JUNIO

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2016
Número de estimación:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Descripción: CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LAS COLONIAS: VICENTE GUERRERO, AGUILERA, FAJA DE ORO, CARDENAS Y TERESA MORALES, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.

Fecha de revisión: 24/07/2016




FOTO (12)
Concepto de obra ejecutado:
COLADO DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR

(11)

FOTO (13)
Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

TRABAJOS EN PROCESO

GUSTAVO CASTILLO GARCIA
SUPERVISOR
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

FECHA DE ELABORACIÓN:	23/04/2016
MES QUE SE REPORTA	JUNIO

EJERCICIO 2016

DATOS GENERALES																					
MUNICIPIO:	CERRO AZUL			LOCALIDAD:	CERRO AZUL			DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LAS COLONIAS: LA CEIBA, LOMAS VERDES, TERESA MORALES Y EX BRECHA EL AGUILA, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	LA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEM			Nº. DE OBRA:	201630034-004																
ANTECEDENTES:				CROQUIS DE PROYECTO:																	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:																					
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:																					
GRADO DE REZAGO SOCIAL:																					
MUY ALTO										ALTO				MEDIO		BAJO		MUY BAJO		0175	
TIPO DE ZONA:										RURAL				URBANA				CLAVE AGEB:			
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:										SI				X				NO			
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL FAIS:										SI				X				NO			
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:										DIRECTA				INDIRECTA				COMPLEMENTARIA			
PROYECTO ESPECIAL										CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE				SI				NO		X	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA																					
LATITUD					0.300060000					LONGITUD					0.000000000						
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO																					
PARTIDA		MONTO		%																	
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO R		3,366.00		0																	
DESMANTELAMIENTO DE MUROS DE		28,429.00		0																	
PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE		21,329.00		0																	
EXCAVACION A MANO EN CEPAS, MA		34,771.00		0																	
ZAPATA DE 1.00X1.00X0.15 M CON C		138,314.00		0																	
SUMINISTRO Y ELABORACION DE DA		87,160.00		0																	
CADENA DE DESRIANTE DE SECCION		112,073.00		0																	
RELLENO Y COMPACTACION DE CEPA		11,756.00		0																	
FIRME DE SON DE ESPESOR DE CON		123,722.00		0																	
MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM		240,239.00		0																	
CASTILLO DE SECCION 15 X 20 CM,		136,136.00		0																	
CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCI		166,230.00		0																	
APLANADO FINO EN MUROS A PLOM		29,918.00		0																	
EMBOQUILLADO APLANADO UNA AR		26,758.00		0																	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUER		47,597.00		0																	
VENTANA DE 1.10X1.35 INCLUYE SUN		85,904.00		0																	
TUBO DE 13 MM POLIDUCTO NARANJ		3,950.00		0																	
LIMPIEZA DE TERRENO A PLANO A M		9,427.00		0																	
TOTAL		1,259,079.00																			

MONTO AUTORIZADO:	1,502,107.20			C/VA	
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	1,502,107.20			C/VA	
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	FECHA				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	FECHA				
META PROGRAMADA:	22.00	UNIDAD:	PZA	REAL:	22.00
AVANCE FISICO:	PROGRAMADO:	10.00	REAL:	10.00	
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA		EXISTE		FECHAS
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		X		20/03/2016
	LICITACIÓN PÚBLICA				
NO. DE CONTRATO:	201630034-004				
MONTO CONTRATADO:	1,294,920.00			C/VA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	PROGRAMADA	REAL		
		02/05/2016	02/05/2016		
	TÉRMINO	31/10/2016			
	DÍAS	180.00	6.00		
CONTRATISTA:	ANGEL ENRIQUE MAYA SANCHEZ				
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIOS UNITARIOS		X		
	PRECIO ALZADO				
	MAYO				
	LLAVE EN MANO				
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA		
	MONTO:	450,632.16	PORCENTAJE	30.30	
TIPO DE FIANZA:	FECHA DE PAGO:		CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	
	ANTICIPO				
MONTO AFIANZADO:	450,632.16				
AFIANZADORA:	ASERTA				
Nº. DE FIANZA:	409-03161-6				
FECHA:	27/04/2016				
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/IMPUESTO	FECHA		
	MONTO				
	PLAZO				
	NO APLICA				
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	1,502,107.20			C/VA	

GUSTAVO CASTELLANOS GARCIA
SUPERVISOR

ANGEL A. MAYA SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO II

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL
No. de obra: 2016300341004

Localidad: CERRO AZUL
Periodo: JUNIO

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2016
Número de estimación:

Descripción: CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LAS COLONIAS: LA CEIBA, LOMAS VERDES, TERESA MORALES Y EX BRECHA EL AGUILA, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.

Fuente de Financiamiento:
Fecha de revisión: 24/07/2016

FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:
FABRICACION DE MUROS DE BLOCK DE 12 CMS
ASENTADO CON CEMENTO ARENA


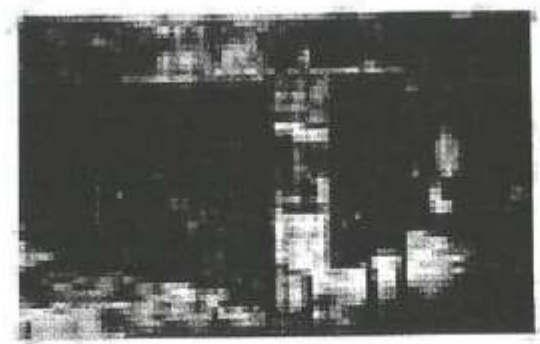


FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:
FABRICACION DE APLANADO A BASE DE
CEMENTO ARENA PROP. 1-5

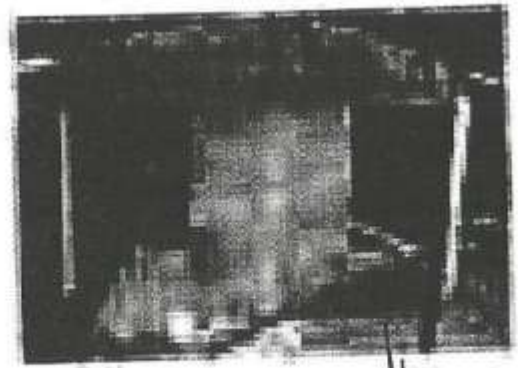

Observaciones:

TRABAJOS EN PROCESO

GUSTAVO CASTILLO GARCIA
SUPERVISOR

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:	23/06/2016
MES QUE SE REPORTA	JUNIO

DATOS GENERALES											
MUNICIPIO:	CERRO AZUL			LOCALIDAD:	CERRO AZUL			DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS: MIRADOR, VICENTE GUERRERO, LA CURVA Y MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	LA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEM			No. DE OBRA:	2016300341002						
ANTECEDENTES:		CROQUIS DE PROYECTO:									
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	NO								
		X									
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:											
GRADO DE REZAGO SOCIAL:											
HUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO							HUY BAJO	0116
TIPO DE ZONA:		RURAL	URBANA							CLAVE AGER:	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI	X							NO	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL FAIS:		SI	X							NO	
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:											
DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA									
PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	SI	NO	X							
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA											
LATITUD	0.00000000	LONGITUD	0.00000000								
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO											
PARTIDA	MONTD	%									
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PL	2,284.00	0									
EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL	10,006.00	0									
CARGA CON MAQUINARIA (CARGADOR FR	2,715.00	0									
ACARREO EN CAMION 1ER. KILOMETRO, I	2,200.00	0									
ACARREO EN CAMION KILOMETRO SURS	5,242.00	0									
AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO, M	46,252.00	0									
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P	172,379.00	0									
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA	10,501.00	0									
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO C	10,468.00	0									
SUMINISTRO Y ACOSTILLADO CON AREI	44,673.00	0									
RELLENO COMPACTADO CON PIZON DE I	44,722.00	0									
POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE	63,537.00	0									
DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO DE	59.50	0									
PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN C	623.02	0									
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL	13,288.00	0									
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PL	805.76	0									
EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL	3,182.00	0									
CARGA CON MAQUINARIA (CARGADOR FR	1,336.00	0									
ACARREO EN CAMION 1ER. KILOMETRO, I	1,082.00	0									
ACARREO EN CAMION KILOMETRO SURS	2,580.00	0									
AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO, M	854,029.68	0									
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P	25,593.00	0									
SUMINISTRO Y ACOSTILLADO DECON ARI	18,908.00	0									
RELLENO COMPACTADO CON PIZON DE P	11,291.00	0									
MONTD AUTORIZADO:		990,686.00			C/TVA						
MONTD DEL PRESUPUESTO BASE:		990,686.00			C/TVA						
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:		EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X	FECHA					
DEPENDENCIA QUE VALIDA:											
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:		EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X	FECHA					
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:											
META PROGRAMADA:		280.00	UNIDAD:	M.	REAL:	280.00					
AVANCE FISICO:		PROGRAMADO:	15.00	REAL:	15.00						
TIPO DE LICITACIÓN:		ADJUDICACIÓN DIRECTA		X		18/04/2016					
		INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS									
		LICITACIÓN PÚBLICA									
NO. DE CONTRATO:		2016300341002									
MONTD CONTRATADO:		851,839.66			C/TVA						
PERIODO DE EJECUCIÓN:		PROGRAMADA		REAL							
		INICIO	02/05/2016	TERMINO	02/05/2016						
		TERMINO	31/10/2016	DÍAS	180.00	0.00					
CONTRATISTA:		GRUPO CONSTRUCTOR BAYMAR, S.A. DE C.V.									
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:		PRECIOS UNITARIOS		X							
		PRECIO ALZADO									
		MIXTO									
		LLAVE EN MANO									
ANTICIPO:		APLICA	X	NO APLICA							
		MONTD:	297,205.80	PORCENTAJE:	30.00						
		FECHA DE PAGO:									
TIPO DE FIANZA:		ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS							
MONTD AFIANZADO:		297,205.80	85,463.97								
AFIANZADORA:		ASERTA	ASERTA								
No. DE FIANZA:		3718-05140-5	3718-05342-7								
FECHA:		28/04/2016	28/04/2016								
CONVENIO MODIFICATORIO:		MONTD	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA						
		PLAZO									
		NO APLICA									
MONTD TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		990,686.00			C/TVA						
		GUSTAVO CASTILLO GARCIA		MANUEL A. MARES OCHOA							
		SUPERVISOR		DIRECTOR DE OBRAS							

FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL
 Localidad: CERRO AZUL
 No. de obra: 2016300341002
 Periodo: JUNIO
 Descripción: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS: MIRADOR, VICENTE GUERRERO, LA CURVA Y MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2016
 Número de estimación: 01
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Fuente de Financiamiento:
 Fecha de revisión: 24/07/2016



FOTO (12)
 Concepto de obra ejecutado:
 TENDIDO DE TUBERIA DE 8"



FOTO (13)
 Concepto de obra ejecutado:
 FABRICACION DE POZOS DE VISITA

Observaciones:

TRABAJOS PROCESOS

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

SUPERVISOR

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

ESBOZO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:	23/06/2016
MES QUE SE REPORTA:	JUNIO

DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	LA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEM	No. DE OBRA:	201630034:001
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LAS COLONIAS: LA CURVA, LA CEIBA, 17 DE MAYO Y LOMAS VERDES, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	
ANTECEDENTES:		CROQUES DE PROYECTO:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	NO	X
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:			
GRADO DE REZAGO SOCIAL:			
MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO
			MUY BAJO
			DIOS
TIPO DE ZONA:			
RURAL		URBANA	
CLAVE AGEB:			
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	X	NO
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL FAIS:	SI	X	NO
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:			
DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	
	X		
PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	SI	NO
			X
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA			
LATITUD	0.900000000	LONGITUD	0.000000000
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO			
PARTIDA	MONTO	%	
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLAN	5,092.00	0	
PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRE	211,442.00	1	
LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	4,277.00	0	
TOTAL			
	220,811.00		

MONTO AUTORIZADO:	256,141.15	C/VA			
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	256,141.15	C/VA			
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				FECHA:	
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				FECHA:	
META PROGRAMADA:	30.00	UNIDAD:	DI	REAL:	30.00
AVANCE FISICO:	PROGRAMADO:	10.00	REAL:	10.00	
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA		EXISTE	FECHAS	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		X	29/03/2016	
	LICITACIÓN PÚBLICA				
NO. DE CONTRATO:	201630034:001				
MONTO CONTRATADO:	220,811.34	C/VA			
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL			
	INICIO	02/05/2015	02/05/2016		
	TERMINO	31/10/2015			
	DÍAS	180.00	0.00		
CONTRATISTA:	BALDOMERO HERNANDEZ EDGARDO				
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIOS UNITARIOS		X		
	PRECIO ALZADO				
	MIXTO				
	LLAVE EN MANO				
ANTECIPO:	APLICA	NO APLICA	X		
	MONTO:	PORCENTAJE			
TIPO DE FIANZA:	FECHA DE PAGO:	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS		
MONTO AFIANZADO:	ANTECIPO	22,081.13	0.00		
AFIANZADORA:	INSURGENTES				
No. DE FIANZA:	6215-06379-2				
FECHA:	02/05/2016				
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA		
	MONTO				
	PLAZO				
	NO APLICA				
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	256,141.15		C/VA		

GUSTAVO CASTRILLO GARCIA
SUPERVISOR

MANUEL A. MARES ORDOÑEZ
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL
No. de obra: 2016300341001

Localidad: CERRO AZUL
Periodo: JUNIO

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2016
Número de estimación: 01

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Descripción: CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LAS COLONIAS: LA CURVA, LA CEIBA, 17 DE MAYO Y LOMAS VERDES, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.

Fuente de Financiamiento:
Fecha de revisión: 24/07/2016

FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:
FABRICACION DE PISOS FIRME DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR

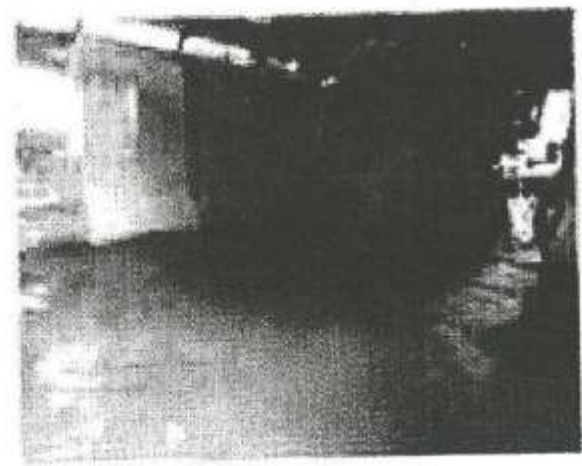


FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:
LIMPIEZA GENERAL EN PISO FIRME

Observaciones:

TRABAJOS EN PROCESO

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA
SUPERVISOR
Supervisor responsable

C.c.p. Presidente Municipal
C.c.p. Contralor Interno

MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ
PERIODO 2014-2017



FAFM

JUNIO 2016

FORMATOS 09 Y 011

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

PERIODO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:	13/05/2016
MES QUE SE REPORTA	JUNIO

DATOS GENERALES										
MUNICIPIO:	CERRO AZUL			LOCALIDAD:	CERRO AZUL			DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DE			No. DE OBRA:	2016300340022					
ANTECEDENTES:					CROQUIS DE PROYECTO:					
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>										
OBRAS REALIZADAS CON FEM-DF:										
GRADO DE REZAGO SOCIAL:										
MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO						OTROS
TIPO DE ZONA: RURAL <input type="checkbox"/> URBANA <input type="checkbox"/> CLAVE AGE: <input type="checkbox"/>										
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>										
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL PAIS: SI <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>										
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:										
DIRECTA <input type="checkbox"/> INDIRECTA <input type="checkbox"/> COMPLEMENTARIA <input type="checkbox"/>										
PROYECTO ESPECIAL <input type="checkbox"/> CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>										
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA:										
LATITUD 0.000000000 LONGITUD 0.000000000										
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO										
PARTIDA	MONTO	%								
LMPIEZA FINAL DE OBRA PARA ENTE	5,425.89	0								
APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO	8,344.00	0								
CADENA DE OBRAMIENTO DE SECCION	4,603.00	0								
ASTILLO DE SECCION 15 X 20 CM., CONG	1,442.24	0								
MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM EN	7,571.85	0								
CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 15	4,603.00	0								
FABRICACION DE ZAPATAS AISLADAS DE	3,902.40	0								
EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN	713.85	0								
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	27,014.40	1								
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES	15,604.68	0								
FABRICACION DE GRADAS DE CONCRETO	91,739.10	2								
INSTALACION DE MALLA CICLON FORRAE	15,550.53	0								
REHABILITACION DE POSTES CON TABLE	23,130.00	1								
REHABILITACION DE PORTERIAS A BASE	3,237.42	0								
ELABORACION DE PLACA DE 10CM ESPES	155,595.93	4								
DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE CERCO	1,111.50	0								
DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLONE	1,167.51	0								
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE	148.73	0								
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE D	1,186.24	0								
CARGA EN FORMA MANUAL Y ACARRE	80.22	0								
RETIRO DE POSTE DE CONCRETO POR M	396,355.81	0								
RETIRO DE GRADAS DE ESTRUCTA TUBU	2,065.31	0								
DEMOLICION DE GRADAS DE CONCRETO	3,417.17	0								
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO H	7,452.64	0								
MONTO AUTORIZADO: 459,772.72 CIVA MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: 459,772.72 CIVA VALIDACIÓN DEL PROYECTO: EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/> FECHA: DEPENDENCIA QUE VALIDA: FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/> FECHA: DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: META PROGRAMADA: 1,150.00 UNIDAD: M2 REAL: 1,150.00 AVANCE FISICO: PROGRAMADO: 40.00 REAL: 40.00 TIPO DE LICITACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/> INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS <input checked="" type="checkbox"/> LICITACIÓN PÚBLICA <input type="checkbox"/> 15/02/2016 NO. DE CONTRATO: 2016300340022 MONTO CONTRATADO: 396,355.79 CIVA PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO 01/04/2016 PROGRAMADA 04/04/2016 REAL TERMINO 31/05/2016 DÍAS 118.00 0.00 CONTRATISTA: ENRIQUE MAYA SANCHEZ MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: PRECIOS UNITARIOS <input checked="" type="checkbox"/> PRECIO ALZADO <input type="checkbox"/> METRO <input type="checkbox"/> LLAVE EN MANO <input checked="" type="checkbox"/> ANTICIPO: APLICA <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/> TIPO DE FIANZA: MONTO: <input type="checkbox"/> PORCENTAJE <input type="checkbox"/> MONTO AFIANZADO: 39,635.58 AFIANZADORA: ASERTA No. DE FIANZA: 409-03139-3 FECHA: 28/03/2016 CONVENIO MODIFICATORIO: MONTO EXISTE <input type="checkbox"/> IMPORTE/PERIODO <input type="checkbox"/> FECHA <input type="checkbox"/> MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: 459,772.72 CIVA GUSTAVO GARCIA SUAREZ MANUEL GONZALEZ MARES ORDOÑEZ DIRECTOR DE OBRAS FORMATO 11										

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.


REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES				
Municipio:	CERRO AZUL	Localidad:	CERRO AZUL	
No. de obra:	2016300340022	Periodo:	JUNIO	
Descripción:	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA COLONIA MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.		Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2016
			Número de estimación:	
			Fuente de Financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
			Fecha de revisión:	25/07/2016

FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:

aplicacion de pintura en cancha



(11)

FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

obra terminada fisicamente

gustavo castillo garcia
Supervisor
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:	23/06/2016
MES QUE SE REPORTA	JUNIO

DATOS GENERALES										
MUNICIPIO:	CERRO AZUL			LOCALIDAD:	CERRO AZUL			DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARÍA DIVINA EN LA COL. FAJA DE ORO, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	E LOS MUNICIPIOS Y DE LAS			No. DE OBRA:	2016300340019					
ANTECEDENTES:					CROQUIS DE PROYECTO:					
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	NO	X						
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:										
GRADO DE REZAGO SOCIAL:										
MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO						0160
TIPO DE ZONA:	RURAL	URBANA	CLAVE AGE:							
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	NO	X							
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL FATS:	SI	NO	X							
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:										
DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	X							
PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPCIÓN FAVORABLE	SI	NO	X						
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA										
LATITUD	0.000000000		LONGITUD	0.000000000						
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO										
PARTIDA	MONTO	%								
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLAN	4,602.00	0								
EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS	5,713.00	0								
OPERACION DE MEZCLADO, TEND.	52,334.00	0								
CARGA CON MAQUINA (CARGADOR FRONTAL)	881.00	0								
ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILOMET	2,753.00	0								
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE	29,694.00	0								
PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN	275,200.00	0								
JUNTA DE DILATACION A BASE DE VARELLA	13,153.00	0								
CORTE CON DISCO DE 3 1/2 CM. DE ESPESOR	1,841.00	0								
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUN	4,453.00	0								
RENVIELACION DE POZO DE VISITA CONU	4,474.00	0								
LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MANO, EN	7,230.00	0								
ANUNCIO ESPECTACULAR	1,833.00	0								
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLAN	2,595.72	0								
EXCAVACIÓN CON HERRAMIENTA MANU	9,139.00	0								
APNE DE TALUDES Y FONDO A MANO, P	12,897.00	0								
ELABORACION DE GAMBICION TRAPEZUI	125,708.00	0								
RELLENO COMPACTADO CON PESOR DE MA	2,587.00	0								
CAUSA CON MAQUINA (CARGADOR FRONTAL)	141.00	0								
ACARREO EN CAMION 1ER. KILOMET	573.00	0								
BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN CI	813,281.72	0								
ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILOMET	14,375.00	0								
ACARREO EN CAMION 1ER. KILOMET	120.00	0								
ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILOMET	3,598.00	0								
MONTOS Y VALIDACIÓN:					MONTO AUTORIZADO: 943,419.93 C/IVA MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: 943,419.93 C/IVA VALIDACIÓN DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X DEPENDENCIA QUE VALIDA: FECHA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: FECHA META PROGRAMADA: 608.00 UNIDAD: M2 REAL: 688.00 AVANCE FISICO: PROGRAMADO: 10.00 REAL: 10.00 TIPO DE LICITACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA DIVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS X 28/03/2016 LICITACION PUBLICA NO. DE CONTRATO: 2016300340019 MONTO CONTRATADO: 813,281.72 C/IVA PERIODO DE EJECUCIÓN: PROGRAMADA REAL INICIO 02/05/2016 02/05/2016 TERMINO 31/10/2016 DIAS 180.00 0.00 CONTRATISTA: INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE OBRA S.A DE C.V. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: PRECIOS UNITARIOS X PRECIO ALZADO MIXTO LLAVE EN MANO ANTICIPO: APLICA X NO APLICA MONTO: 283,025.97 PORCENTAJE 30.00 FECHA DE PAGO: TIPO DE FIANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS MONTO AFIANZADO: 283,025.97 81,325.30 AFIANZADORA: DE FIANZAS MONTERRE FIANZAS MONTERR No. DE FIANZA: 1704574 1704284 FECHA: 25/04/2016 29/04/2016 CONVENIO MODIFICATORIO: MONTO EXISTE IMPORTE/PERIODO FECHA PLAZO NO APLICA MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: 943,419.93 C/IVA GUSTAVO CASTILLO GARCIA DIRECTOR DE OBRAS MANUELA MARRAS ORDOÑEZ DIRECTOR DE OBRAS					

**H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:	25/06/2016
MES QUE SE REPORTA	JUNIO

DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS	No. DE OBRA:	2016300340019
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:		REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARÍA DIVINA EN LA COL. FAJA DE ORO, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	

RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRAS Y MATERIAL									
PARTIDA	13,257.00	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	S MILLAR	CANCELADO ADICIONAL EC.	IMPORTE
TOTAL	0.00	TOTAL	0.00	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO (EJERCIDO) EN EL MES:	0.00	
MONTO PAGADO (EJERCIDO) ACUMULADO:	0.00	
No. NOTA DE BITACORA A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:		
PRUEBAS DE LABORATORIO:	0.00	
FINIQUITO:		
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FISICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	10.4	45.4	70.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10.4	45.4	70.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIAS DE ATRASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES:
TRABAJOS EN PROCESO

GUSTAVO CASTILLO GARCIA
SUPERVISOR

MARIAM APARIS ORDOÑEZ
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL
 Localidad: CERRO AZUL
 No. de obra: 2016300340019
 Periodo: JUNIO
 Descripción: REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARÍA DIVINA EN LA COL. FAJA DE ORO, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2016
 Número de estimación:
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Fuente de Financiamiento:
 Fecha de revisión: 25/07/2016



FOTO (12)
 Concepto de obra ejecutado:
 tendido de malla electrosoldada



FOTO (13)
 Concepto de obra ejecutado:
 colado y curado de concreto

Obervaciones:

trabajos en proceso

Gustavo Castillo García
 gustavo castillo garcia
 supervisor
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis
